

112 年 9 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13a~G14 下行線第 10 模(D07~D16)完成混凝土澆置。

(2). G13a~G14 上行線第 11 模(U101~U06)完成接合釘安裝、鋼筋綁紮、鋼軌架設及基版安裝。

(3). G13a~G14 中央避車線 P/T-1(NBHI T2930-1~T2930-6)完成鋼筋綁紮。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠管理中心(A 區)已完成 B1F 第一升層(3.4m)澆置作業，刻正施作防水膜。

(2). 北機廠主維廠(B 區)刻正施作頂昇機坑第一升層及車輪維修機坑第二層版澆置作業。

(3). 北機廠變電站(C 區)已完成 B1F 第二升層及頂版澆置作業。

(4). 北機廠駐車廠(E 區)已完成 A~I line 基礎澆置。

(5). 排水箱涵 B0 已完成 276m，B1 及 B2 將配合土方及管理中心回填進場吊裝。

四、GM01 標截至 112 年 9 月 30 日進度為 20.19%。



G13a~G14 鋼軌及鐵馬架設(D07~D16)




北機廠-B0 預鑄排水箱涵填縫施作作業



北機廠-駐車廠 FG line 基礎版模版組立



北機廠-管理中心 B1F 隔間牆、水箱鋼筋綁紮與模版組立

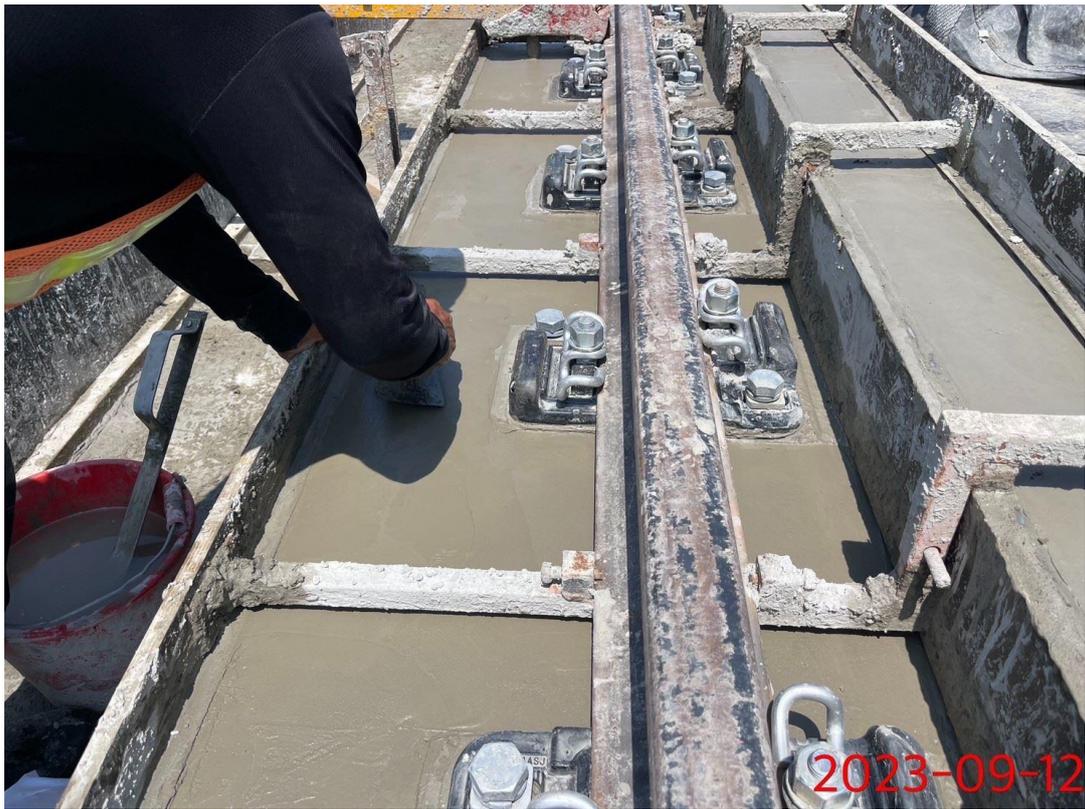

G13a~G14 道床混凝土澆置(D07~D16)
