


109 年 12 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段連續壁工程施作、安全監測作業。
- 二、 G03 站臨時排水施作、安全監測作業、淺挖及覆蓋支撐系統架設。
- 三、 G04 站第一階段管線臨時遷移、臨時排水施作。
- 四、 VS4 通風豎井第一階段施工圍籬設置。
- 五、 G05 站既有管線遷移施作。
- 六、 VS5 通風豎井連續壁工程施作、安全監測作業、既有管線遷移施作。
- 七、 G06 站出入口新設圍牆施作、安全監測儀器安裝、連續壁導溝施作。
- 八、 VS6 通風豎井安全監測作業、中間柱施作、淺挖及第一層支撐開挖、北側(發進端)上、下行線地盤處理灌漿施作。
- 九、 連續壁、結構開挖施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 109 年 12 月 31 日，預定進度 5.55%，實際進度 5.62%。



南出土段(溝後街附近)連續壁鋼筋籠施作

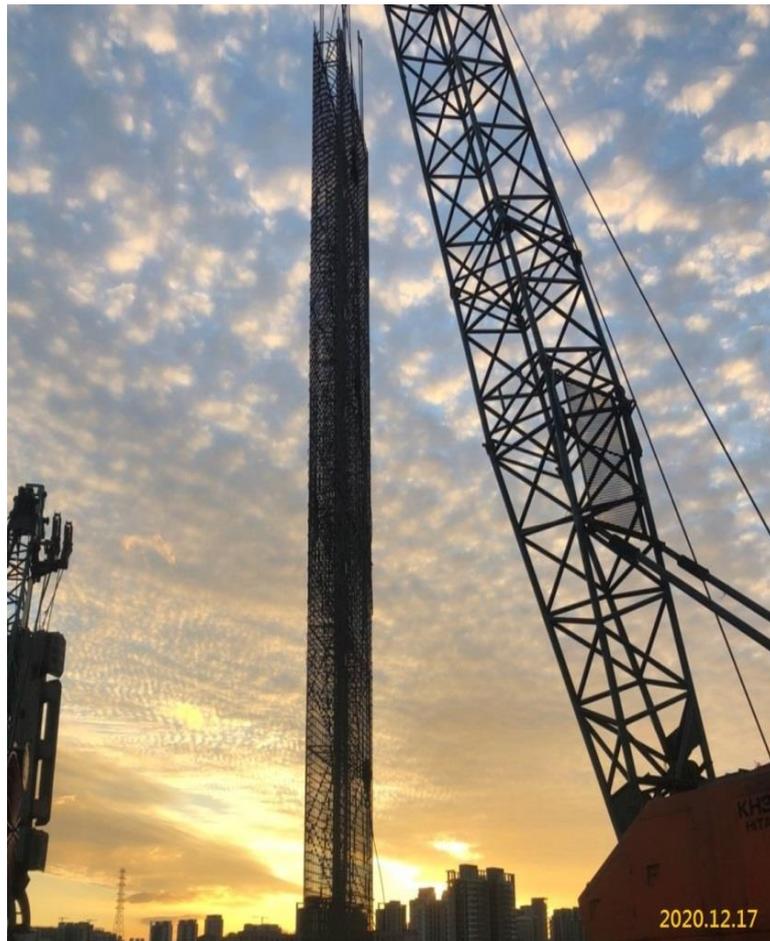


南出土段(溝後街附近)連續壁鋼筋籠吊放




南出土段(溝後街附近)連續壁單元施作



G03 站(巧克力街附近)覆蓋支撐系統橫樑架設

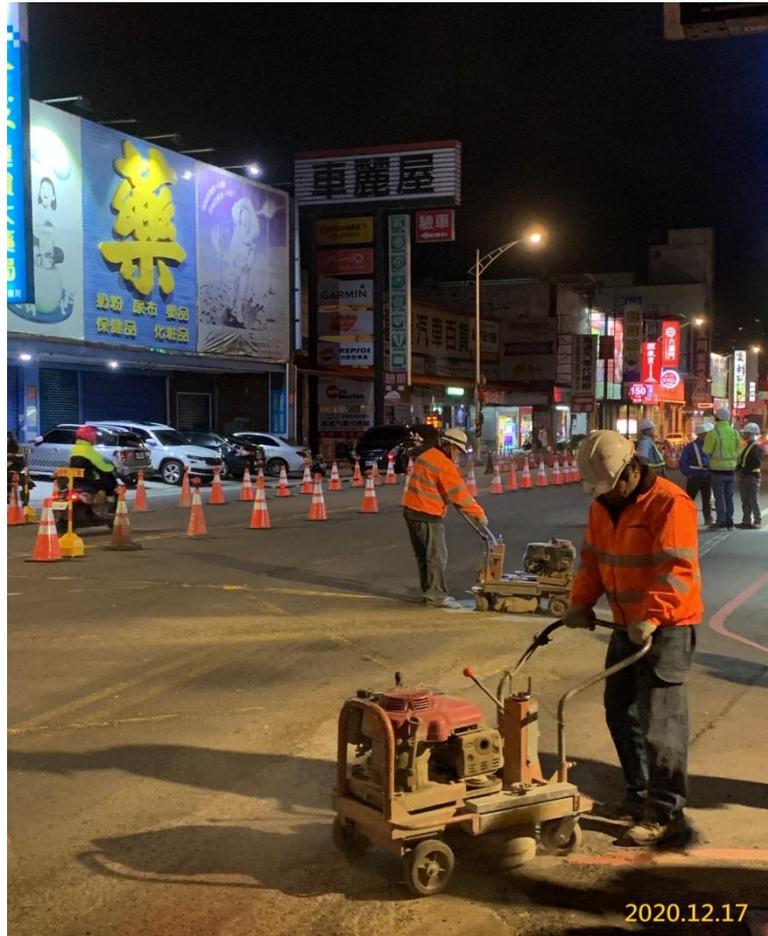

VS4 通風豎井(廣豐新天地旁)第一階段交通維持作業

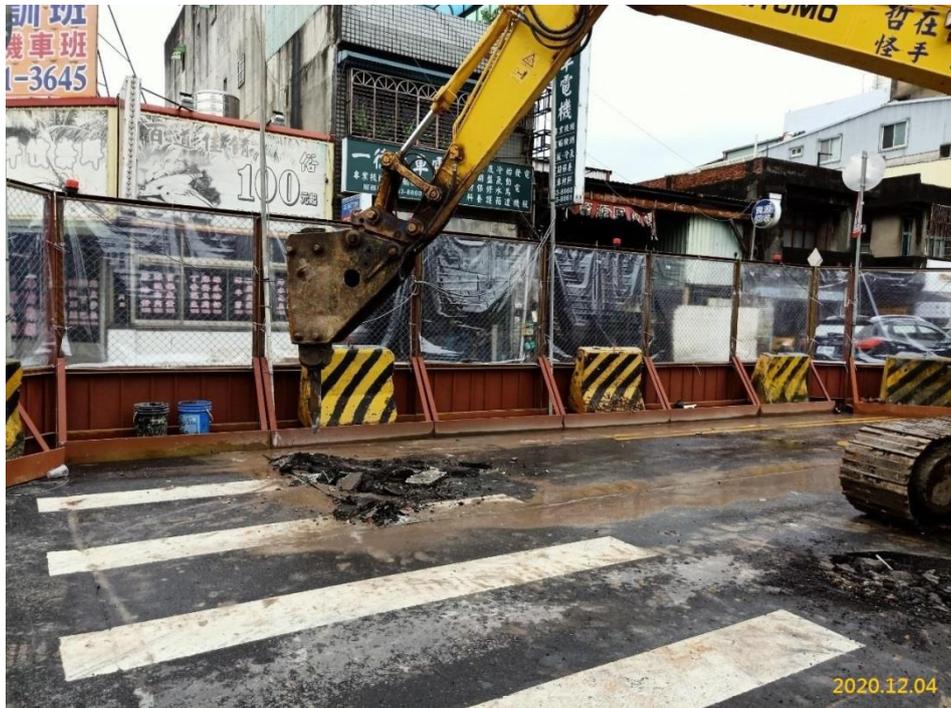

G05 站(介壽路自強街口、忠勇西街口)管線臨遷鋪面破碎



VS5 通風豎井(介壽路中華電信旁)連續壁單元施作



VS6 通風豎井(福豐公園)北側(發進端)上、下行線地盤處理鑽孔施作
