



109 年 11 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行第一階段連續壁施工、第二階段交維佈設、第二階段導溝、鋪面施作。
- 二、 G10 站進行連續壁施工。
- 三、 G11 站出入口連續壁施工、東側站體導溝、槽溝保護及連續壁施工。
- 四、 G12 站進行出入口槽溝保護及導溝施工、中間柱施工、橫置連續壁施工。
- 五、 北出土段進行全套管基樁、型鋼擋土樁。
- 六、 GC03 標截至 109 年 11 月 30 日，預定進度 4.46%，實際進度 5.01%。

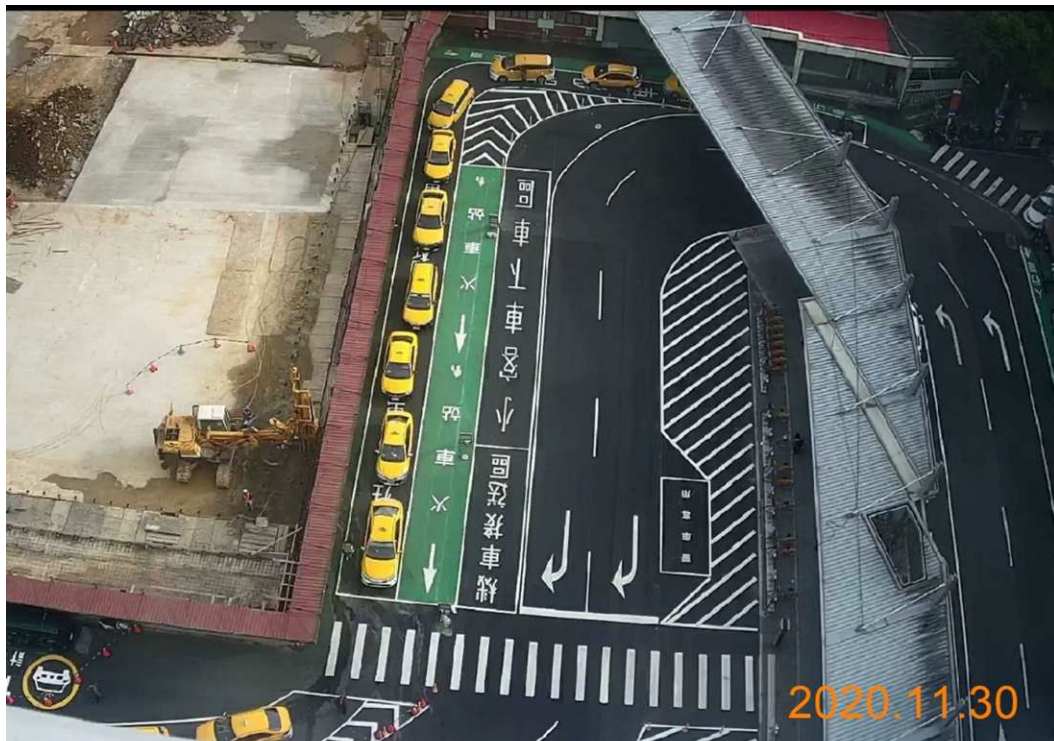

G07 站_第二階段圍籬外推交維施作完成

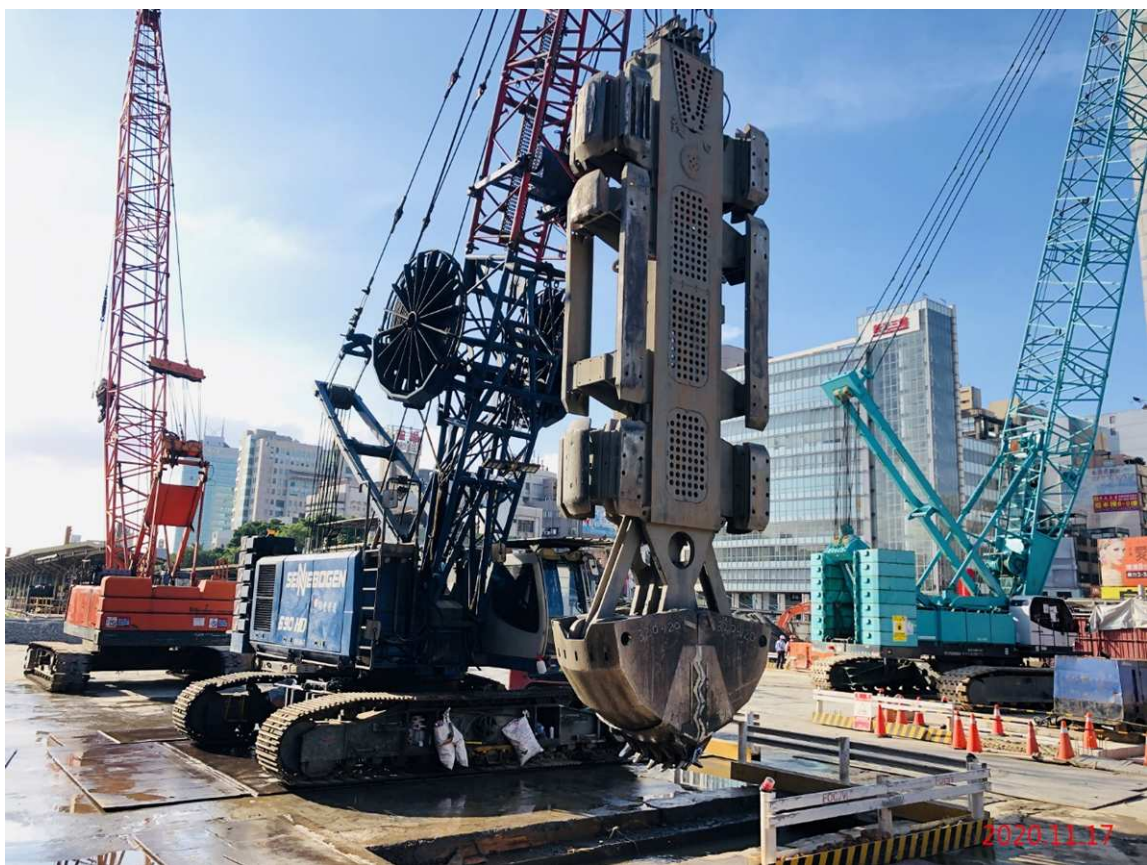

G07 站_連續壁單元抓掘



G07 站_連續壁單元鋼筋籠吊放



G07 站_第 2 階段連續壁工作平台鋪面鋼筋綁紮



G10 站_D041 單元鋼筋籠組立



G11 站_連續壁單元抓掘



G11 站_連續壁單元鋼筋籠吊放



G12 站_連續壁槽溝保護施作



北出土段_H 型鋼檔土支撐排樁施作
