

110 年 8 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱部分將持續進行施作，累計已完成 4 支鋼墩柱。
- (4) 建德路及新關道路持續進行帽梁施作，目前進行 P01-16、18 及 PG02-03 鋼筋綁紮，將接續進行模板組立及混凝土澆置，累計已完成 43 座帽梁。
- (5) 建德路及新關道路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)、P01-13~P01-15、P01-28~P01-31，累計 11 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P01-41~P01-43 底腹版模板組立，將接續進行鋼筋綁紮及混凝土澆置。
- (6) 新關道路已完成 P01-31~P01-34，累計 6 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) G01 車站出入口目前進行 1 樓柱牆第 3 區鋼筋綁紮及模板組立，將接續進行混凝土澆置；G02 車站出入口目前完成 1 樓柱牆第二層鋼筋綁紮，將接續進行模板組立及混凝土澆置。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 1,258 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 131 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 P13-16 及 P31-26R 第一層鋼筋綁紮，將接續進行 P13-16、P31-26R 第一層鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、P13a-30 第四層混凝土澆置，累計已完成 99 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行帽梁施作，目前進行 P12-05 鋼筋綁紮、P14-38 預力施拉及 P31-27 支撐架搭設，將接續進行 P12-05、P31-27 鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，累計已完成 76 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱、4 座鋼帽梁及 6 支軌道梁已吊裝完成，預計 9 月進行軌道版施作；G13a 車站 6 支鋼柱、6 座鋼帽梁及 10 支軌道梁已吊裝完成，預計 9 月接續進行軌道版施作。

- (6) 中正北路已完成 PG13-4~P13-1，累計 1 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P12-16-P12-17 底腹版模板組立，將接續進行混凝土澆置。
- (7) 中正北路已完成 P13-02~P13-26，累計 42 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (8) 中正北路已完成 P13-14~P13-14a，累計 2 支鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (9) G13 車站出入口目前完成 1 樓柱牆第二昇層 SEM 配管，將接續進行重型支撐架組立；G13a 車站出入口目前進行 1 樓版已完成混凝土澆置，將接續進行 1 樓柱牆模板組立及鋼筋綁紮；G14 車站出入口目前進行筏基地梁模板組立，將接續進行混凝土澆置；G31 車站出入口目前進行防水膜施作；G32 車站出入口目前進行 1 樓柱牆第二昇層鋼筋綁紮跟 SEM 配管，將接續進行重型支撐架組立。


三、GC01 標截至 110 年 8 月 31 日進度為 31.21%。



八德新闢道路 墩柱鋼筋綁紮



八德新闢道路 帽梁混凝土澆置

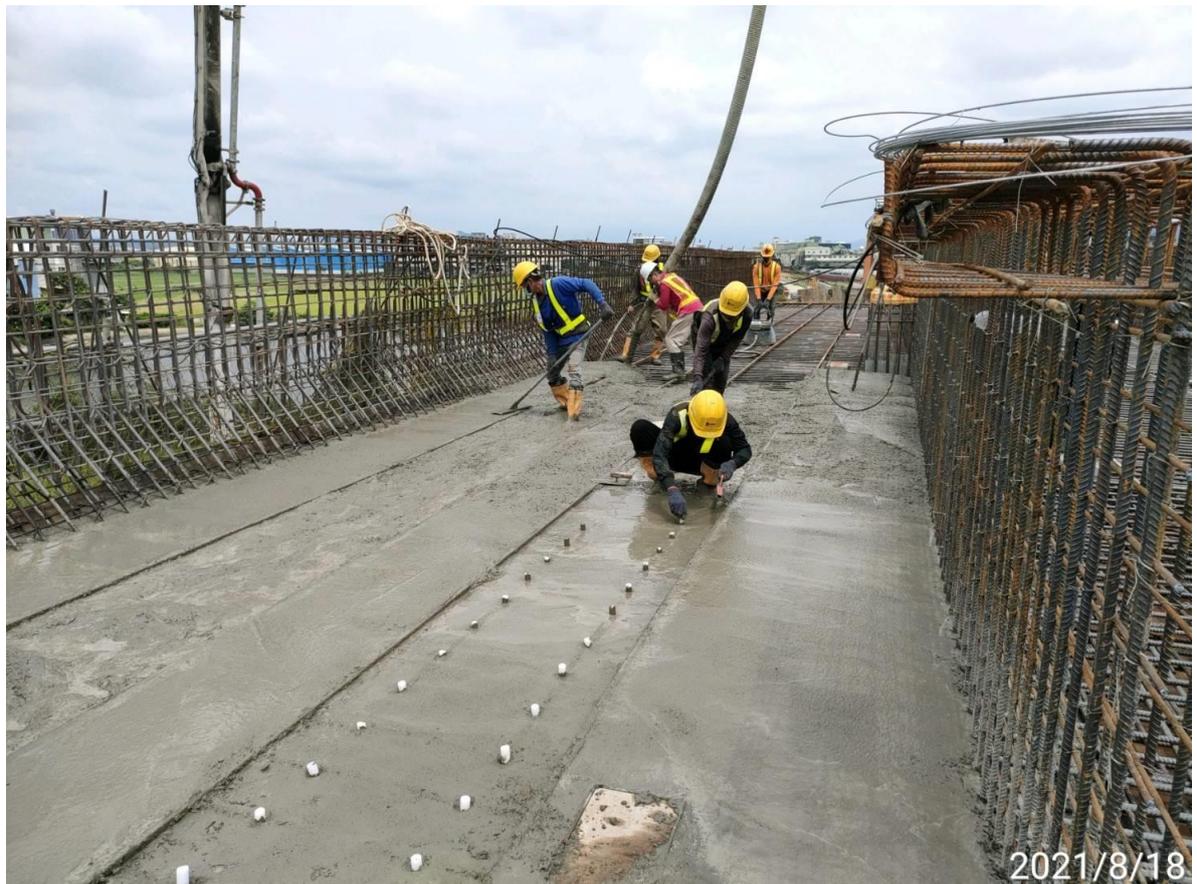

八德新闢道路 場鑄箱型梁頂版混凝土澆置



八德新闢道路 預鑄混凝土 U 型梁吊裝



八德新闢道路 G02 車站出入口施工現況



大園坑菓路 基樁混凝土澆置



蘆竹中正北路 樁帽鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 墩柱混凝土澆置搗實



蘆竹中正北路 帽梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 場鑄箱型梁底腹版模板組立



蘆竹中正北路 鋼箱型梁夜間吊裝



大園三民路二段 G31 車站出入口施工現況

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
