


109 年 8 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行導溝施作及連續壁施工。
- 二、 G10 站進行槽溝保護、導溝施工及管線遷移工作。
- 三、 G11 站出入口導溝施作及連續壁施工。
- 四、 G12 站進行東側連續壁施工、出入口槽溝保護及導溝施工。
- 五、 北出土段進行全區整地及臨時灌溉排水工程。
- 六、 GC03 標截至 109 年 8 月 31 日，預定進度 2.06%，實際進度 2.17%。



G07 站_連續壁挖掘機具組立

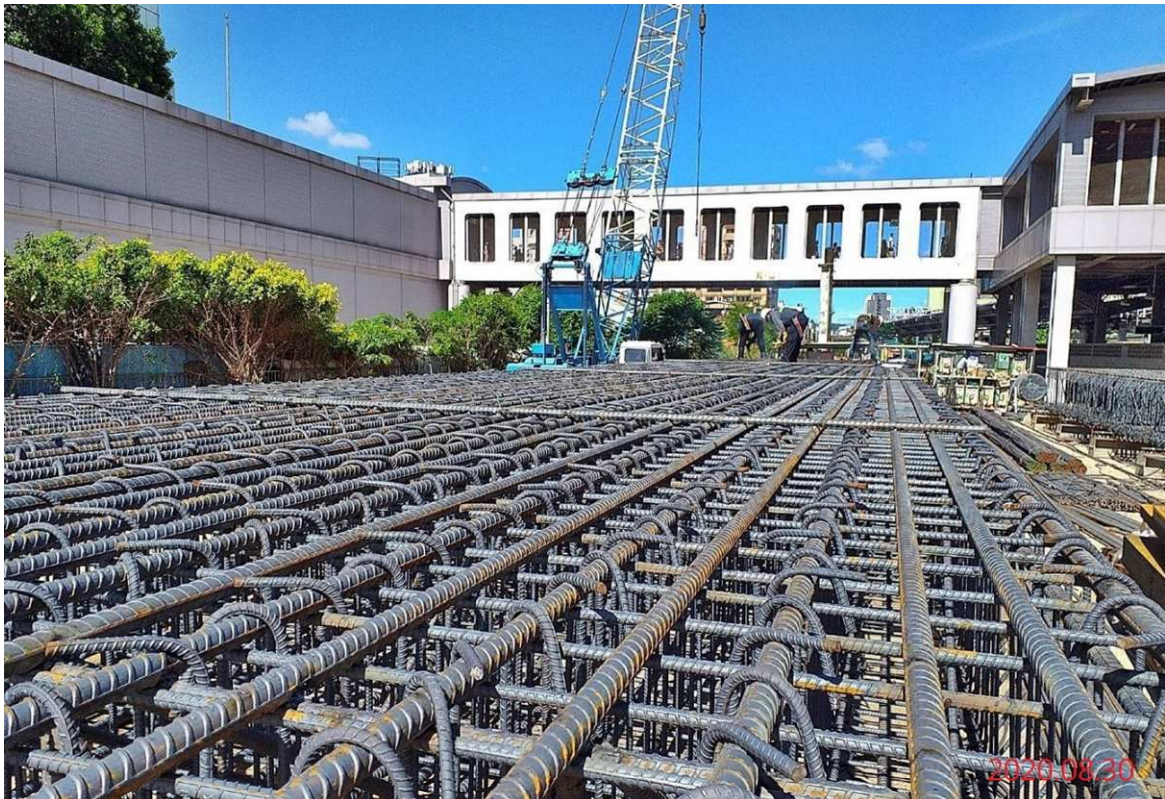


G07 站_連續壁鋼筋籠組立



G07 站_連續壁鋼筋籠吊放



G10 站_北工區鋪面鋼筋鋪設

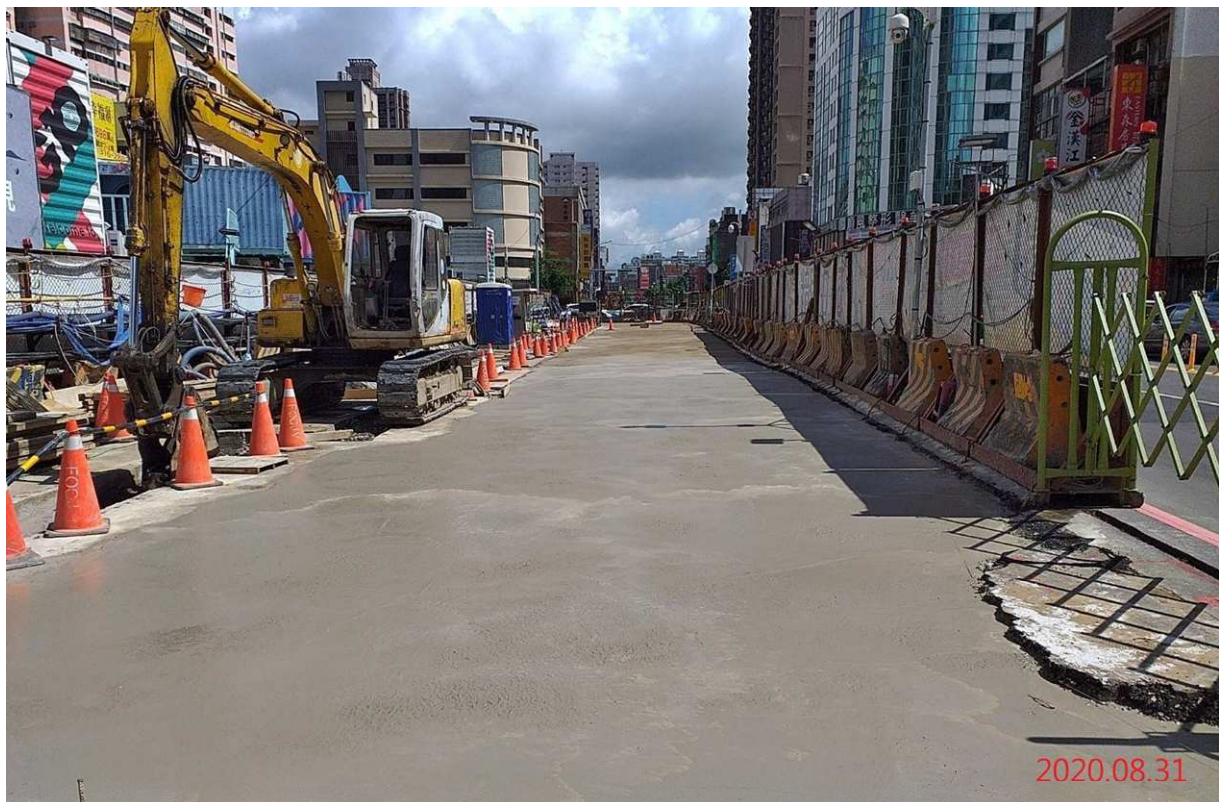

G10 站_北工區連續壁鋪面設置



G11 站_南工區鋪面澆置



G11 站_連續壁地盤改良作業



G12 站_連續壁單元鋼筋籠組立



G12 站_連續壁單元抓掘



北出土段_工區圍籬架設及臨時灌溉排水工程
