

## 112 年 3 月 GM01 標工程進度

桃園捷運綠線 GM01 標工程包含機電系統、軌道工程、北機廠及主變電站土建及其他機電工程等工項。

一、機電系統：各子系統刻正辦理期中及期末設計作業。

二、軌道工程：

(1). G13~G13a 上行線第五模(U42~U52)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

(2). G13~G13a 上行線第六模(U29~U41)完成鋼軌佈設、混凝土澆置。

三、北機廠土建工程：

(1). 北機廠 A 區完成第五層拌合填築作業。


(2). 北機廠 B 區辦理地表清理，擋土牆基礎開挖 120m。

(3). 北機廠 E 區持續辦理降挖作業，截至 3 月底約 94,500m<sup>3</sup>。


四、GM01 標截至 112 年 3 月 31 日進度為 13.96%。




G13~G13a 上行線鋼筋綁紮 ( U42-U52)

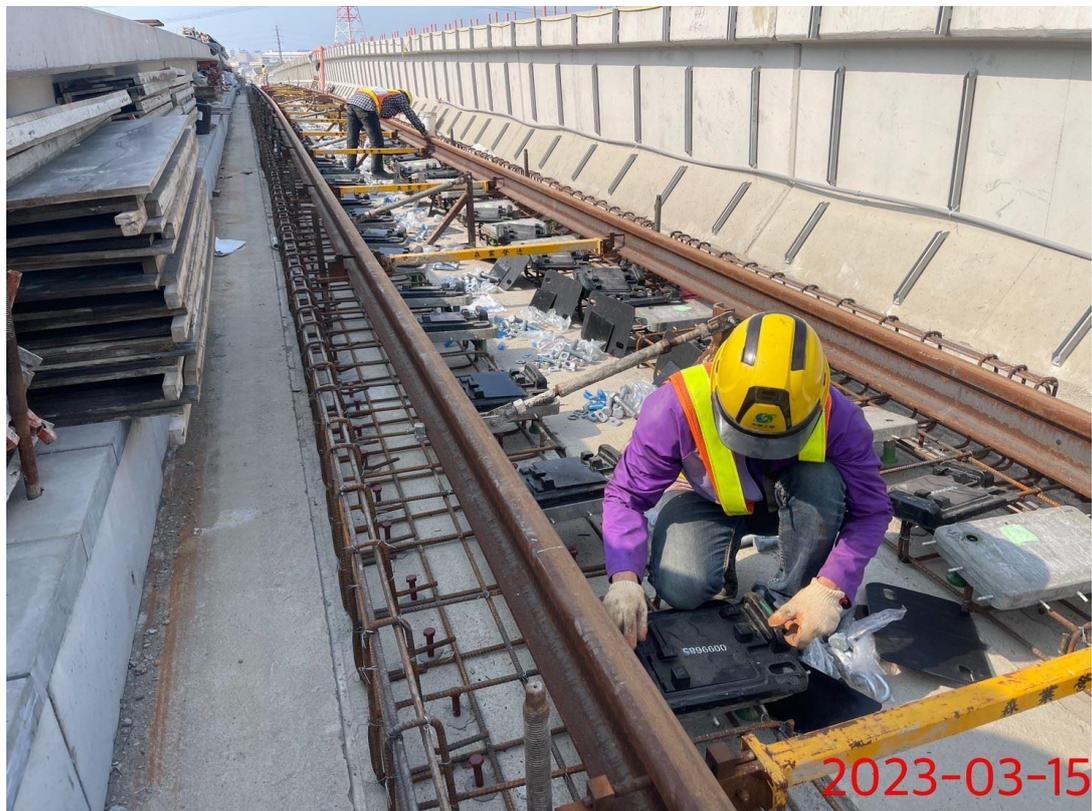

G13~G13a 上行線預鑄基底及基板佈設(U42-U52)

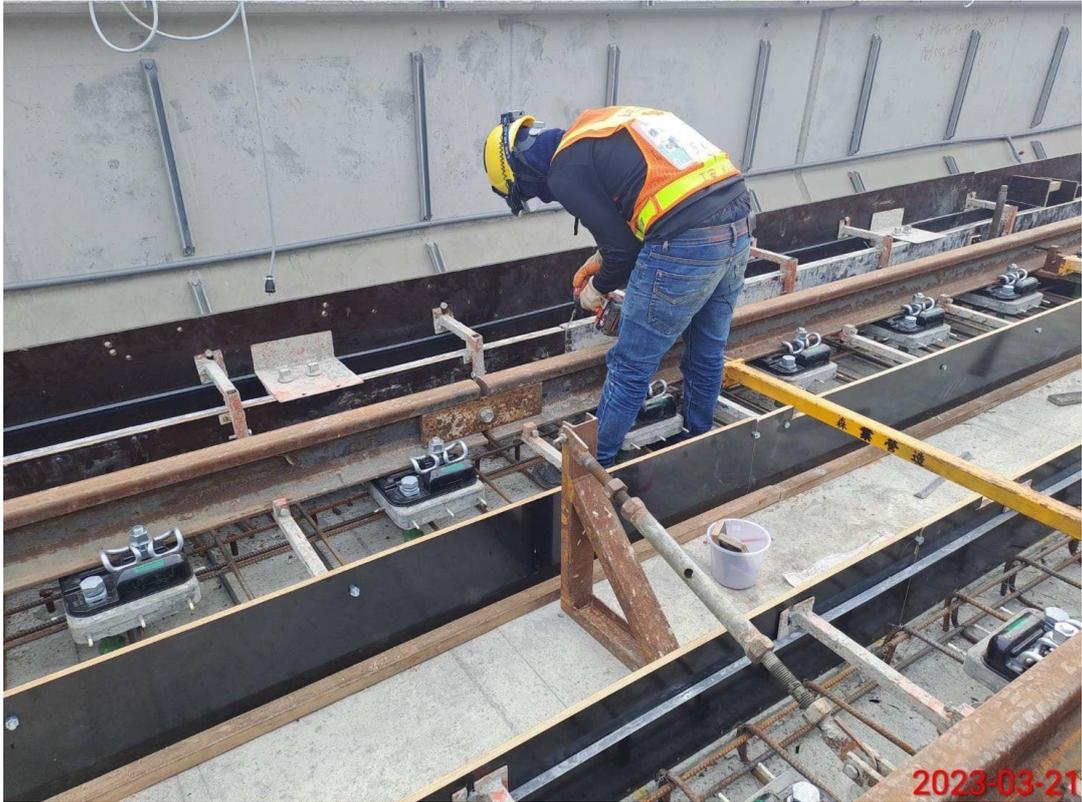

G13~G13a 上行線模板組立(U42-U52)

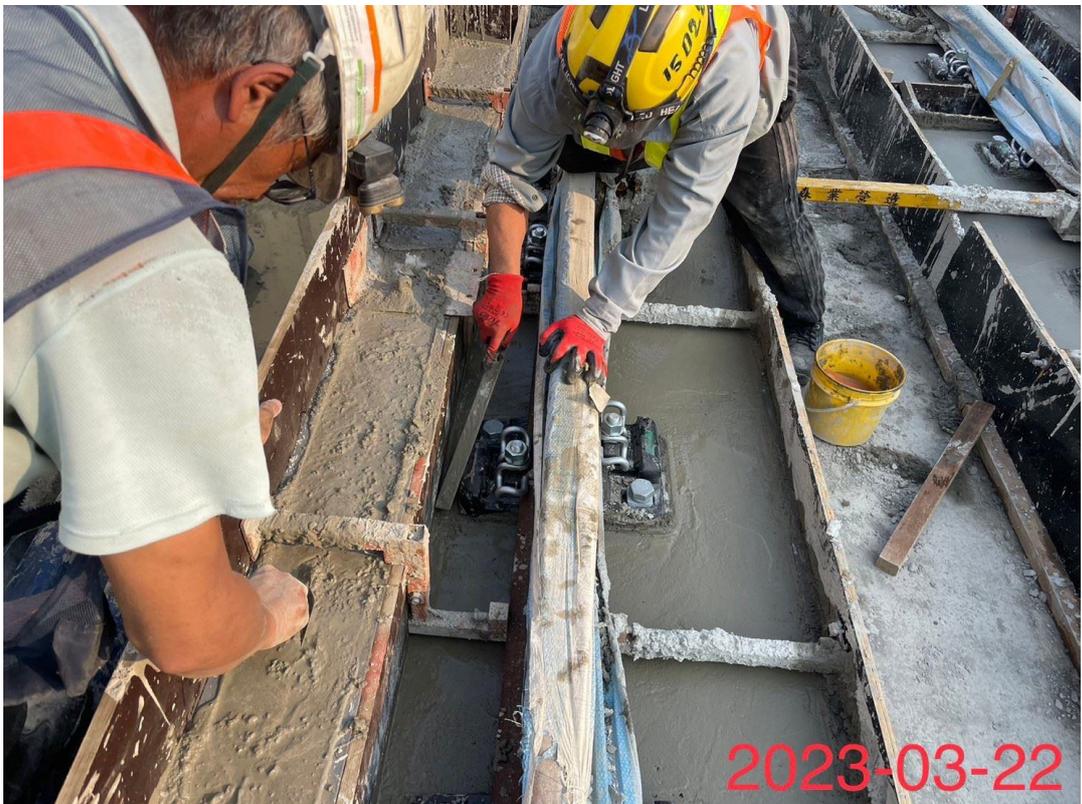

G13~G13a 上行線道床混凝土澆置(U42-U52)
