



112 年 7 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 60 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 4 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站出入口目前進行 RF 結構版梁模板組立及鋼筋綁紮、3 樓機房區油漆工程、2 樓機房區電氣系統施作及排水系統配管；G02 車站出入口目前進行露臺矮牆及水箱附屬設施施作、3 樓油漆工程。
- (10) G01 車站站體、G02 車站站體及連通道吊裝完成。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，預計 8 月上旬進行墩柱 P14a-01R&P14a-03 作業，累計已完成 212 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 PD-01、P14-26、PG32-8、P14a-01 及 03 作業，累計已完成 182 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 23 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-10 底腹版鋼筋綁紮、DU14-08(P14/15-19~P14-20)支撐架搭設；DU14a-01-4(PD-10~PD-9)頂版鋼筋綁紮含預埋件、PD-8~PD-9 搭架與組模；DU13a-10(P13a-26~P13a-25)頂版鋼筋綁紮及預埋件安裝。

- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 193 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 25 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。
- (8) G13 車站出入口目前進行擋土牆混凝土澆置、泥作工程、3 樓公共區電纜線槽及電管施工；G13a 車站出入口目前進行 3 樓二昇層與 RF 梁版作業、門窗工程及地坪已完成、1 樓機房區電氣系統施作；G14 車站出入口目前進行 2 樓柱牆第三昇層及 3 樓梁版混凝土澆置；G31 車站出入口目前進行 1 樓柱牆第二昇層及 2 樓版 SEM 配管作業；G32 車站出入口目前進行 5 樓梁板模版組立及鋼筋加工綁紮、1 及 2 樓油漆工程。
- 三、GC01 標截至 112 年 7 月 31 日進度為 67.00%。




北段 DU31-09 中央走道鋼模組立、鋼筋綁紮




北段帽梁 PD-03 盤支混凝土澆置



北段 DU14-01 橫縱梁螺栓穿鎖

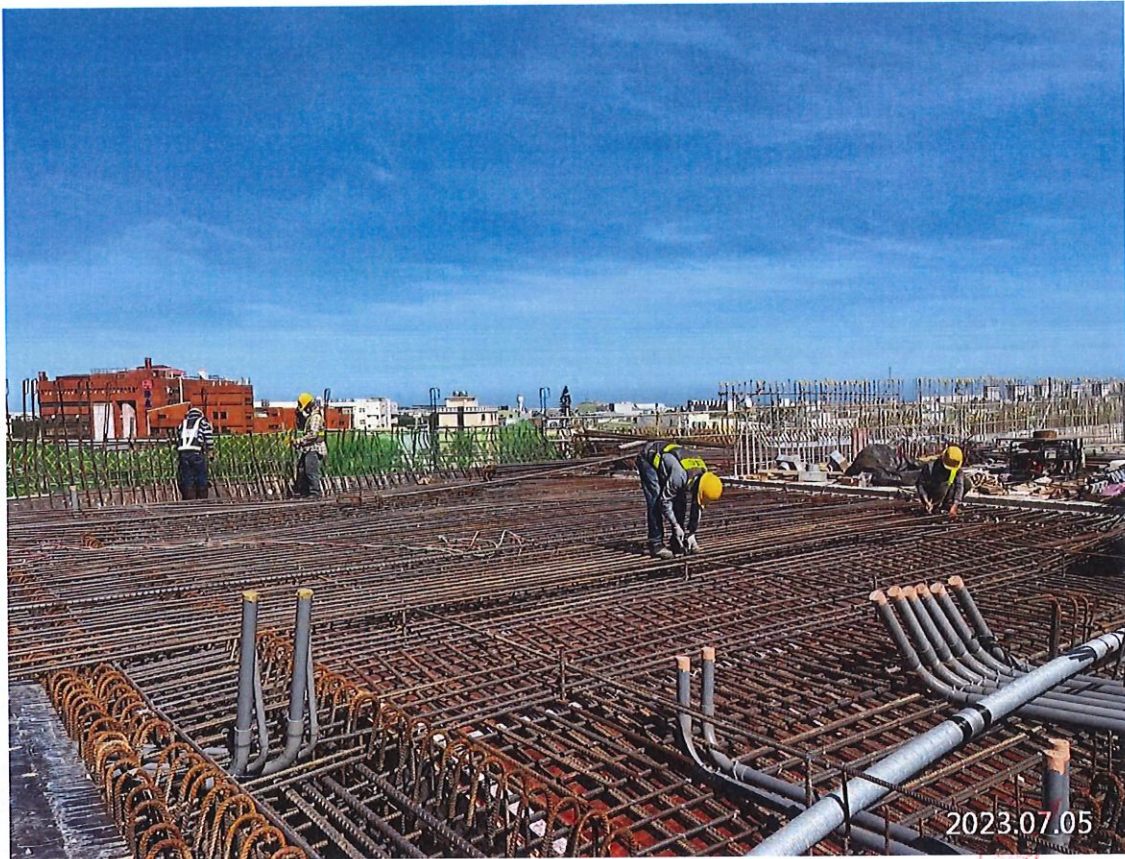

北段 P14-29 邊跨頂版鋼筋綁紮

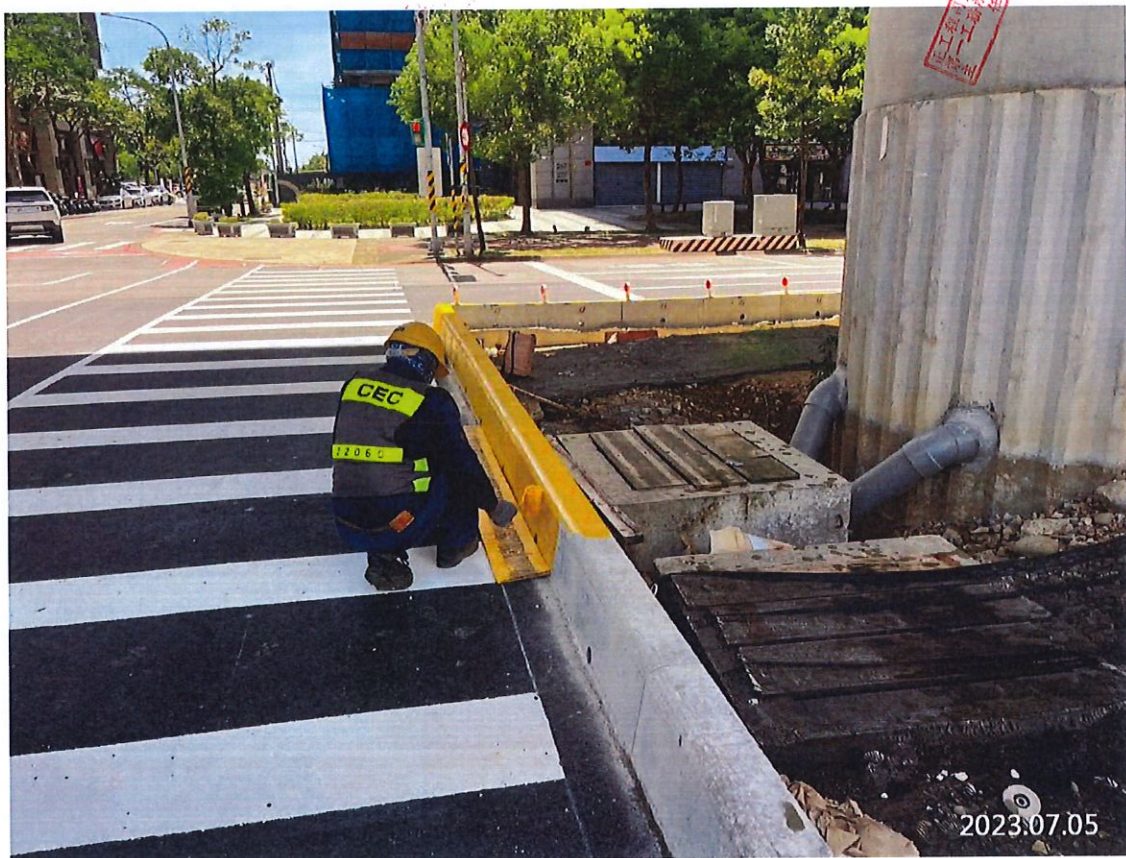

南段路緣石油漆繪製



G32 車站出入口三樓混凝土墊層澆置




北段 DU14-02 鋼箱梁吊裝



2023.07.10

G13 車站出入口二樓機房保護板施作

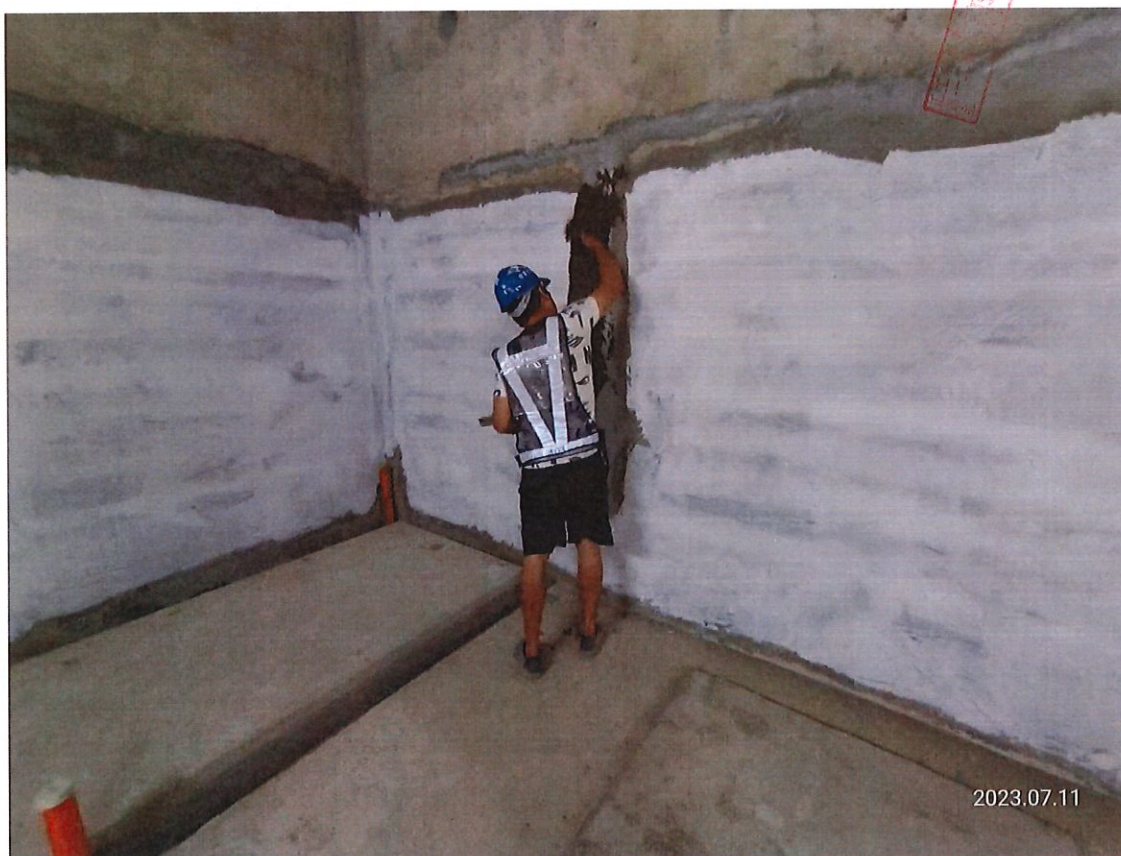


2023.07.11

G32 車站出入口二樓機房油漆批土



北段 DU13a-11 鋼筋綁紮

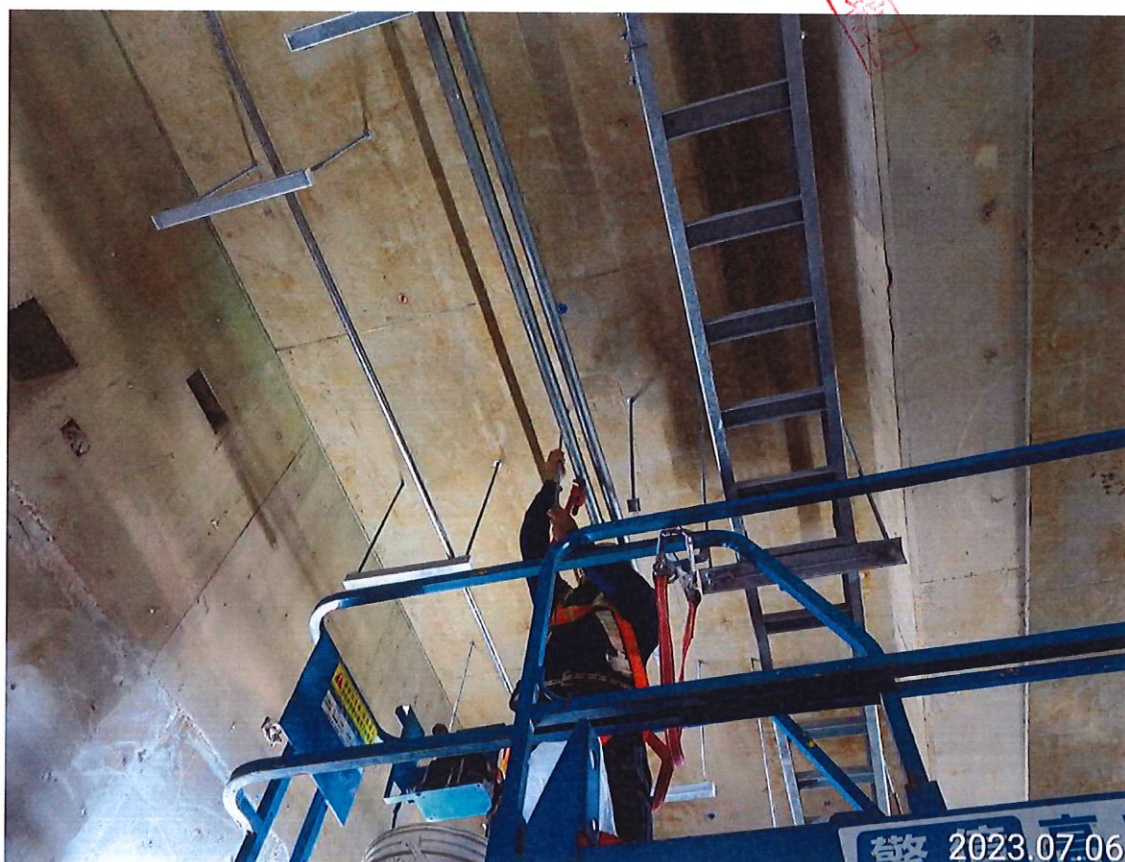

G13 車站電氣管路施作



G14 車站出入口三樓梁版鋼筋綁紮



G13a 車站月台層機房電氣管路施作

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
