

## 110 年 1 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 48 處樁帽。
- (3) 建德路及新闢道路持續進行墩柱施作，建德路部分已大部分施作完成，新闢道路部分 P01-25~P01-27 施工架搭設，將接續進行 P01-25~27、42 第三昇層鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 32 支墩柱。
- (4) 建德路及新闢道路持續進行帽梁施作，目前 P01-37、38 混凝土已澆置完成，將接續進行 PG01-4 鋼筋綁紮，累計已完成 24 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)，累計 6 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P01-13~P01-15、P01-28~P01-31 場鑄箱型梁施工架搭設。
- (6) G01 車站出入口出入口地梁鋼筋已綁紮完成，將接續進行 SEM 配管作業；G02 車站出入口目前進行底版鋼筋綁紮。


### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 846 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 87 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行墩柱施作，P13a-43 第四昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P13a-37 模板組立、P14-39 及 P14-40 施工架搭設，累計已完成 61 支墩柱。
- (4) 中正北路及南崁路二段持續進行帽梁施作，P13a-45、46 混凝土已澆置完成，將接續進行 P13-35 鋼筋綁紮及 P13a-41、42 支撐架搭設，累計已完成 33 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱已吊裝完成、G13a 車站 6 支鋼柱已吊裝完成 4 支，將接續進行柱內灌漿、鋼帽梁及軌道梁吊裝。
- (6) G13 車站出入口地梁鋼筋已綁紮完成，將接續進行混凝土澆置；G13a 車站出入口灌排已施作完成，將接續進行開挖及整地；G14 車站出入口防水膜已施作完成，將接續進行筏基底版鋼筋綁紮；G32 車站出入口目前進行底版鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置。

三、GC01 標截至 110 年 1 月 31 日，預定進度 19.83%，實際進度 19.98%。



八德建德路 樁帽鋼筋綁紮

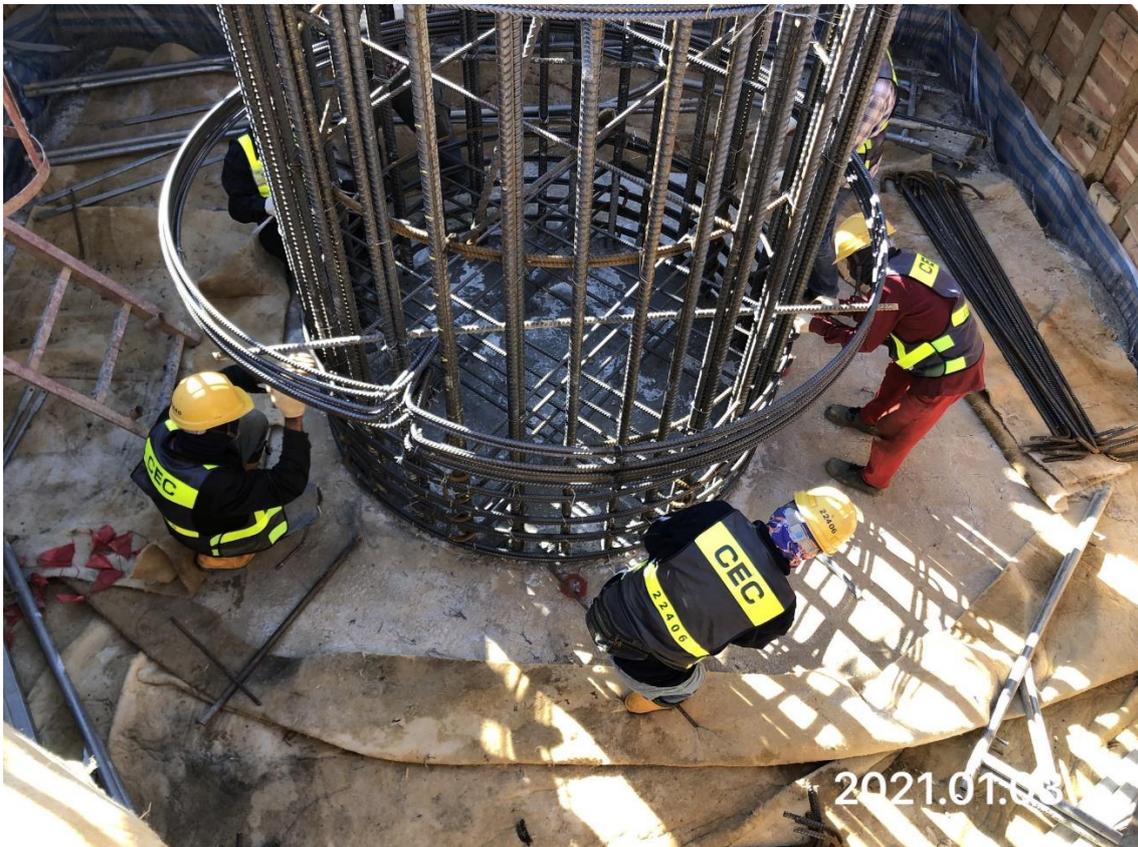


八德新關道路 墩柱鋼筋綁紮



八德新關道路 墩柱施作情形



八德新關道路 帽梁模板組立

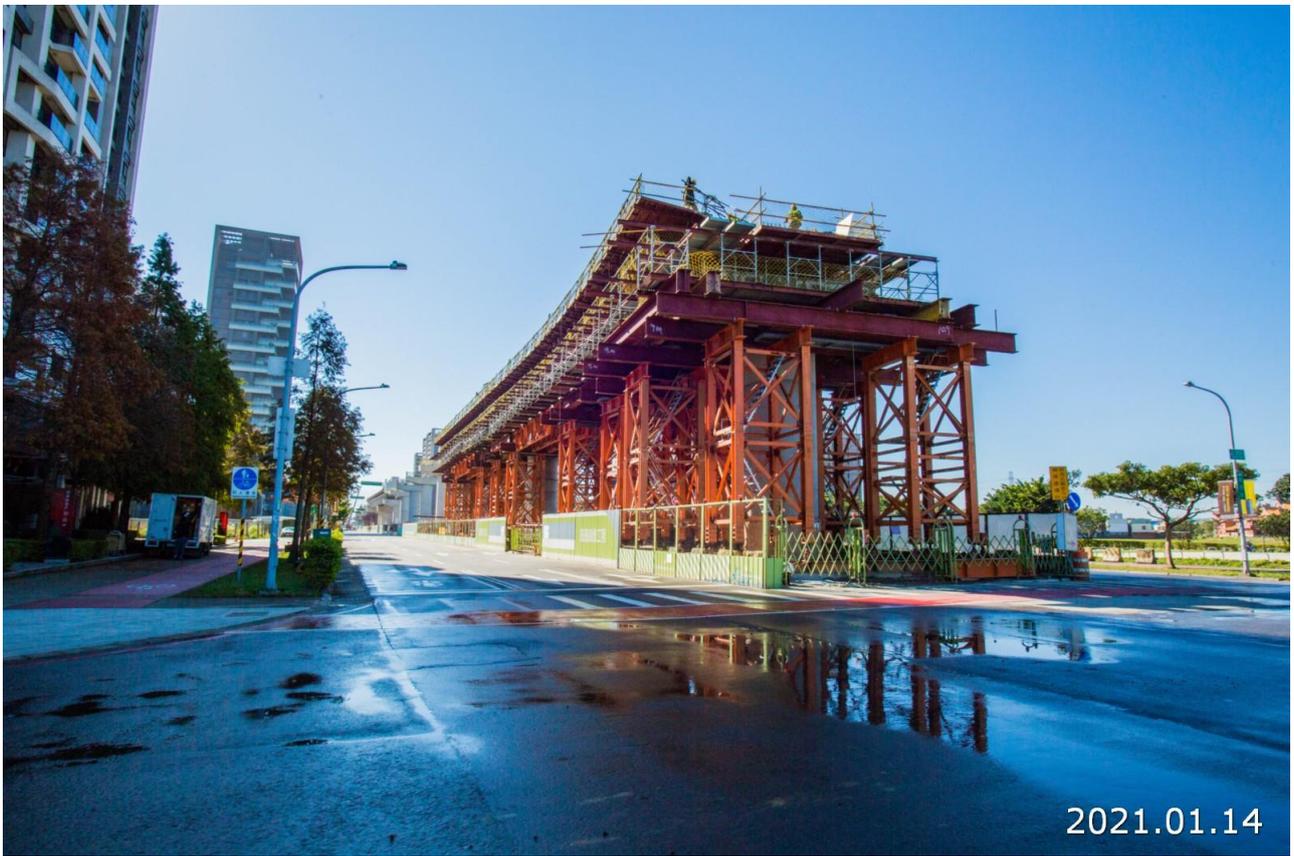

八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



大園坑菓路 基樁鋼筋籠吊放



大園三民路二段 樁帽基礎開挖



蘆竹南崁路二段 墩柱模板組立



蘆竹中正北路 墩柱施作情形



蘆竹南崁路二段 帽梁模板組立

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

