

109 年 9 月 GC01 標工程進度


一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 316 支基樁。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 31 處樁帽。
- (3) 建德路墩柱已大部分施作完成，目前新闢道路已完成墩柱 P01-30、31 第二昇層鋼筋綁紮，將接續進行第三及第四昇層鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 18 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-14 混凝土澆置，累計已完成 13 座。
- (5) 建德路已完成 P01-01~P01-02 場鑄箱型梁橋面版混凝土澆置，將接續進行 P01-06~P01-08 場鑄箱型梁外模組立，累計已完成 2 跨。
- (6) 新闢道路已完成施工便道及圍籬架設 1,050 公尺。
- (7) G01 車站出入口已完成出入口基礎鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置；G02 車站出入口已完成筏基防水膜施作，將接續進行筏基鋼筋綁紮。


二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 609 支基樁。
- (2) 中正北路及南崁路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 62 處樁帽。
- (3) 中正北路及南崁路二段分別完成墩柱 P13a-41、42 第一昇層混凝土澆置及 P13a-44、45 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P13a-40~42 第二昇層鋼筋綁紮及 P13a-44~55 第三昇層鋼筋綁紮，累計已完成 41 支墩柱。
- (4) 中正北路目前進行 P13-01 第一昇層混凝土澆置及 P12-10 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P13-30 鋼筋綁紮，累計已完成 17 座帽梁。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)中央分隔島已敲除，並完成第一階段交維改道，道路兩側交由管線單位進行管線遷移。

三、GC01 標截至 109 年 9 月 30 日，預定進度 11.86%，實際進度 12.34%。

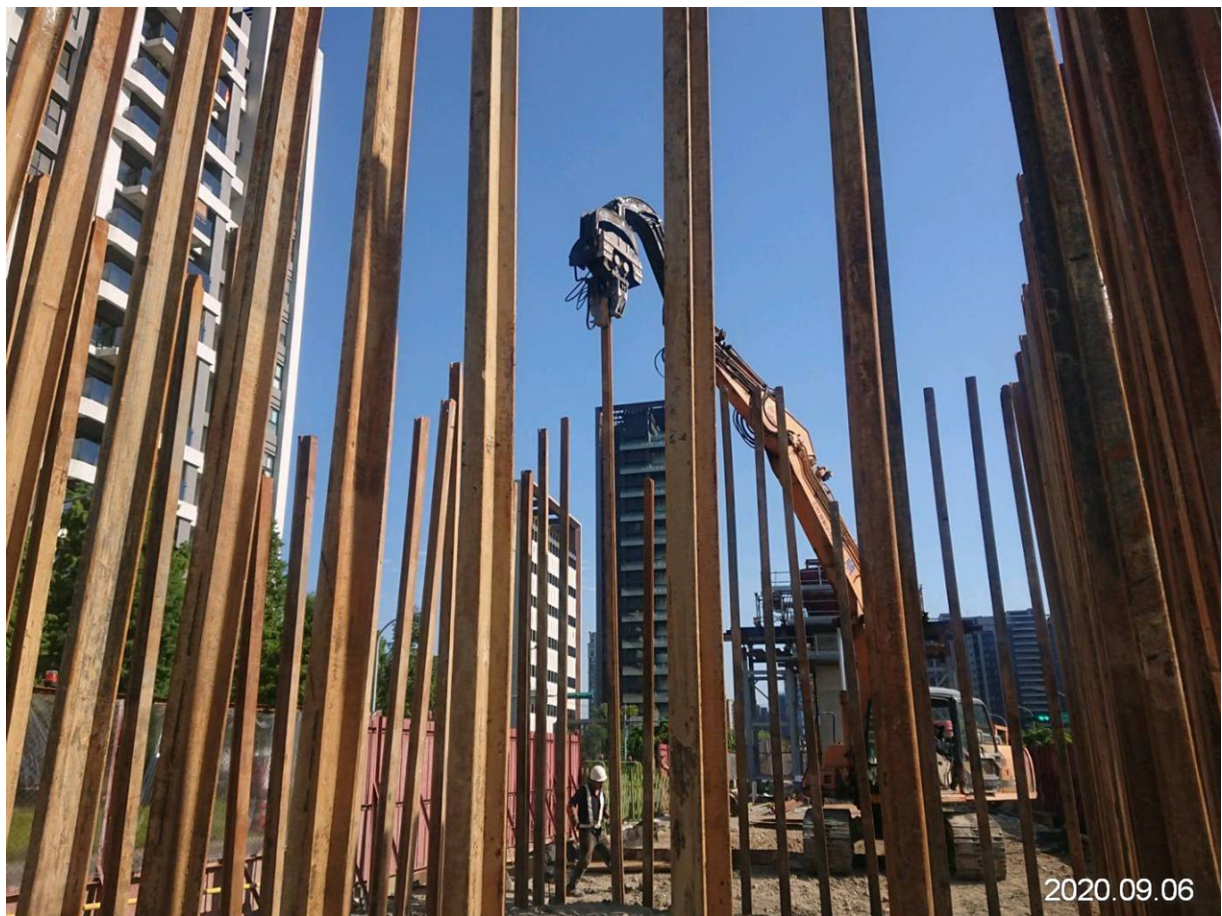

八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設

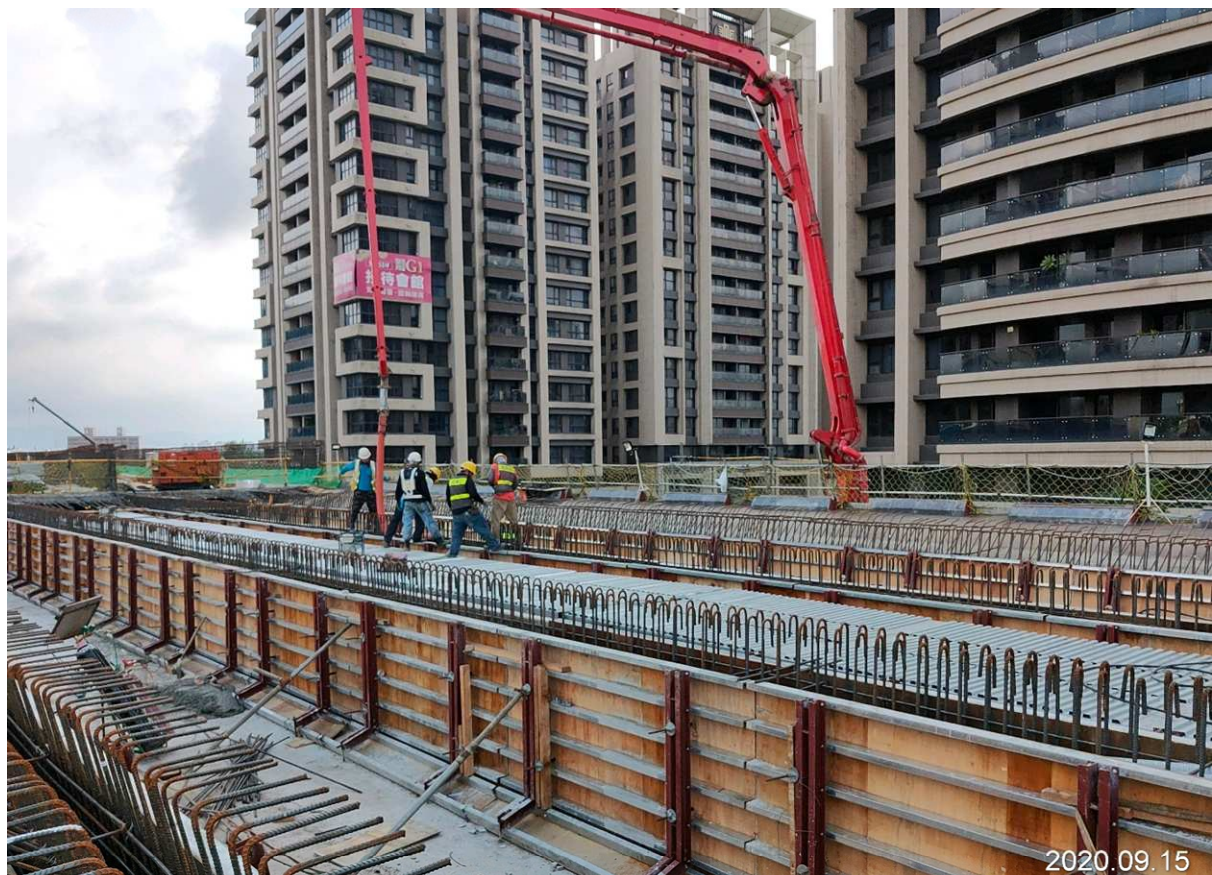

八德建德路 橋面版混凝土澆置



八德建德路 G01 站出入口防水膜施作



八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



蘆竹中正北路 基樁鋼筋查驗



蘆竹中正北路 樁帽混凝土澆置



蘆竹中正北路 墩柱鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 帽梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 下部結構施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 9 月 30 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	925	54.09%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	93	29.15%	129	40.44%
墩柱	墩	319	59	18.5%	92	28.84%
帽梁	座	291	30	10.31%	64	21.99%
橋面版	跨	308	2	0.65%	11	3.57%

工程進度更新至 109 年 9 月份實際進度。
