

## 109 年 11 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 337 支基樁。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 38 處樁帽。
- (3) 建德路墩柱已大部分施作完成，目前新闢道路已完成墩柱 P0101-15、P01-28 第四昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-26 第一昇層及 P01-36 第三昇層鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 27 支墩柱。
- (4) 建德路帽梁累計已完成 16 座，將接續進行新闢道路部分。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-02、P01-02~P01-03、P01-06~P01-08(上行線部分)4 跨場鑄箱型梁橋面版，將接續進行 P01-03~P01-04 場鑄箱型梁底模組立；P01-06~P01-08 場鑄箱型梁上行線鋼筋綁紮；P01-13~P01-15 場鑄箱型梁施工架搭設。
- (6) G01 車站出入口已完成出入口筏基底版混凝土澆置，將接續進行地梁鋼筋綁紮；G02 車站出入口目前進行筏基底版鋼筋綁紮。


### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站)持續進行基樁施作，累計已完成 709 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 76 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段分別完成墩柱 P13a-34 第二昇層及 P13a-41、42 第四昇層混凝土澆置，將接續進行 P12-17 第二昇層及 P13-36、37 鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 55 支墩柱。
- (4) 中正北路帽梁已完成 P13-30 混凝土澆置，將接續進行 P12-15、P13-09 模板組立及 P13-34 鋼筋綁紮，累計已完成 21 座帽梁。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)管線單位於 11 月 16 日完成管線遷移，目前該路段正進行施工圍籬架設。
- (6) G13 車站出入口已完成防水膜施作，將接續進行筏基底版鋼筋綁紮；G13a 車站出入口目前進行灌排施作等前置作業；G14 車站出入口目前進行一次接地施作，將接續進行整地及 PC 澆置；G32 車站出入口已完成整地及 PC 澆置，將接續進行防水膜施作。


三、GC01 標截至 109 年 11 月 30 日，預定進度 15.32%，實際進度 15.62%。



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設

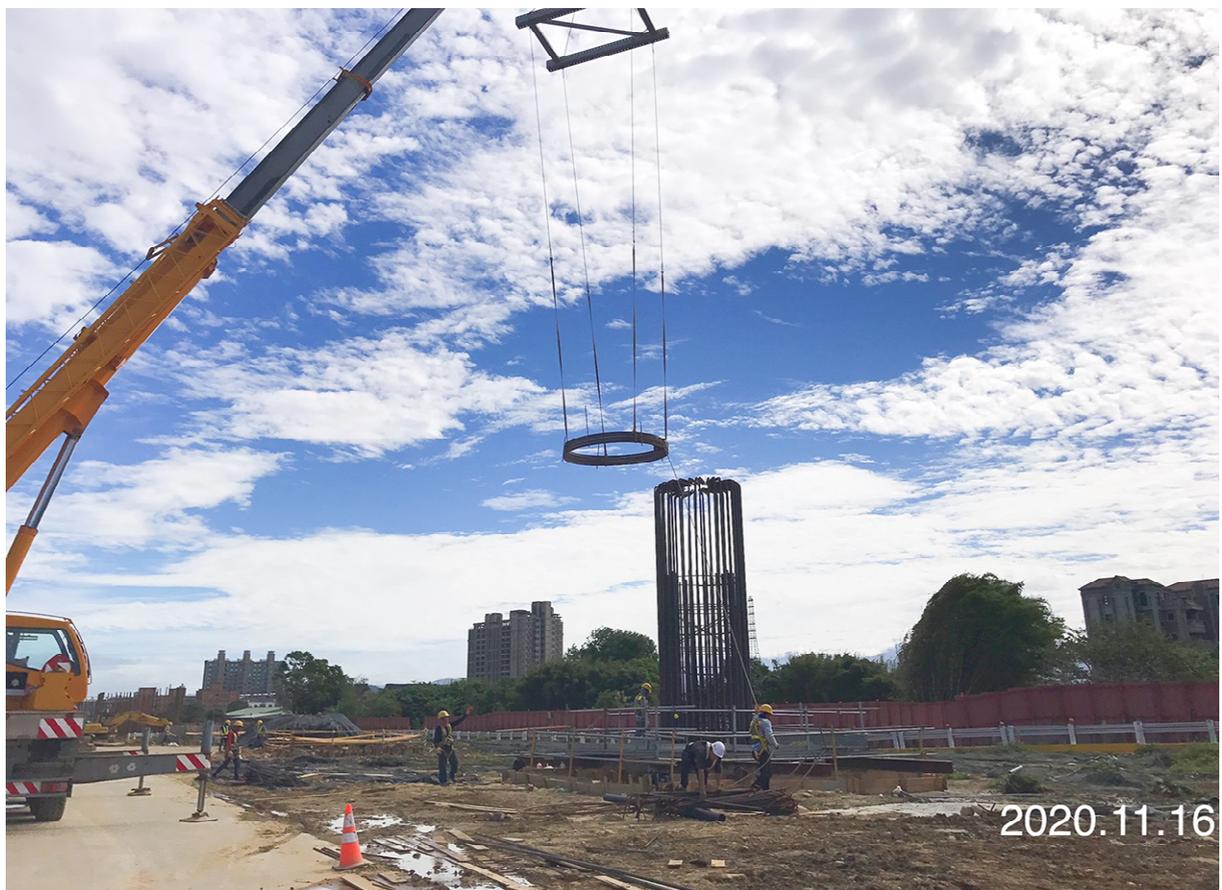

八德新闢道路 墩柱鋼筋施作

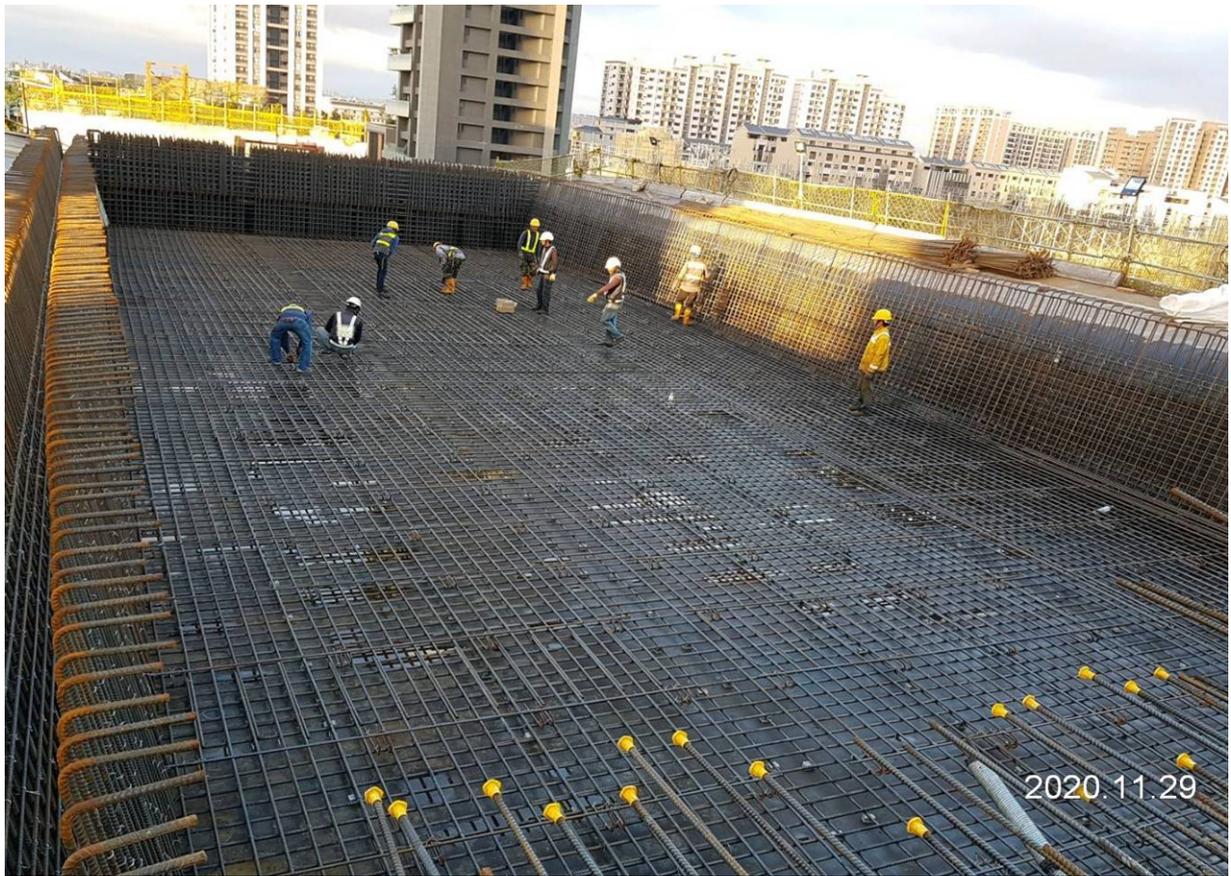

八德建德路 場撐箱型梁橋面版鋼筋綁紮



八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形




八德建德路 下部結構完成情形



蘆竹中正北路 基樁鑽掘



蘆竹中正北路 樁帽土方開挖

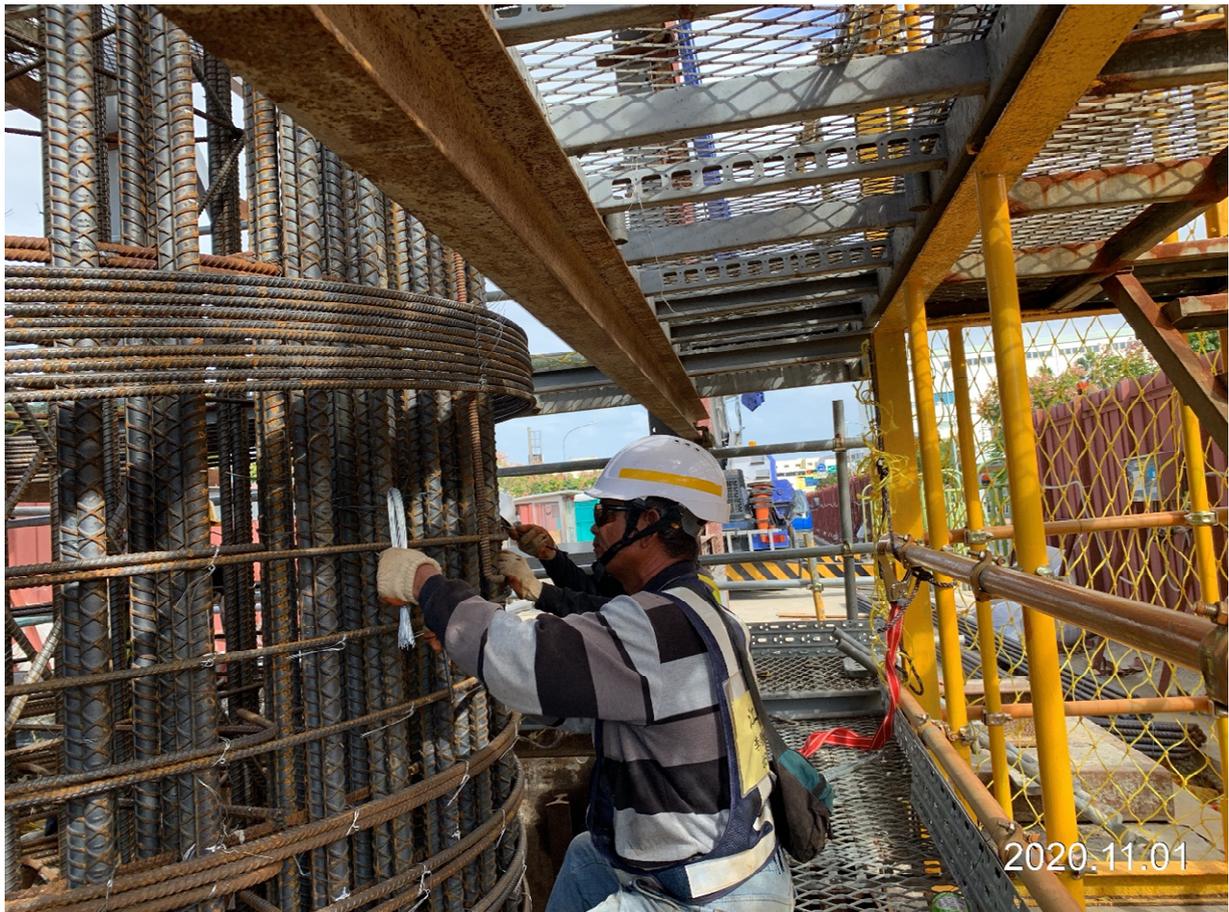

蘆竹中正北路 墩柱鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 帽梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 下部結構施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 11 月 30 日		109 年 12 月	
			完成數量	完成百分比	預計完成數量	預計完成百分比
基樁	支	1,710	1046	61.17%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	114	35.74%	129	40.44%
墩柱	墩	319	82	25.71%	92	28.84%
帽梁	座	291	37	12.71%	64	21.99%
橋面版	跨	308	4	1.3%	11	3.57%

工程進度更新至 109 年 11 月份實際進度。
