

## 109 年 10 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段施工圍籬架設、施工便道、導溝施作。
- 二、 G03 站臨時排水施作、安全監測儀器安全及定期監測作業、淺挖施作、覆蓋支撐系統架設。
- 三、 G03 站南側下行線潛盾隧道出發地盤處理灌漿施作。
- 四、 G04 站第一階段交通維持圍籬設置、安全監測儀器安裝。
- 五、 VS5 通風豎井管線臨遷、導溝施作、地盤處理灌漿施作。
- 六、 G06 站後備指揮部新設圍牆施作、配合交通維持計畫進行公園側臨時排水溝施作。
- 七、 VS6 通風豎井安全監測儀器定期監測作業、地盤處理灌漿施作、導溝、連續壁工程施作。
- 八、 連續壁、結構開挖施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 九、 GC02 標截至 109 年 10 月 31 日，預定進度 3.36%，實際進度 3.4%。



G03 站(巧克力街附近)潛盾隧道出發地盤處理灌漿




G03 站(巧克力街附近)覆蓋支撐系統架設



G04 站(介壽路八德農會前)交維圍籬佈設




VS5 通風豎井(介壽路中華電信旁)地盤處理灌漿施作

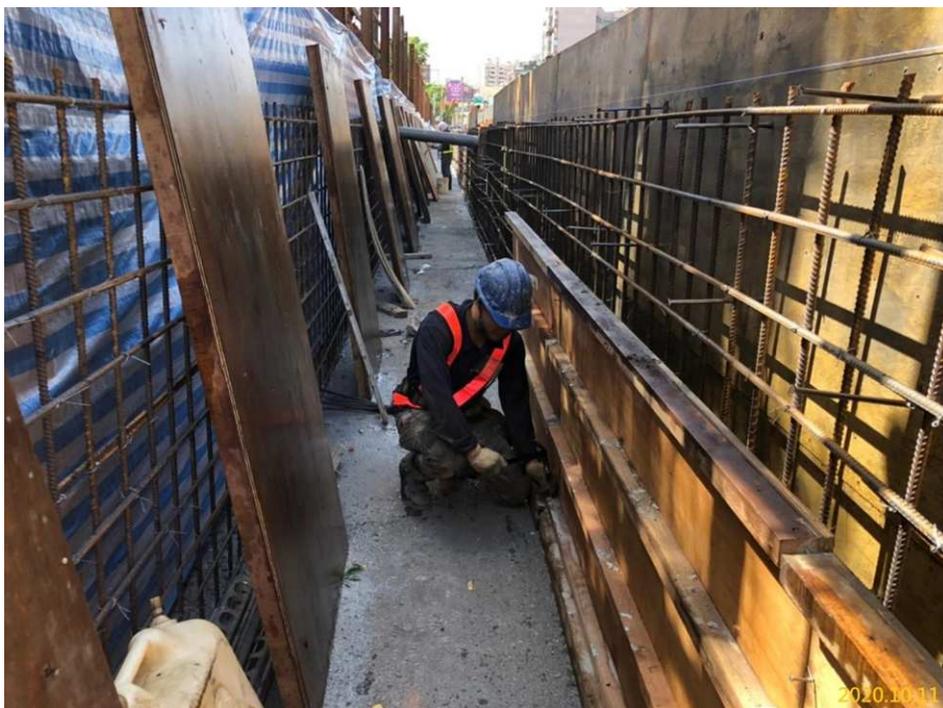

G06 站(福林公園)公園側臨時排水溝施作



VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁鋼筋籠施作

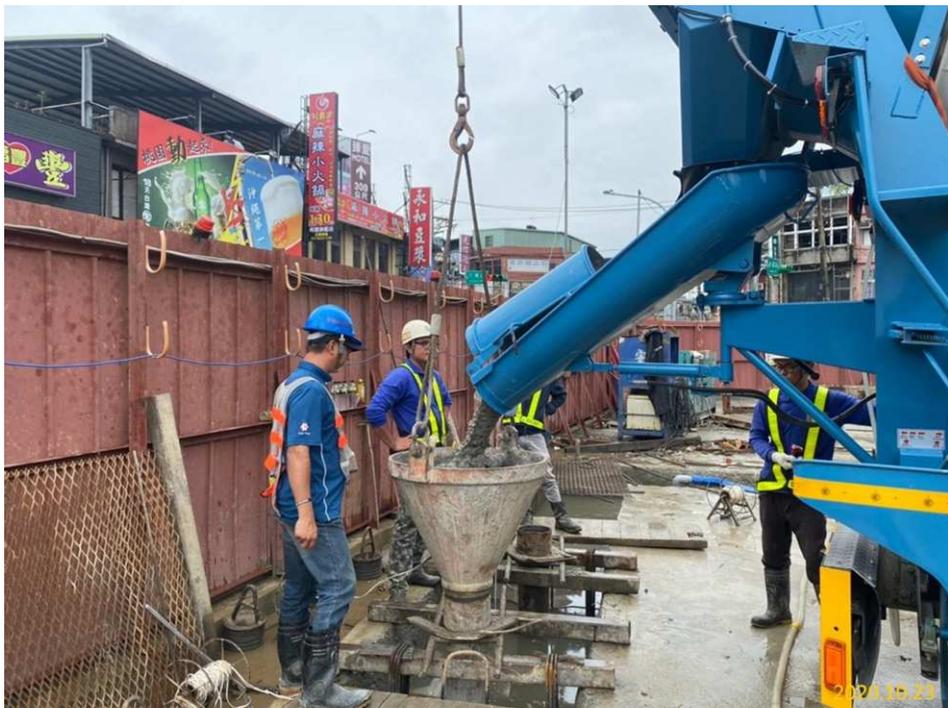

VS6 通風豎井(福豐公園)連續壁單元混凝土澆置
