

110 年 11 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：


- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路持續進行帽梁施作，目前進行 PG02-02 鋼筋綁紮及 PG02-03 模板拆除，將接續進行 PG02-02 模板組立及混凝土澆置，累計已完成 49 座帽梁。
- (5) 建德路及新關道路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08、P01-13~P01-15、P01-28~P01-31、P01-40~P01-41、PG02-04~P02-01，累計 13 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P01-41~P01-43 底腹版鋼筋綁紮。
- (6) 新關道路已完成 P01-18~21、P01-31~P01-39，累計 22 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 新關道路已完成 P01-15~18，累計 3 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) G01 車站出入口目前進行 2 樓版鋼筋綁紮；G02 車站出入口目前進行 2 樓版鋼筋綁紮。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站)持續進行基樁施作，累計已完成 1,384 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 152 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 P13a-17 第三昇層、P13a-23、P13a-25、P31-15 第一昇層鋼筋綁紮，將接續進行 P13a-17 第三昇層模板組立及混凝土澆置、P13a-23、P13a-25、P31-15 第一、二昇層鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，累計已完成 121 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 P13-01 模板組立、P14-43 第二昇層及 P31-25 鋼筋綁紮，將接續進行 P13-01、P14-43 及 P31-25 鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，累計已完成 95 座帽梁。
- (5) G13 車站目前進行月台梁二次件加工；G13a 車站完成軌道版混凝土澆置，將接續進行月台梁施

作。

- (6) 中正北路已完成 P12-16~PG13-1、PG13-4~P13-1、P13-36~PG13a-01(下行線)，累計 4 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P12-15~P12-16 頂版鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置。
 - (7) 中正北路已完成 P12-02~P12-14、P13-02~P13-14、P13-17~P13-34，累計 74 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
 - (8) 中正北路已完成 P13-14~P13-14a、P13-14a~P13-15，累計 2 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
 - (9) G13 車站出入口完成 2 樓版混凝土澆置，將接續進行施工架搭設；G13a 車站出入口目前進行 1 樓柱牆混凝土澆置，將接續進行施工架搭設；G14 車站出入口目前 1 樓柱牆模板組立；G31 車站出入口目前進行筏基地梁及 B2 版模板組立；G32 車站出入口目前進行 2 樓柱牆鋼筋綁紮。
- 三、GC01 標截至 110 年 11 月 30 日進度為 36.66%。

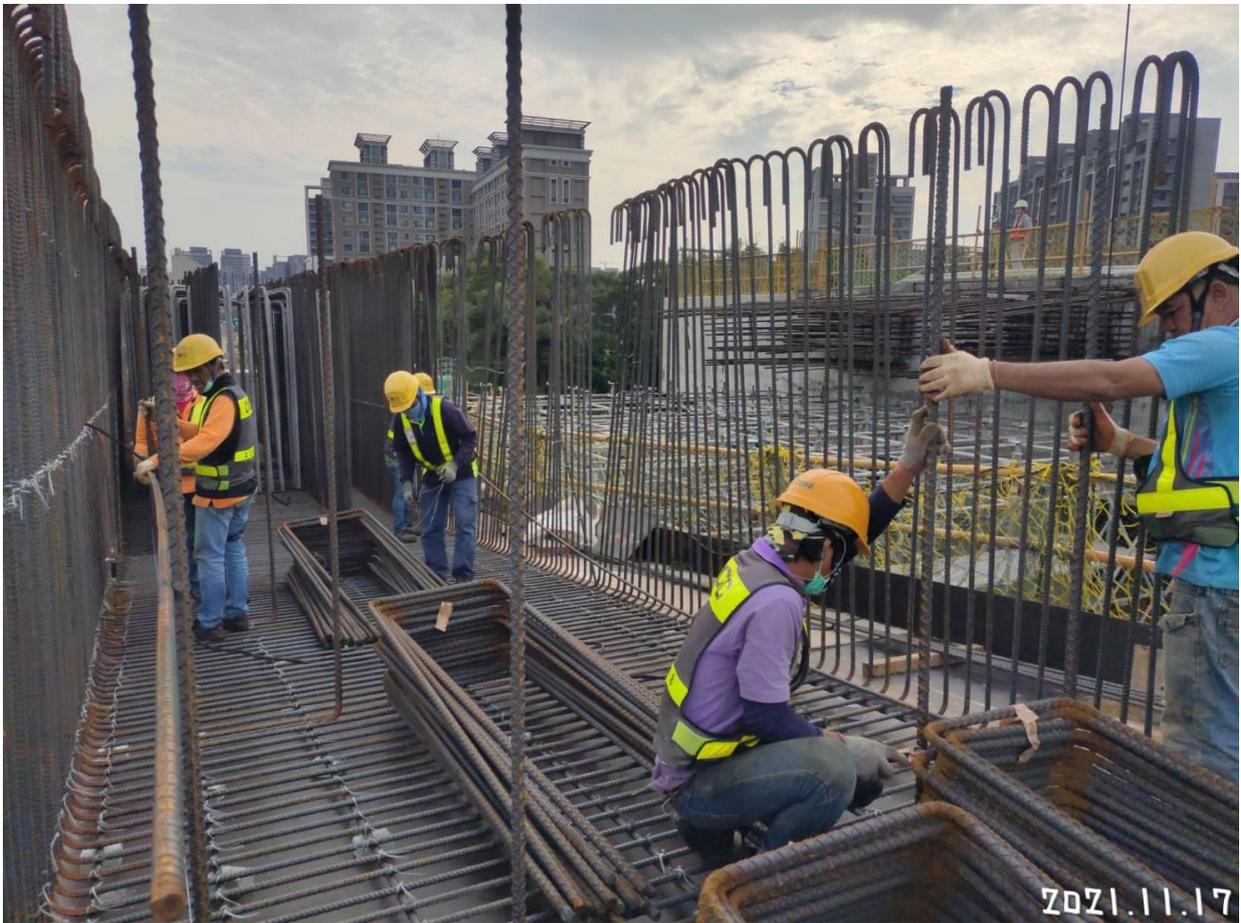

八德新闢道路 帽梁鋼筋綁紮




八德新闢道路 G01 車站出入口現況施作情形



八德新闢道路 鋼箱型梁吊裝



大園三民路二段 基樁混凝土澆置

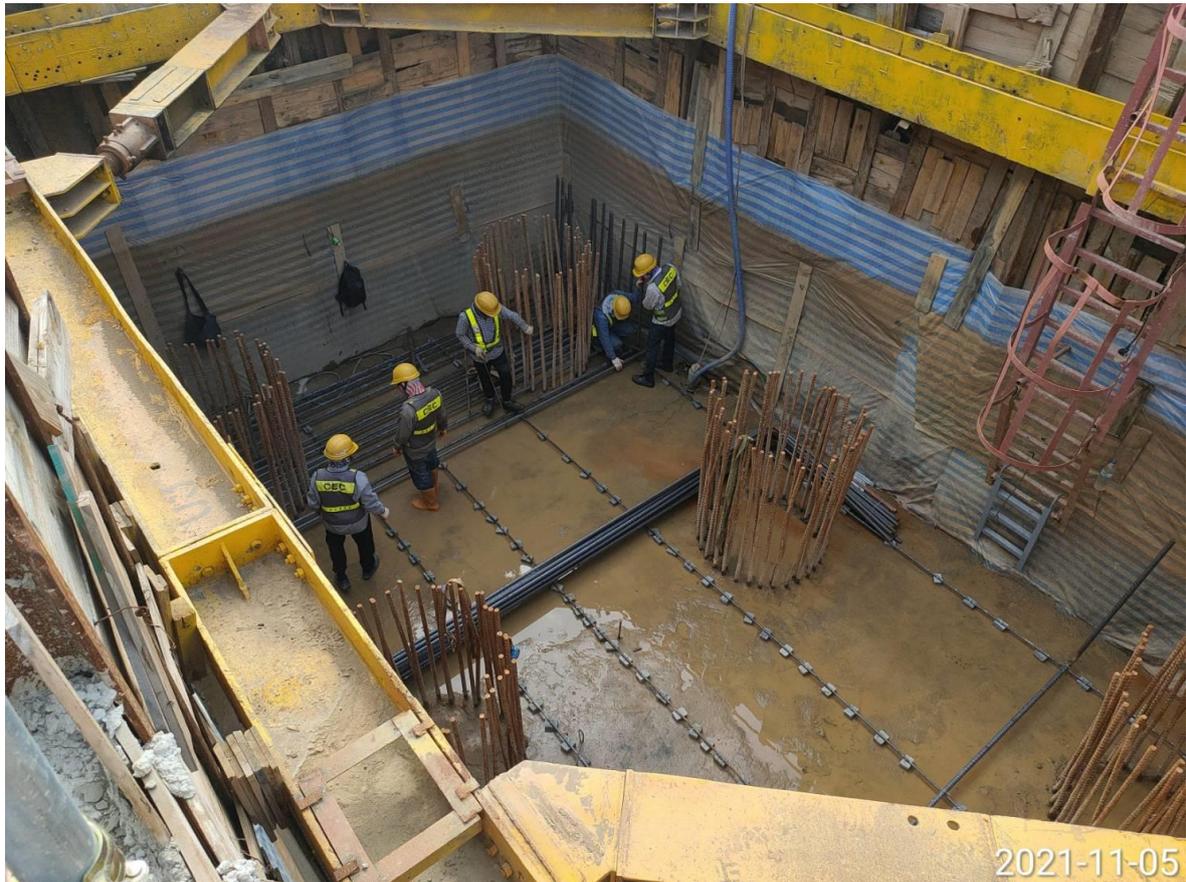

蘆竹南崁路二段 樁帽鋼筋綁紮



蘆竹蘆興街 墩柱混凝土澆置



大園坑菓路 帽梁混凝土澆置



蘆竹中正北路 場撐箱型梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 G13 車站出入口鋼筋查驗



蘆竹中正北路 鋼箱型梁夜間吊裝



大園坑菓路 崁下橋交維便橋現況施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
