

## 114 年 5 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 共同管道(建德路~建國路)人孔施工後查驗前抽水。
- (9) DU00-02 中央步道拆模作業。
- (10) 道路標誌修改。
- (11) 更寮腳溪復舊前置作業。
- (12) 雨水箱涵雙孔箱涵、漸變段銜接底版鋼筋綁紮及模板組立。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU13-01、DU13-01~G13a 車站橋面伸縮縫蓋板安裝、M34 路緣石基座鋼筋綁紮及樁帽開挖回填處開挖(P14/15-19~P14-25)、M36 路緣石基座鋼筋綁紮及樁帽開挖回填處開挖(P14/15-19~P14-25)、DU14a-01 單元胸牆外側修飾等。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。

(8) G13 車站目前進行站體鋁帷幕施作、出入口鋼構及格柵安裝、高架電纜線施工、1F 電氣系統配管東向牆鋁板滿焊施作等；G14(原 G13a)車站站體穿堂層玻璃帷幕骨架焊接、穿堂層東西側鋁板封板、出入口南向鋁板收尾、站體砲管分料等；G15(原 G14)車站出入口外牆帷幕骨架施作、站體月台層外牆磚鋪貼、PAO 拾面批土修磨噴漆、接地配管拉線、照明配管、火警管路配管照明系統配管等；G15a(原 G31)車站站體懸挑平台安裝、PAO 骨架安裝、2F 電力系統配管、1F 照明系統配管、高架電纜線施工作業等；G15b(原 G32)車站站體穿堂層 PAO 骨架安裝施作及連通道 ATM 不銹鋼內牆安裝月台層輕隔間二次封板施工、4F 電力系統線槽施工等。


三、GC01 標截至 114 年 5 月 31 日進度為 85.41%。



G13 車站站體外牆帷幕施作



G14(原 G13a)車站 3F 火警系統配管

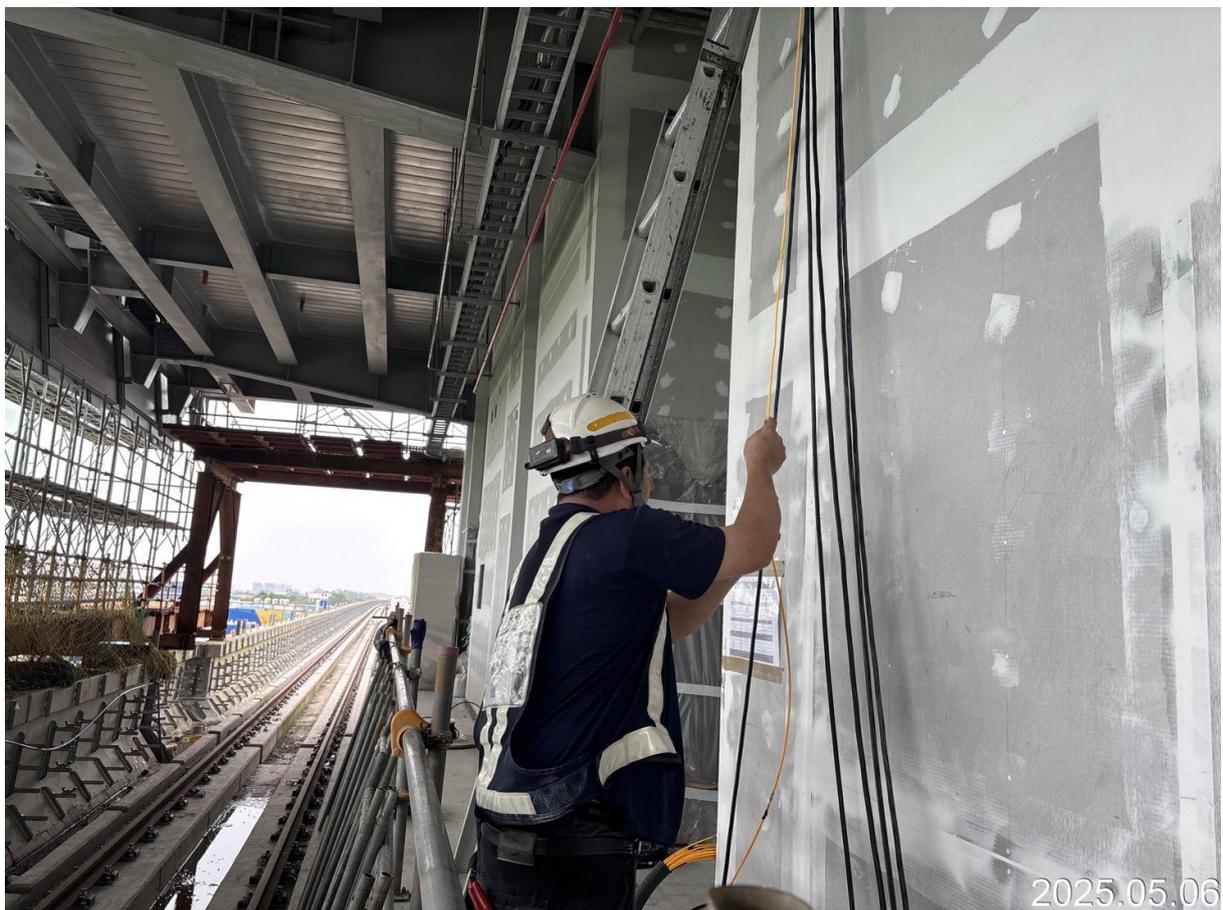

G15(原 G14)車站 2F 低污染氣體滅火系統施工



G15b(原 G32)車站站體穿堂層廁所防水施作



G15b(原 G32)車站 4F 電氣系統拉線
