

110 年 3 月 GC01 標工程進度


一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 58 處樁帽。
- (3) 建德路及新闢道路持續進行墩柱施作，建德路部分已大部分施作完成，新闢道路部分 P01-22~P01-23 第一、二昇層鋼筋綁紮，將接續進行 P01-22~P01-23 第一、二昇層混凝土澆置，累計已完成 42 支墩柱。
- (4) 建德路及新闢道路持續進行帽梁施作，目前 P01-42 混凝土已澆置完成，將接續進行 PG02-4、P02-1 及 PG01-03 鋼筋綁紮，累計已完成 26 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)、P01-13~P01-15、P01-28~P01-29，累計 9 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P01-29~P01-31 場鑄箱型梁底腹版模版組立，將接續進行底腹版混凝土澆置。
- (6) G01 車站出入口目前進行 1 樓版鋼筋綁紮作業，將接續進行 1 樓版混凝土澆置；G02 車站出入口目前進行地梁鋼筋綁紮，將接續進行地梁混凝土澆置。


二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站)持續進行基樁施作，累計已完成 956 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 98 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行墩柱施作，P13a-35~P13a-36 第五昇層混凝土已澆置完成，將接續進行 P14-45~46 施工架搭設，累計已完成 70 支墩柱。
- (4) 中正北路及南崁路二段持續進行帽梁施作，目前進行 P13a-40 混凝土澆置，將接續進行 P13a-03 鋼筋綁紮及模板組立，累計已完成 41 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱已吊裝完成、G13a 車站 6 支鋼柱已吊裝完成 4 支，目前 G13 車站 4 支鋼柱柱內灌漿、鋼帽梁及軌道梁已施作完成，將接續進行 G13a 車站其他 2 支鋼柱吊裝及 6 支鋼柱之柱內灌漿、鋼帽梁及軌道梁施作。
- (6) G13 車站出入口目前進行防水膜施作，將接續進行基礎回填；G14 車站出入口預計 4 月進行筏基鋼筋綁紮；G32 車站出入口目前進行地梁鋼筋綁紮，將接續進行地梁混凝土澆置。

三、GC01 標截至 110 年 3 月 31 日，預定進度 22.08%，實際進度 22.78%。

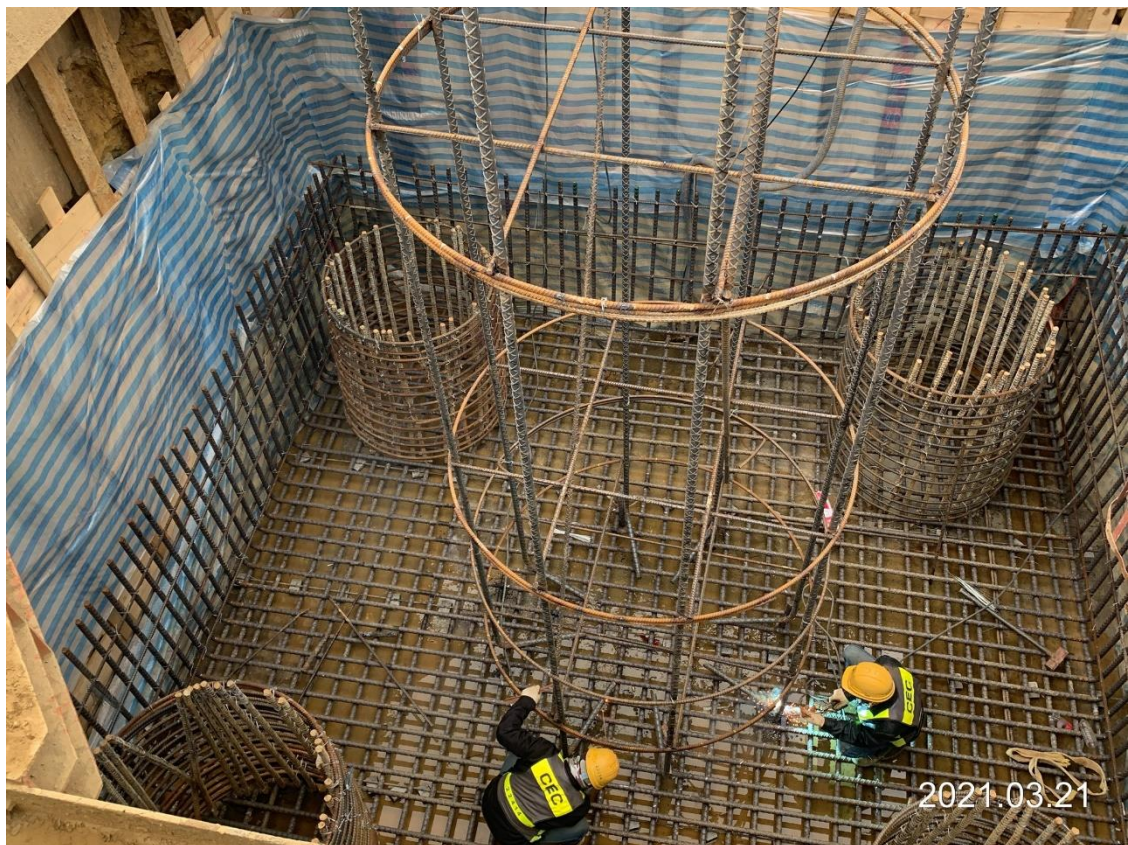


八德新闢道路 樁帽鋼筋綁紮

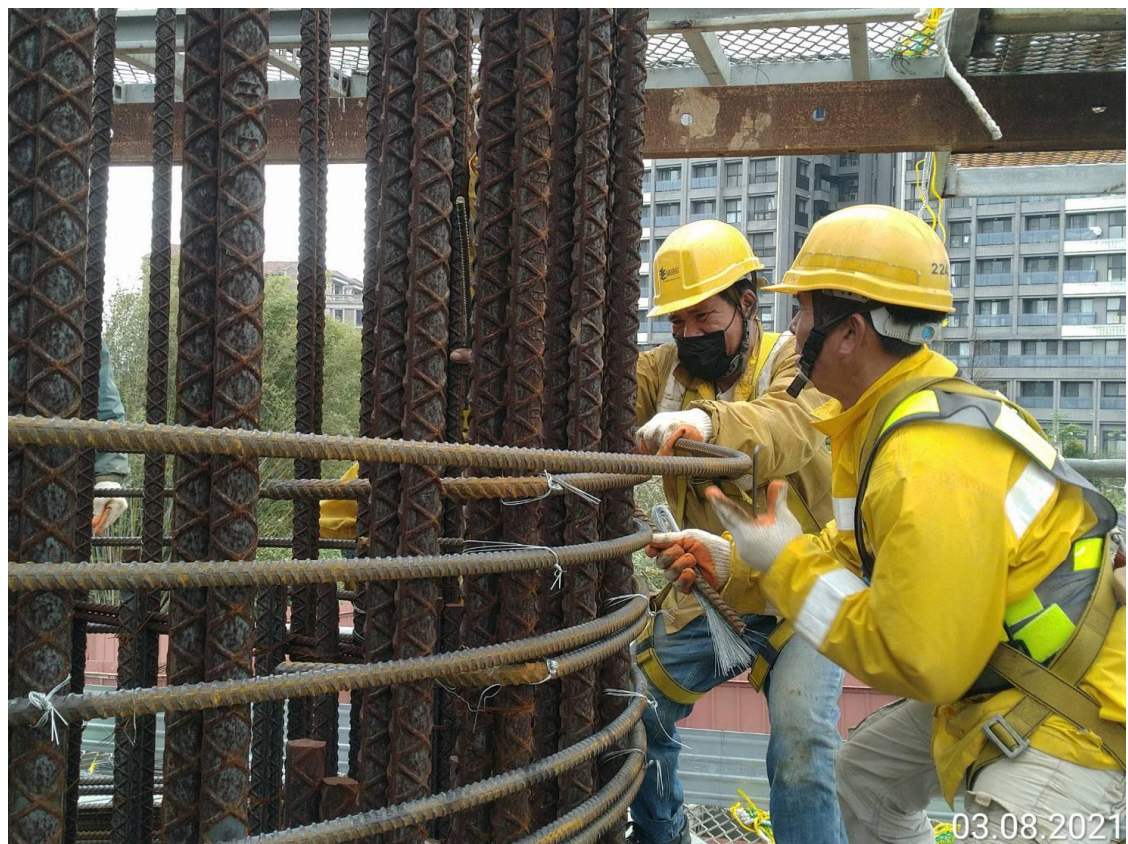


八德新闢道路 墩柱鋼筋綁紮



八德新闢道路 墩柱施作情形

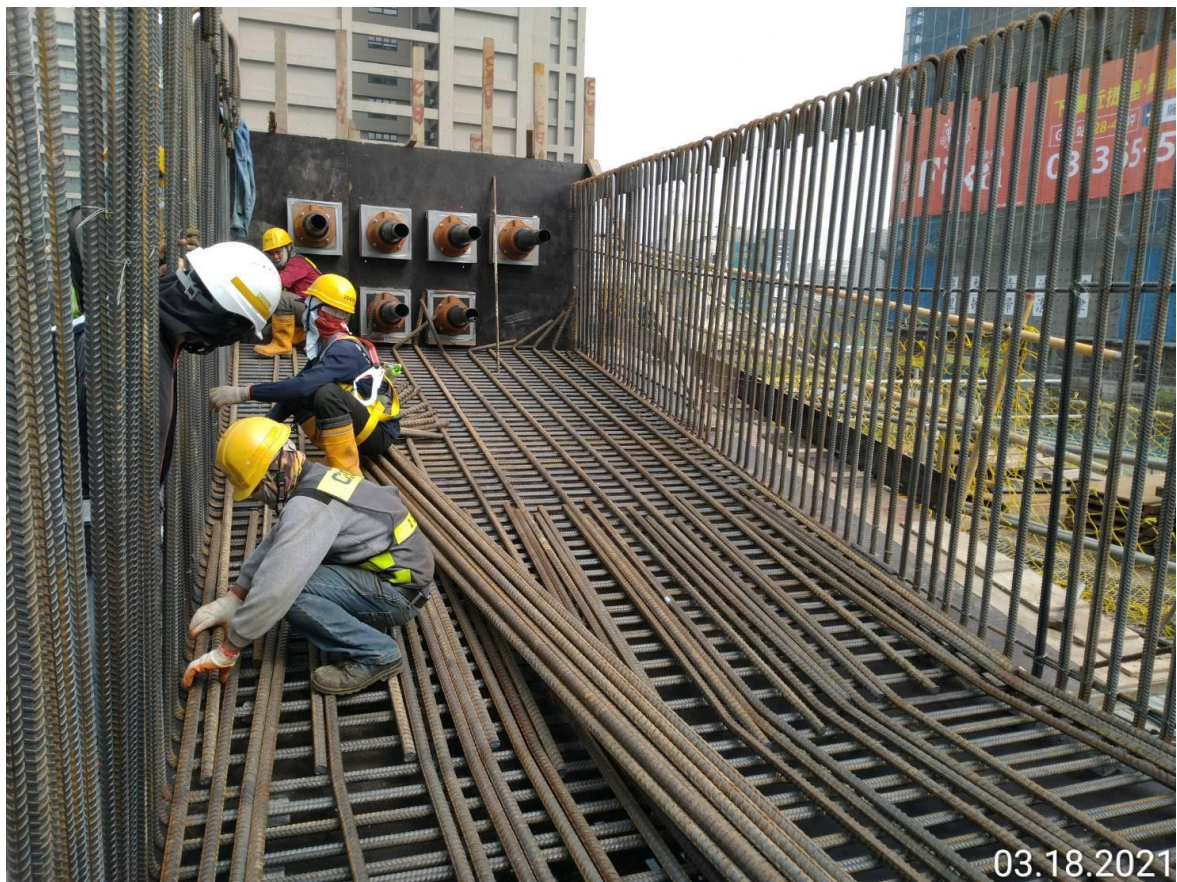

八德建德路 帽梁鋼筋綁紮

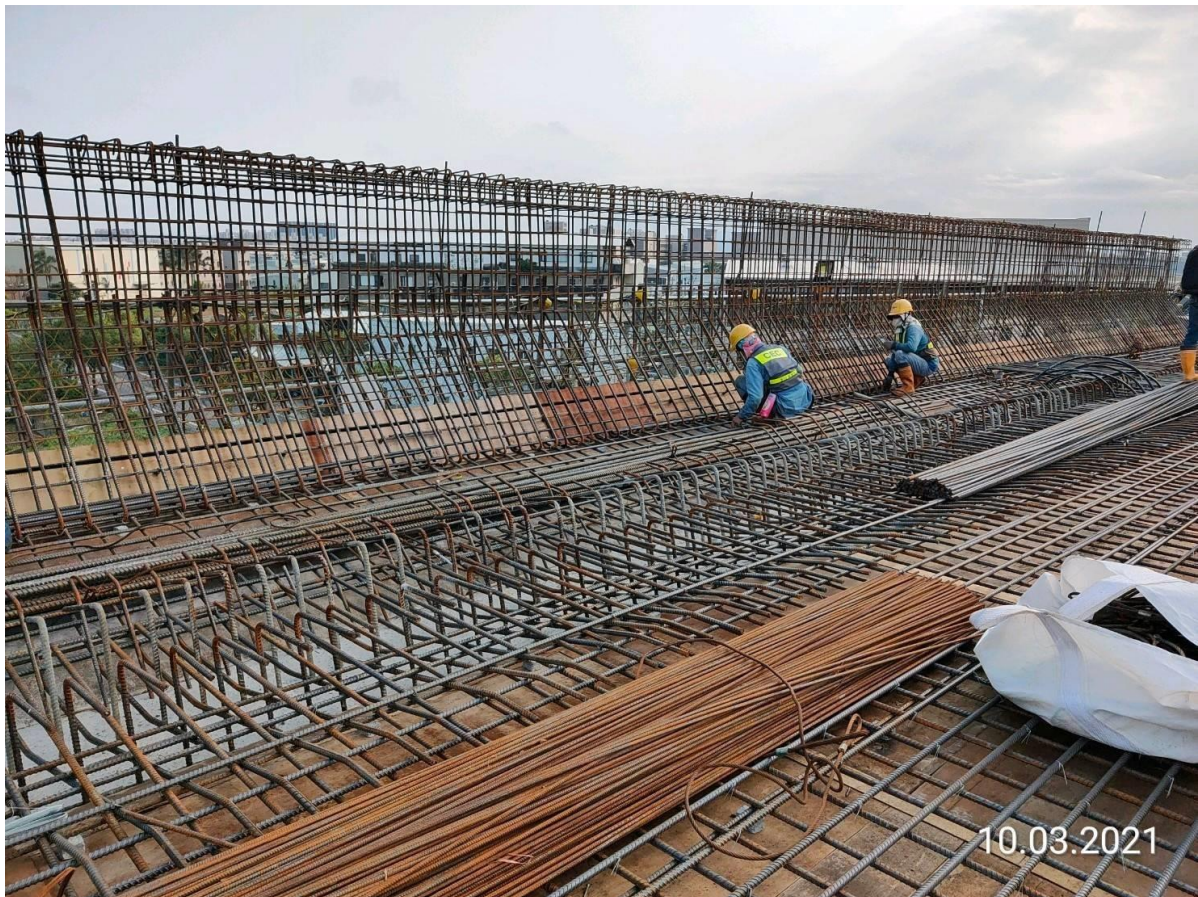

八德新闢道路 場鑄箱型梁橋面版鋼筋綁紮



八德新闢道路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



八德建德路 G02 車站出入口筏基混凝土澆置



蘆竹南崙路二段 基樁鑽掘



蘆竹中正北路 樁帽鋼軌樁查驗



蘆竹南崁路二段 墩柱模板組立



蘆竹南崁路二段 帽梁混凝土澆置



蘆竹中正北路 帽梁施作情形



大園坑菓路 G32 車站筏基鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 G13 車站鋼帽梁及軌道梁施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
