

112 年 6 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 60 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 4 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站出入口目前進行 RF 結構柱牆混凝土澆置、版梁重型支撐架搭設及 2 樓機房區排水系統配管；G02 車站出入口目前進行 RF 層女兒牆及外突造型結構作業。
- (10) G01 車站目前進行站體鋼梁吊裝；G02 車站站體及連通道吊裝完成。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 249 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，預計 7 月進行墩柱 P14a-01R&P14a-03 作業，累計已完成 212 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 PD-02、PD-03、PG32-8 及 P14a-03 作業，累計已完成 177 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 23 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-10、DU14-08(P14/15-19~P14-20)支撐架搭設；DU14a-01-4(PD-11~PD-10)模板及支撐架拆除、PD-10~PD-9 搭架與組模；DU13a-10(P13a-26~P13a-25)底腹牆鋼筋綁紮。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 198 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。


- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 20 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。
- (8) G13 車站出入口目前進行擋土牆鋼筋綁紮及模板組立、1 及 2 樓門窗工程；G13a 車站出入口目前進行 3 樓二昇層與 RF 梁版作業、門窗工程、1 樓至 3 樓水環系統管路施作；G14 車站出入口目前進行 2 樓柱牆第三昇層柱牆與梁版鋼筋加工綁紮、筏基層給水系統管路施作、梁版模板組立、SEM 配管作業；G31 車站出入口目前進行 1 樓柱牆模板組立；G32 車站出入口目前進行 5 樓梁板重型支撐架搭設、3 樓墊層作業。
- (9) G13 車站目前進行高架車站屋頂版系統安裝；G13a 車站目前進行高架車站屋頂版系統安裝、輕隔間及油漆工程。
- 三、GC01 標截至 112 年 6 月 30 日進度為 67.30%。




北段上構_DU31-09 中央步道鋼模組立



DU31-10 上行線頂版中央走道及胸牆預留鋼筋組立、頂版側模組立、洩水孔安裝

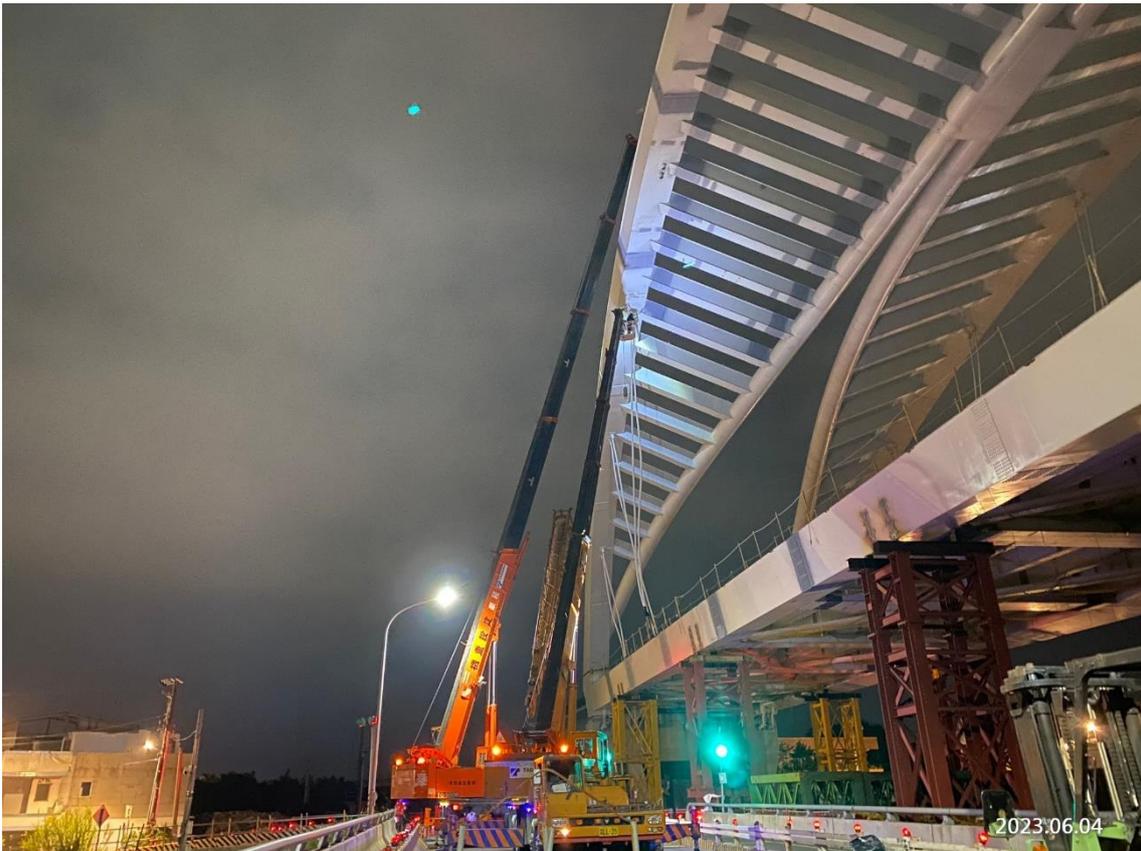

DU31-08 景觀橋鋼索吊裝

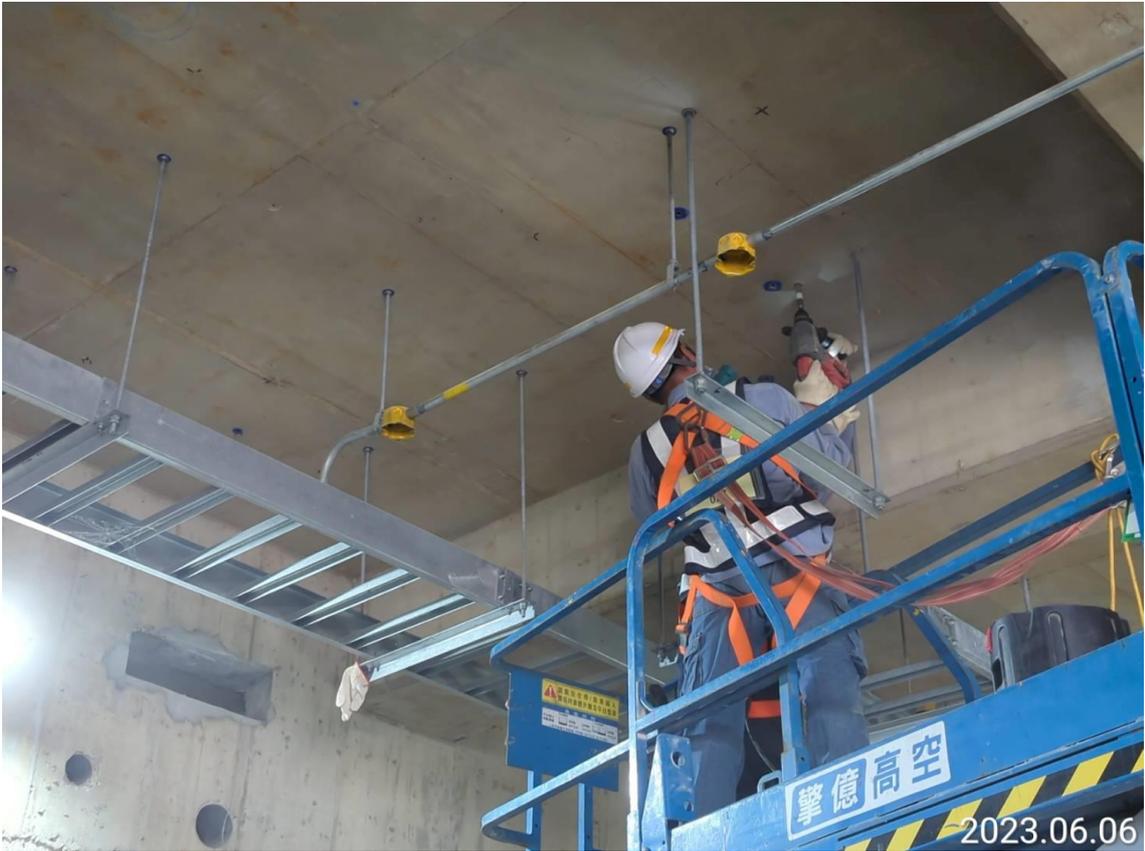

G13 站 3F 電氣管路施作




PD-04 帽梁混凝土澆置



G13 車站出入口擋土牆 0+050-108 混凝土澆置



G13 站 3F 電氣管路施作

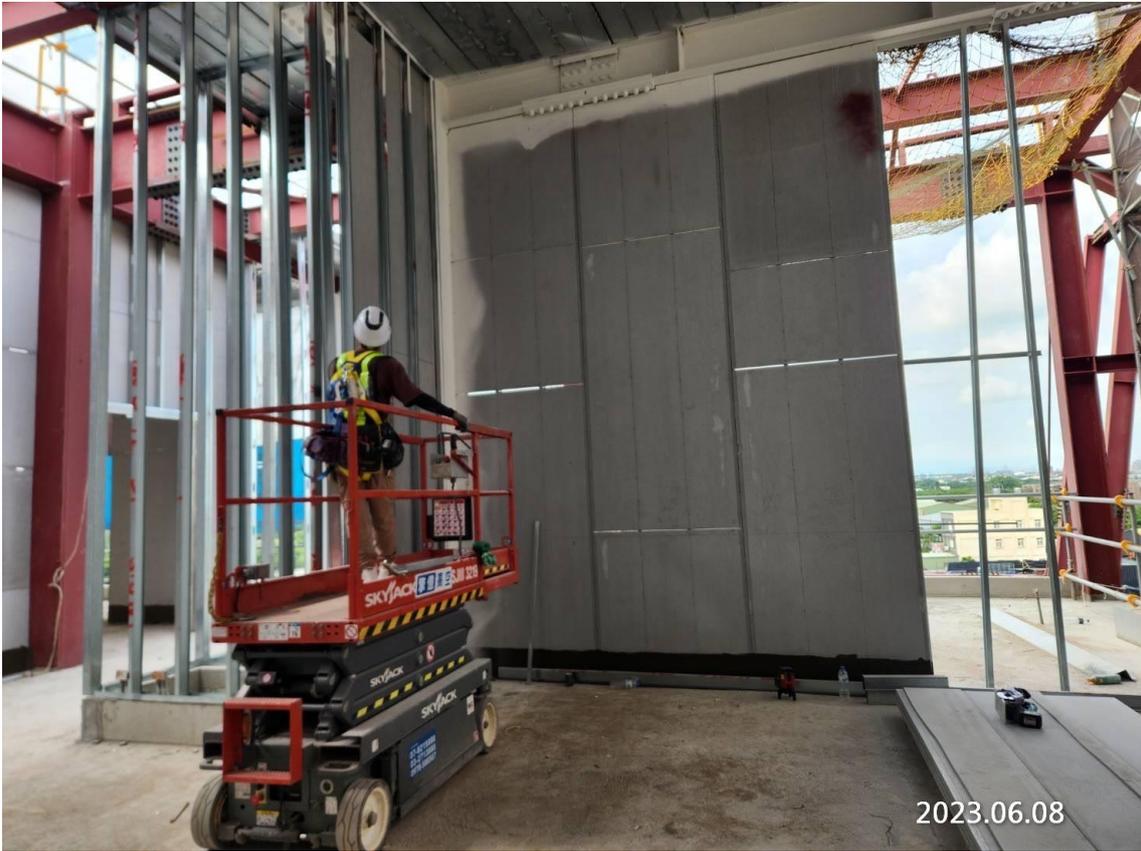

G13a 車站站體輕隔間施作



DU13a-10 場撐箱型梁端隔梁鋼筋綁紮



DU14a-01(PD-10~PD-9)第二階段支撐架組立



G02 車站出入口二樓牆面批土油漆施作



橋墩排水 P13a-P19B 集水井及串連段管涵埋設混凝土澆置



DU14-01(AB03~AB07)鋼箱梁吊裝

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
