


114 年 06 月 GC03 標工程進度

- 一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、 G07 站進行 B5F 月台層樓板結構施作、軌道層第二層支撐三角托架施作。
- 三、 G08 站進行土開區 B6F 車道、B5F 樓板及柱牆結構施作；站體區 B3F 柱牆結構施作、B4F 隧道下行線銜接段開挖。
- 四、 G09 站進行 B1F 樓板結構施作；B4F 隧道下行線銜接段結構施作。
- 五、 G10 站進行站體月台次結構及北井穿堂層版施作；出入口穿堂層柱牆結構施作。
- 六、 G11 站進行站體隔間牆次結構收尾工作；出入口 A、B、C 及通風井地面層以上結構施作；站體及出入口月台層、穿堂層裝修作業。
- 七、 G12 站進行緊急樓梯結構施作；站體及出入口穿堂層、地面層裝修作業；西側道路復舊回填作業。
- 八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站風管系統、電氣系統、水管系統，以及 G11~G12 隧道下行線水系統管線安裝。
- 九、 中圓隧道潛盾機檢修作業。
- 十、 北出土段進行排水復舊作業。
- 十一、 GC03 標截至 114 年 06 月 30 日，執行進度 67.47%。




G07_結構 B5F 軌道層支撐架施作

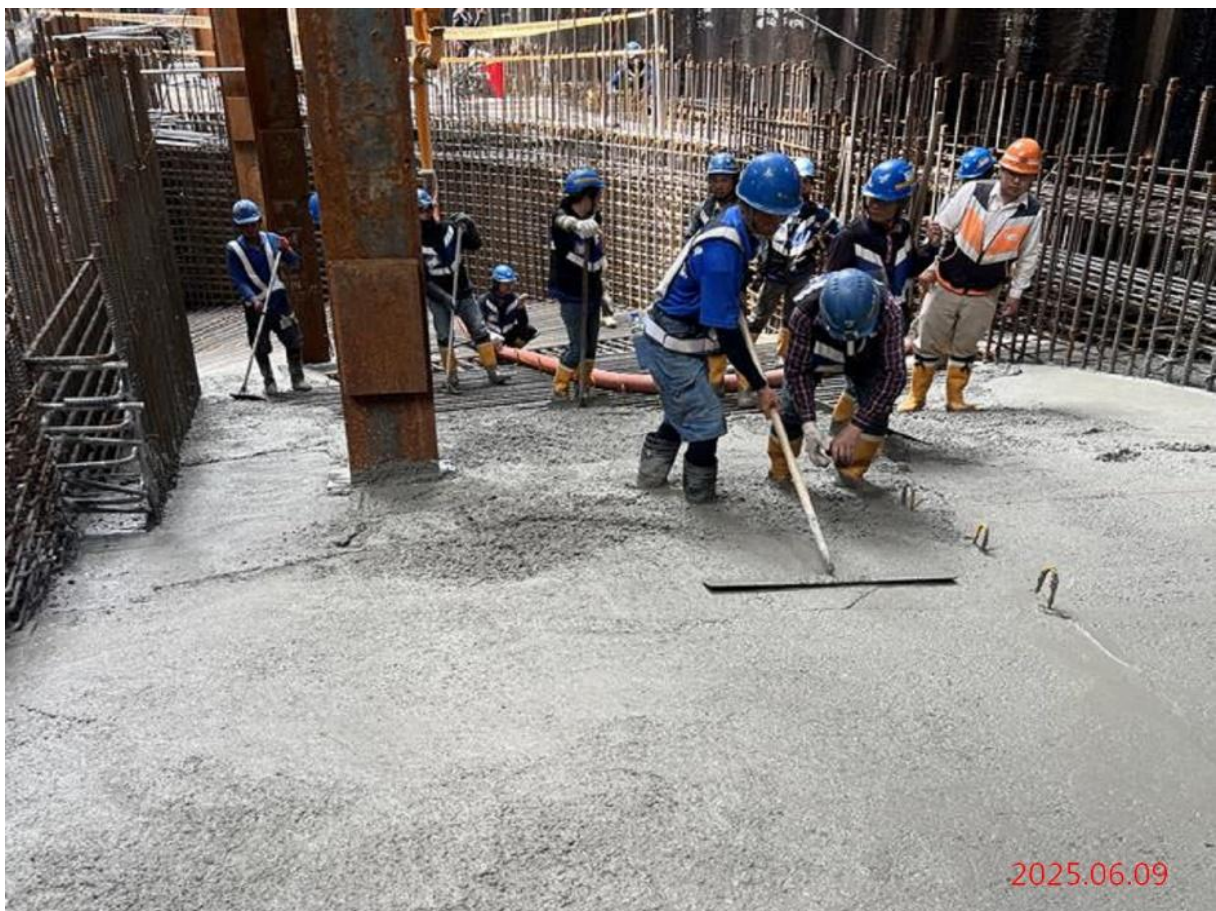


G08_土開區 B6F 車道版混凝土澆置




G08_站體區 B4F 連通道施作

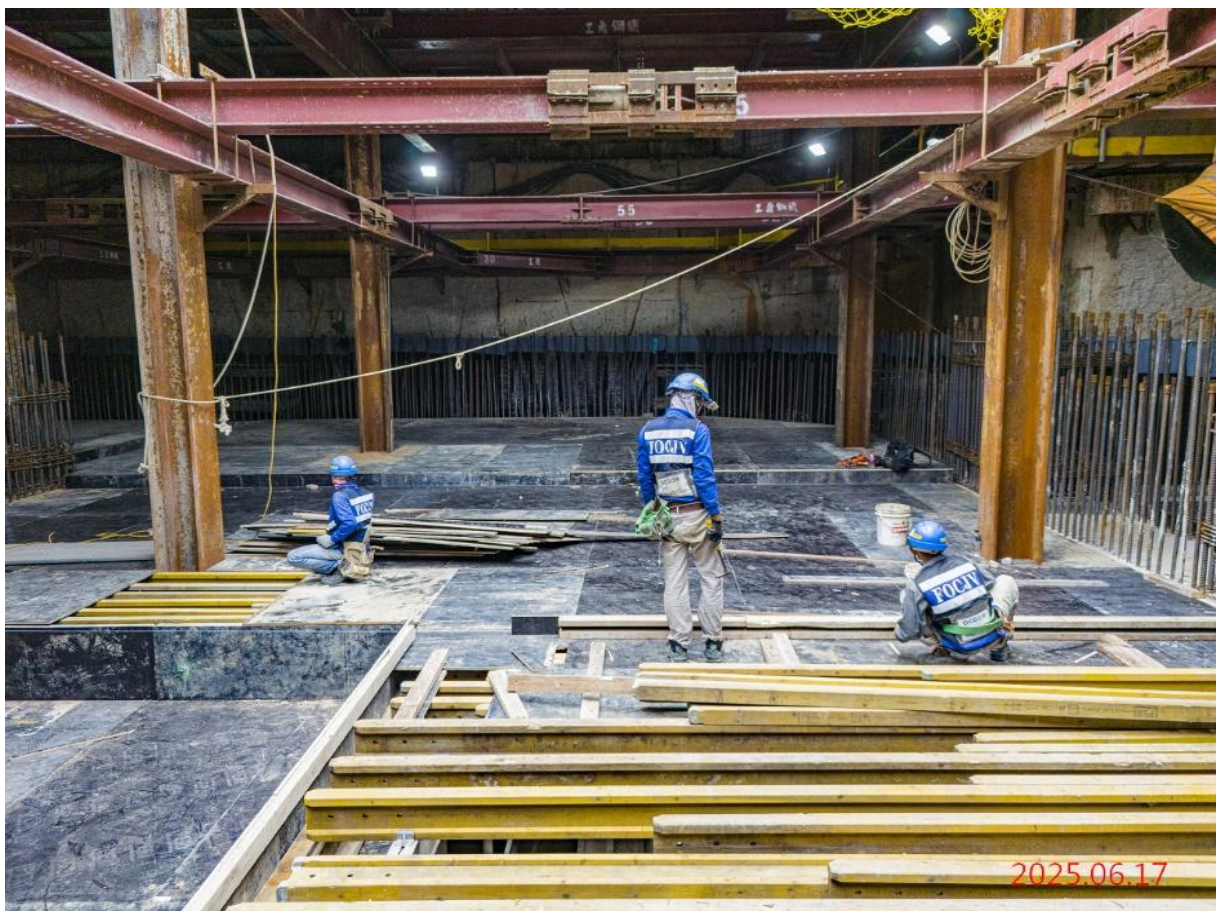

G09_B1F 樓板模板施作

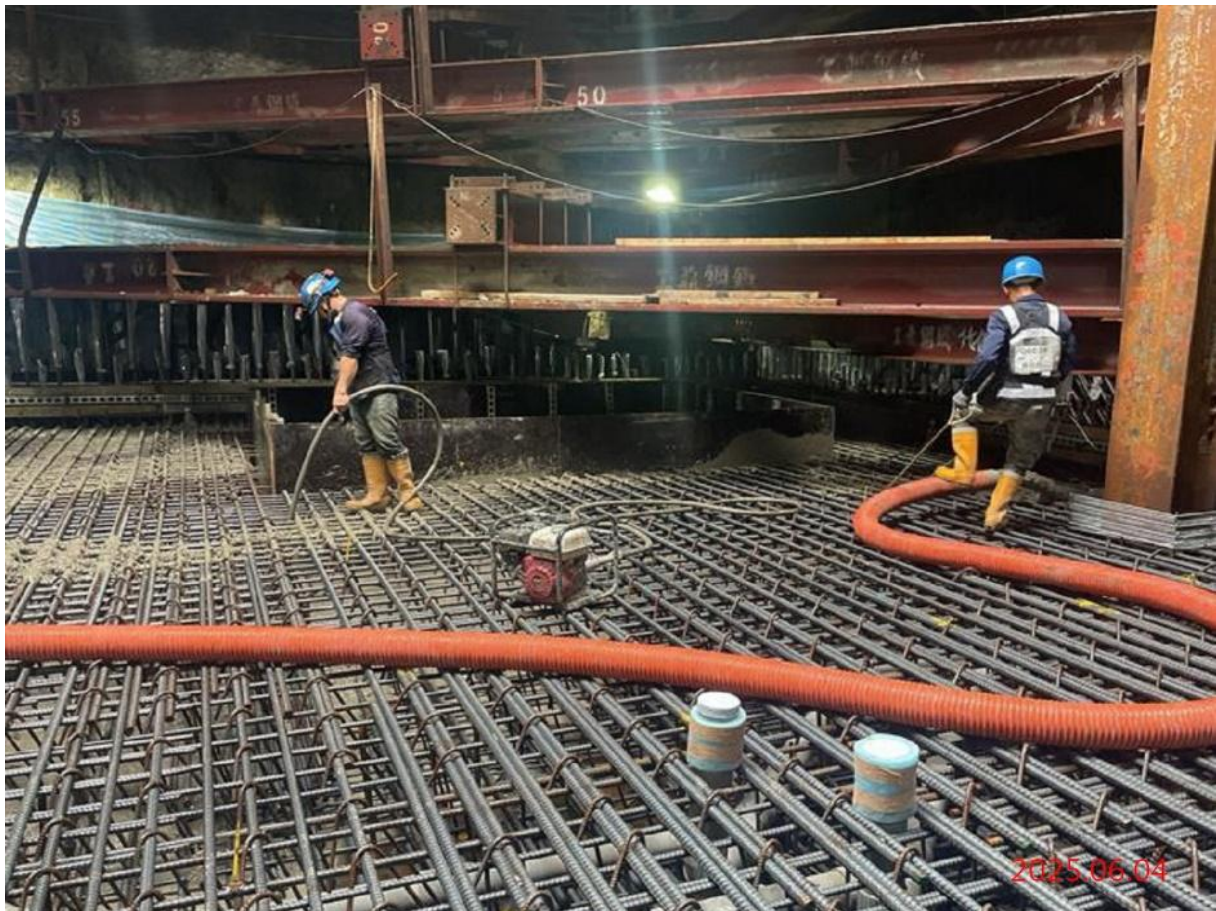


G10_站體穿堂層版混凝土澆置

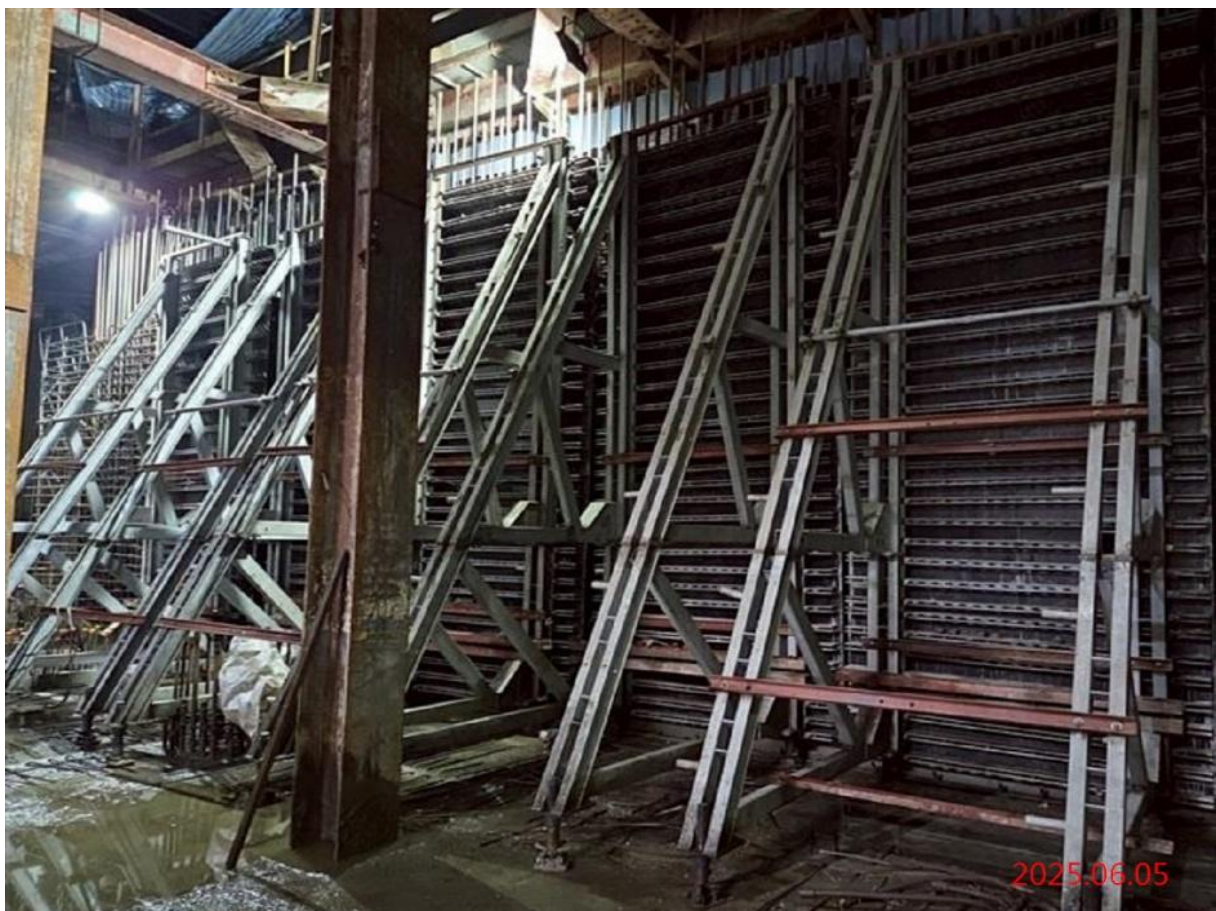

G10_出入口穿堂層側牆施作



G11_出入口電扶梯斜版施作

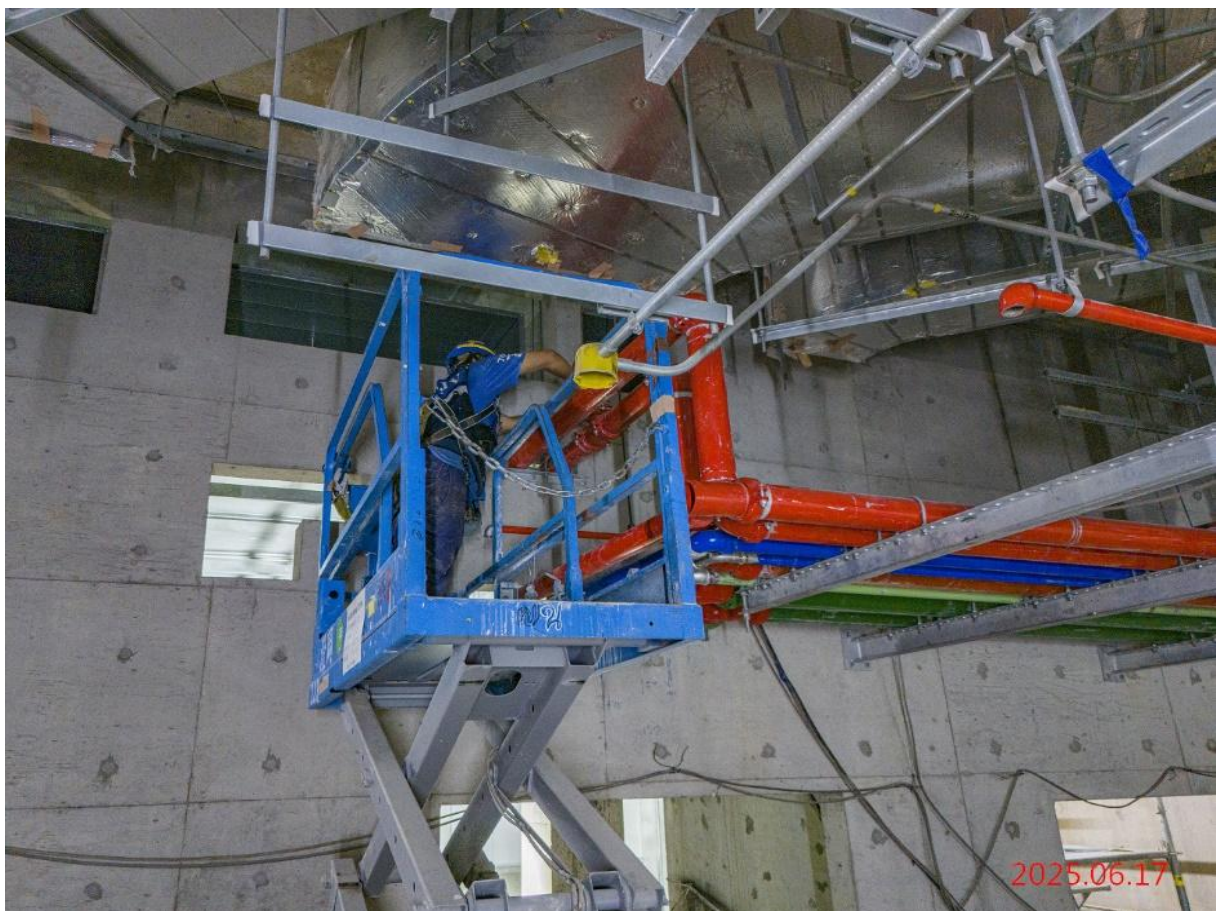

G11_B1F 出入口機房區 水系統-消防給水配管



G12_B2F 公共區 電氣系統施作



G12_站體地面層復舊回填作業



潛盾隧道_排水系統-配管施作
