

113 年 12 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 皮寮溪箱涵第一階段、雨水箱涵消能井支撐架拆除，第二階段前置作業。
- (9) 新關道路路燈(建德路~仁德路 95 巷)北側配管查驗及混凝土澆置。
- (10) 仁德路 95 巷至廣興路南側碎石級配工地密度試驗，北側路基層夯壓、碎石級配回填。
- (11) 出流管制 SCN-05 側溝(4k+720~731.8、4k+530~585)牆身模板組立及查驗、混凝土澆置
- (12) 假溝蓋板(北側 4k+970~5k+025)模板組立、鋼筋模板查驗、高程檢測、混凝土澆置
- (13) 假溝蓋路緣石(北側 5k+115~175)模板組立及查驗、混凝土澆
- (14) 建國路共管北側擋土支撐拆除、回填
- (15) 建國路共管 2 號工作井推管作業
- (16) DU00-01 鋼橋面版下行線鋼筋吊運綁紮
- (17) DU00-02 鋼橋面版排水格柵及軌道方鋼安裝
- (18) G01 站體出入口外牆平整修飾

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。

- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU14-08 DU14-08 單元端牆施做、DU14-10 DU14-10 外側牆面與底板修飾、DU14-14 DU14-06、DU14-14、DU14-09 單元橋面排水管安裝。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站出入口目前進行外牆磁磚鋪貼及外牆開口修飾及站體外牆帷幕施作；G13a 車站出入口目前進行車站出入口一樓水箱試水及機房搭架、一樓販賣部牆面粉刷及穿堂層外牆帷幕施作；G14 車站出入口目前進行外牆泥作吊線，站體目前進行月台層輕隔間施作、外牆鋁板放樣、金屬屋頂板屋面板安裝、雨排配管；G31車站入口及站體目前進行三樓牆面修飾、男女廁防水膜前置作業；G32 車站出入口目前進行五樓防水膜施作及站體金屬屋頂板岩棉施作。
- 三、GC01 標截至 113 年 12 月 31 日進度為 81.59%。




南段_出流管制 SCN-05 側溝(4k+720~731)澆置



南段_皮寮溪箱涵第一階段牆身第二昇層、頂版完成面高程檢測、模板、鋼筋查驗及混凝土澆置



北段_G13 車站站體外牆鋁帷幕骨架及鋁板安裝

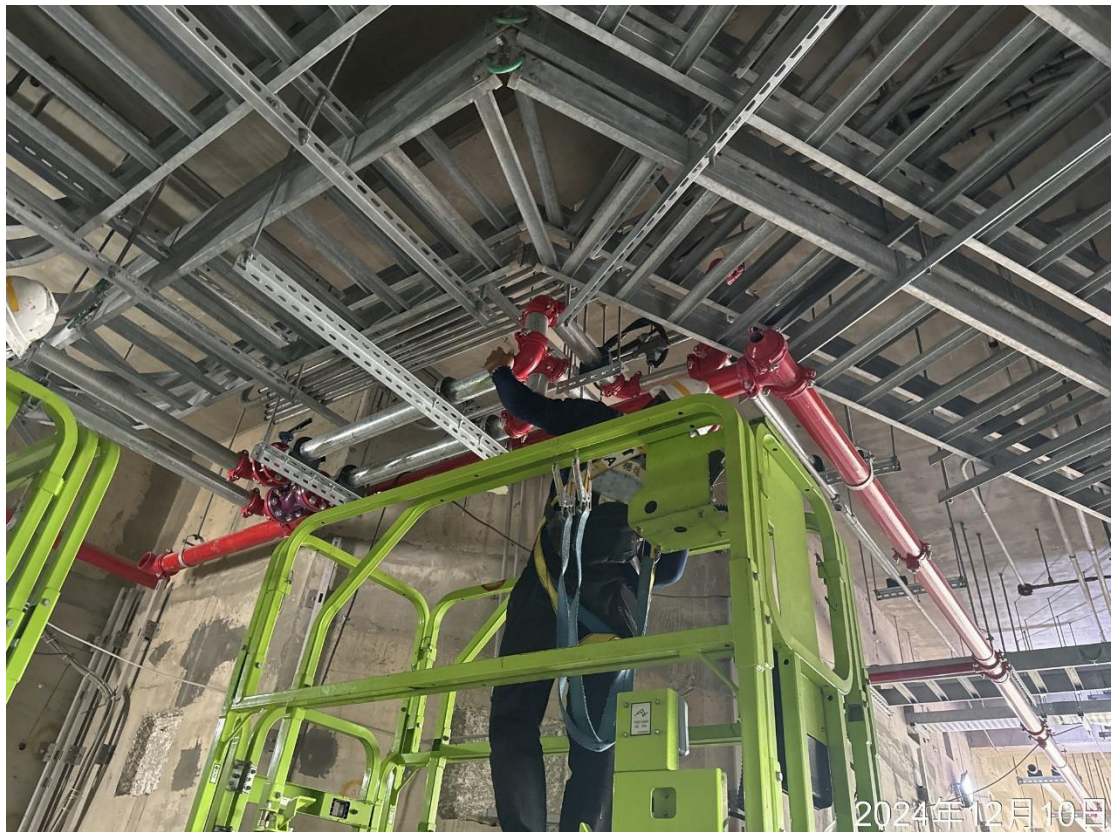

G13a 站 3F 空調系統配管



G14 車站站體金屬內牆板骨架放樣



G31 車站出入口 B1F 復壁輕隔間封板批土



G32 站體 2 小時防火漆膜厚查驗



北段_道路復舊 M29 路緣石背填澆置
