

109 年 10 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路持續進行基樁施作，累計已完成 332 支基樁。
- (2) 建德路及新關道路持續進行樁帽施作，累計已完成 36 處樁帽。
- (3) 建德路墩柱已大部分施作完成，目前新關道路已完成墩柱 P01-15、P01-28 第二昇層混凝土澆置，將接續進行第三及第四昇層鋼筋綁紮及混凝土澆置，累計已完成 22 支墩柱。
- (4) 建德路帽梁累計已完成 13 座，將接續進行新關道路部分。
- (5) 建德路已完成 P01-02~03 場鑄箱型梁底版混凝土澆置、P01-06~08 場鑄箱型梁底腹牆混凝土澆置，將接續進行 P01-02~03 場鑄箱型梁預力套管埋設、P01-06~08 場鑄箱型梁模板拆除，累計已完成 2 跨。
- (6) G01 車站出入口已完成出入口筏基底版混凝土澆置，將接續進行地梁鋼筋綁紮；G02 車站出入口目前進行筏基底版鋼筋綁紮。


二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 642 支基樁。
- (2) 中正北路及南崁路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 68 處樁帽。
- (3) 中正北路及南崁路二段分別完成墩柱 P13a-04、P13a-05 第二昇層鋼筋綁紮及 P13a-37、P13a-39 第一昇層混凝土澆置、P13a-43 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P13a-04、P13a-05 第二昇層混凝土澆置及 P13a-37、P13a-39 第二昇層鋼筋綁紮、P13a-43 第三昇層鋼筋綁紮，累計已完成 49 支墩柱。
- (4) 中正北路目前進行帽梁 P12-16 模板組立、P13-29 鋼筋綁紮及 P13-34 施工架搭設，將接續進行 P12-16 鋼筋綁紮、P13-29 混凝土澆置及 P13-34 模板組立，累計已完成 18 座帽梁。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)中央分隔島已敲除，並完成第一階段交維改道，道路兩側交由管線單位進行管線遷移。
- (6) G13 車站出入口已完成整地及 PC 澆置，將接續進行防水膜施作；G13a 車站出入口目前進行灌排施作等前置作業；G14 車站出入口目前進行一次接地施作，將接續進行整地及 PC 澆置；G32 車站出入口已完成整地及 PC 澆置，將接續進行防水膜施作。

三、GC01 標截至 109 年 10 月 31 日，預定進度 13.49%，實際進度 13.78%。



八德新關道路 基樁鋼筋籠搭接

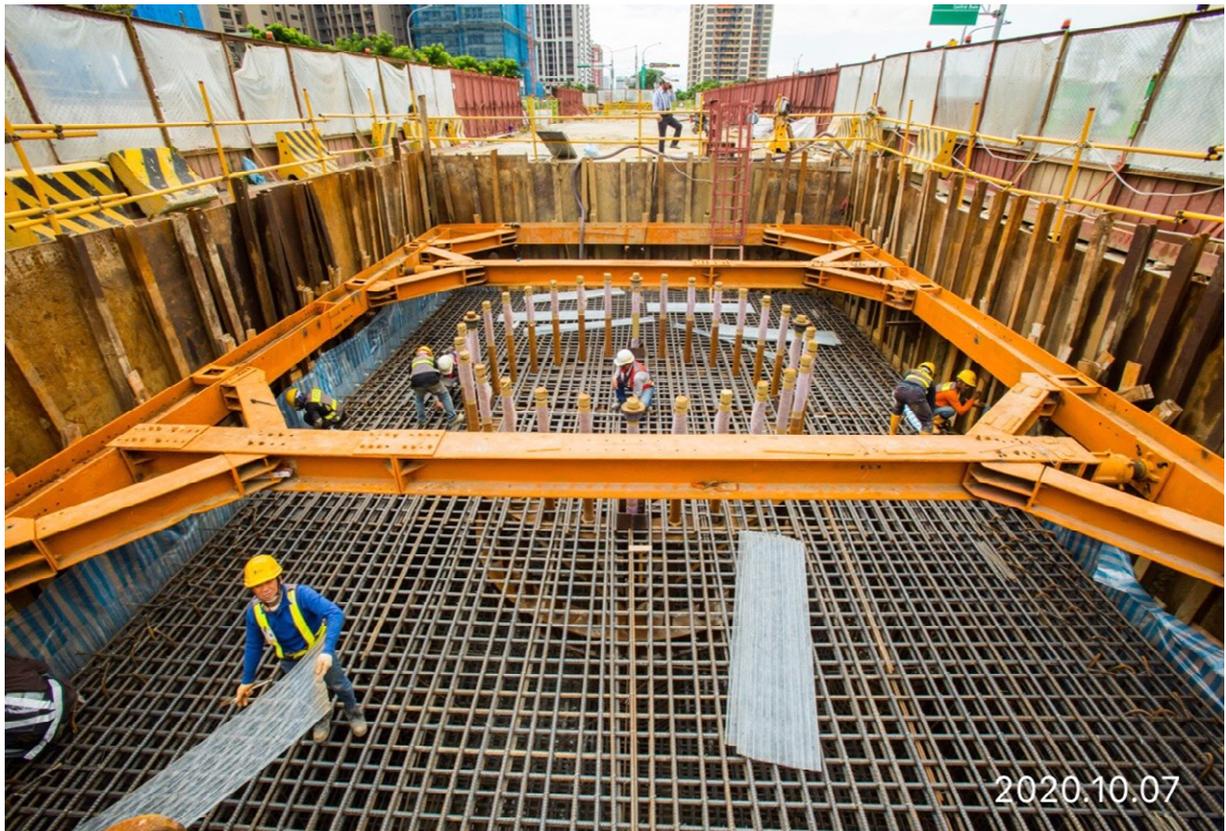

八德建德路 樁帽鋼筋綁紮



八德新關道路 墩柱混凝土澆置



八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形




八德建德路 G01 站出入口基礎鋼筋綁紮



八德建德路 場鑄箱型梁支撐架組立情形



蘆竹中正北路 基樁鑽掘

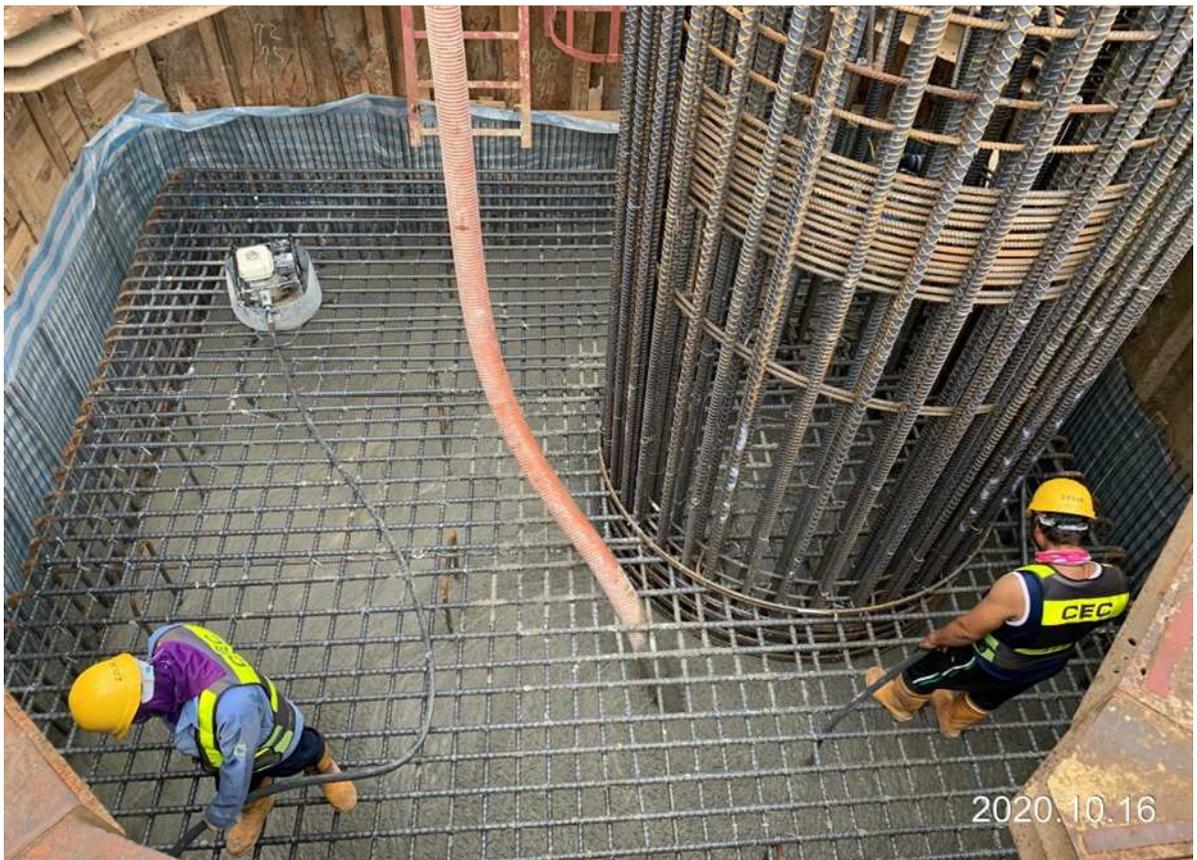

蘆竹中正北路 樁帽混凝土澆置




蘆竹中正北路 墩柱高空作業車除鏽



蘆竹中正北路 帽梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 下部結構施作情形

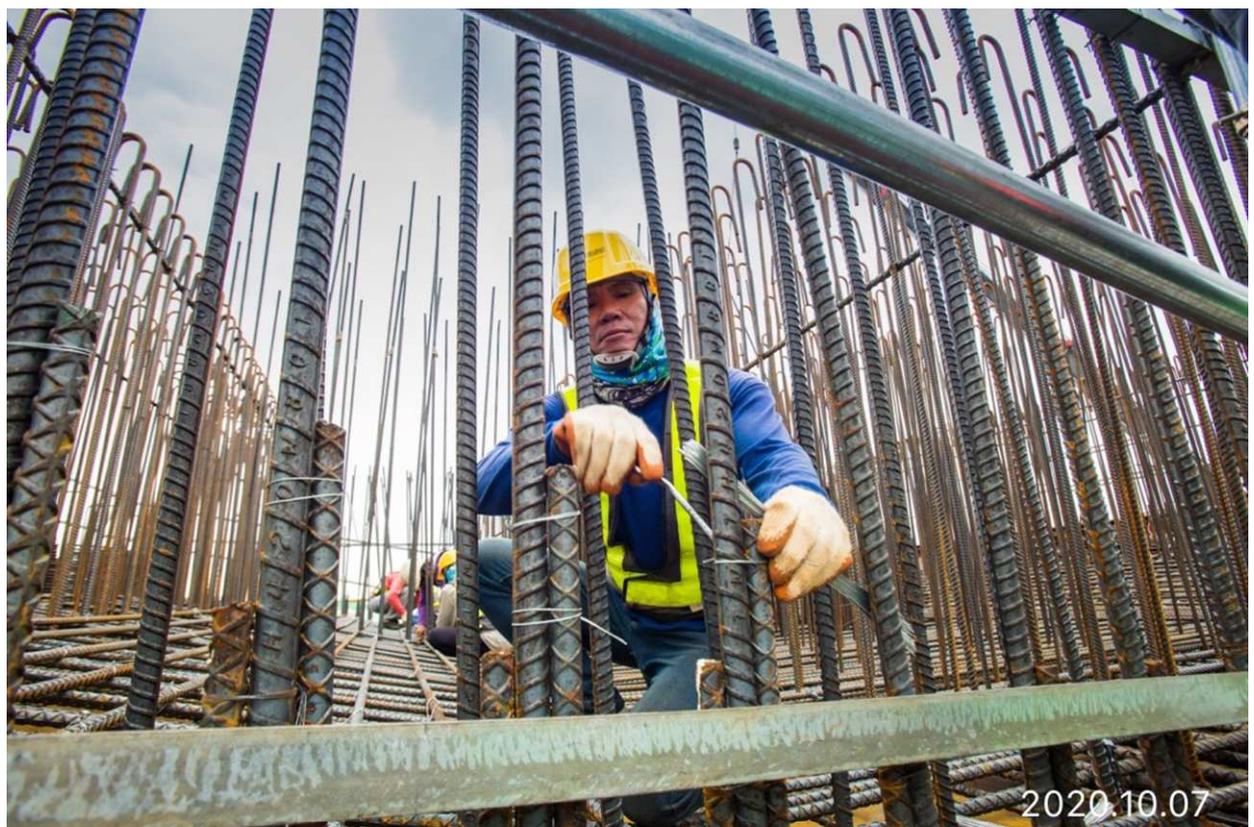

蘆竹中正北路 下部結構施作情形

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 10 月 31 日		109 年 12 月	
			完成數量	完成百分比	預計完成數量	預計完成百分比
基樁	支	1,710	974	56.96%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	104	32.6%	129	40.44%
墩柱	墩	319	71	22.26%	92	28.84%
帽梁	座	291	31	10.65%	64	21.99%
橋面版	跨	308	2	0.65%	11	3.57%

工程進度更新至 109 年 10 月份實際進度。
