

113 年 2 月 GC01 標施工進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站及 G02 車站站體與連通道吊裝完成。
- (10) G01 車站及 G02 車站出入口目前進行防水工程、2 樓及 3 樓門框與百葉裝修工程、給排水系統配管。

二、蘆竹、大園(北段)工區：


- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 214 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 191 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 36 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-04 支撐架搭設及側模組立；DU14-08 第四跨腹版組立及頂版混凝土澆置；DU14-07 模板及支撐架拆除；DU13a-09 腹牆混凝土澆置。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 196 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 46 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。

(8) G13 車站及 G13a 車站出入口及站體目前進行金屬牆板及玻璃帷幕工程；G14 車站出入口目前進行 3 樓墊層及門窗工程；G31 車站出入口目前進行 4 樓柱牆(1st)及 SEM 配管；G32 車站出入口目前進行 4 樓油漆及 5 樓門窗立框作業。

三、GC01 標截至 113 年 2 月 29 日進度為 75.73%。



北段上構_PD-2~PD-3 第三階段支撐架組立

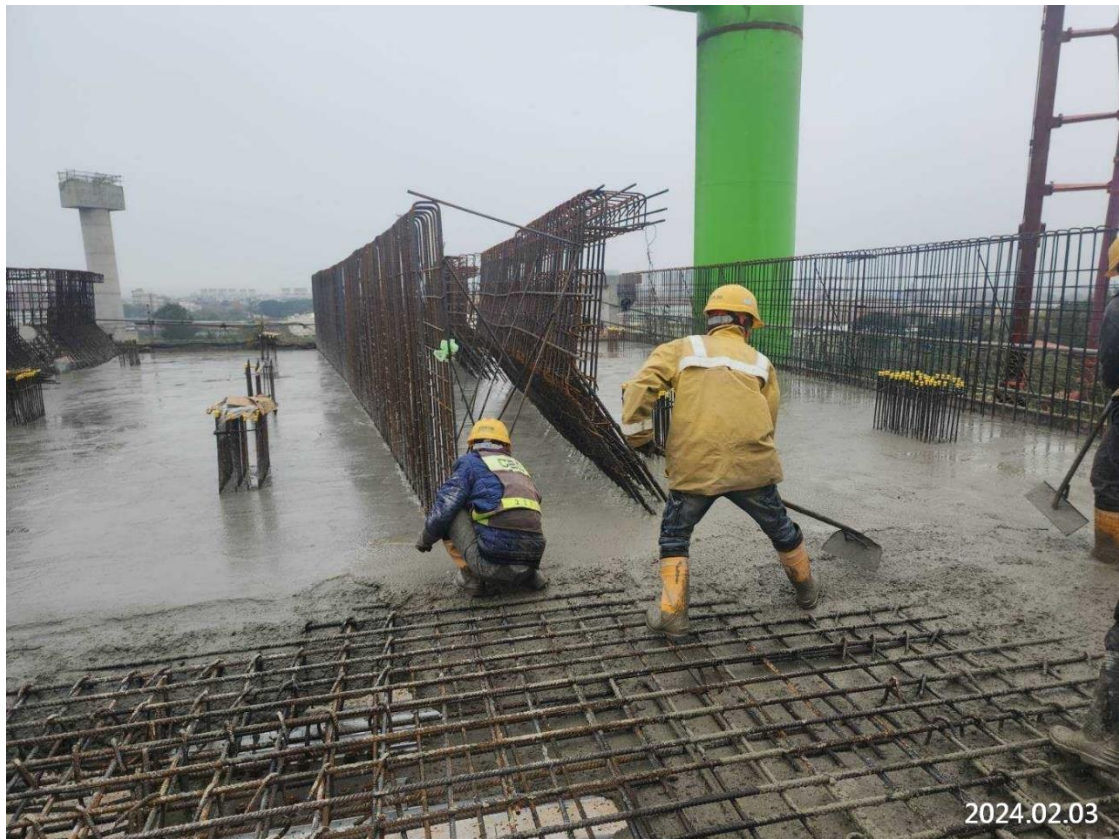

北段上構_DU14-06 下行線橋面版混凝土澆置




南段_G01 車站出入口四樓墊層前置作業




DU14-06 鋼箱梁進料地組 C01+C02 接合穿鎖



DU13a-09 橋梁胸牆鋼筋綁紮

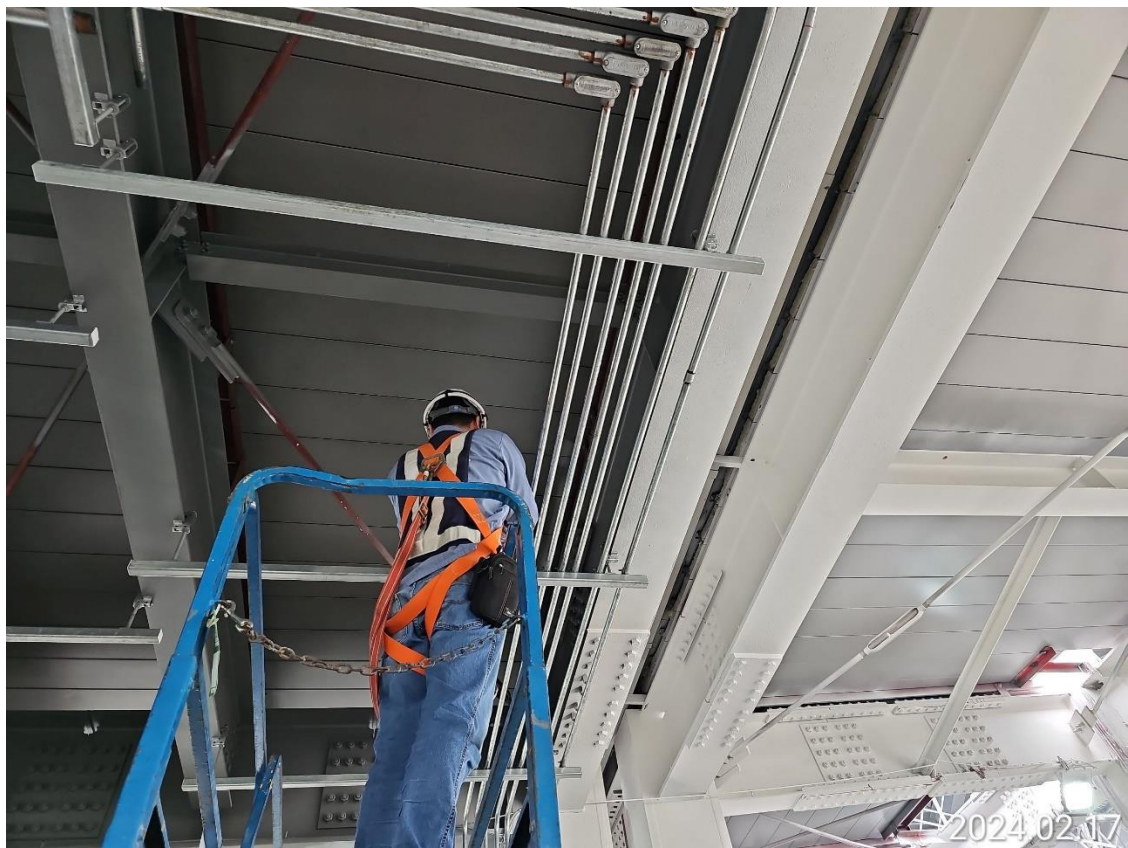

G13 站電氣管路施作

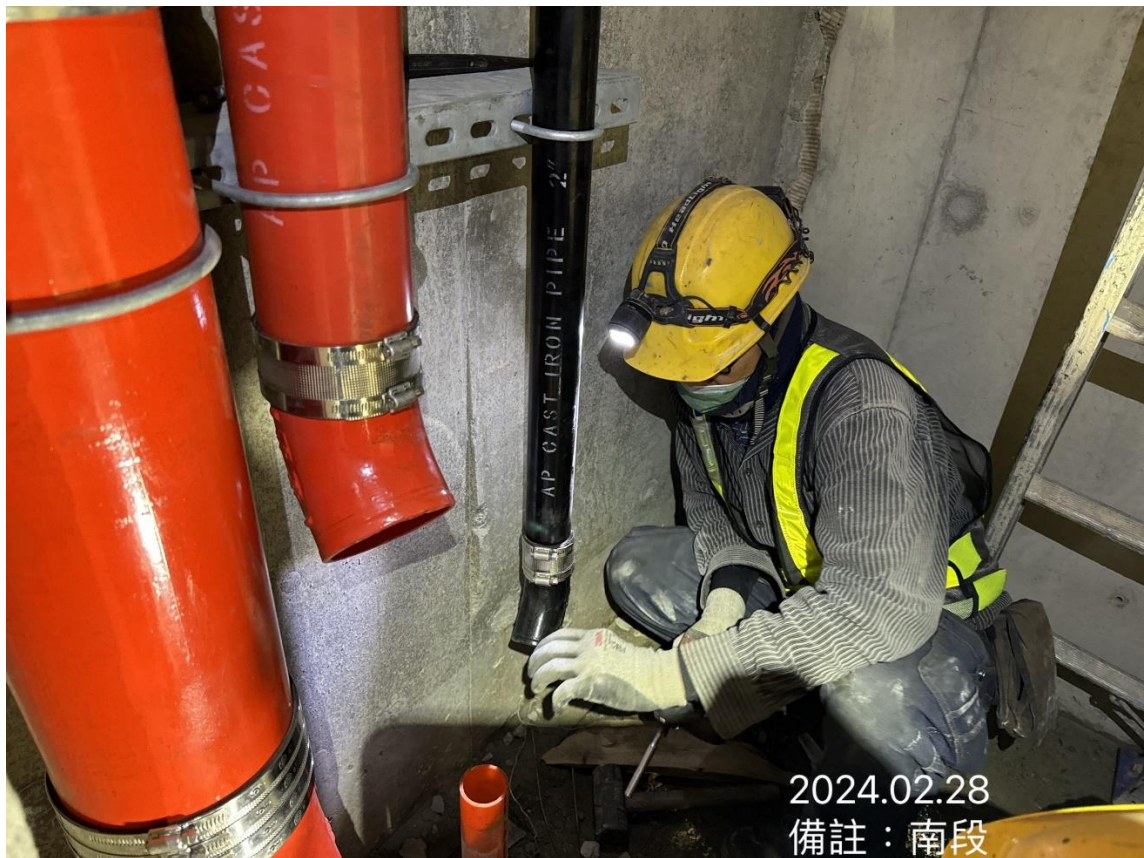

G02 站 2 樓排水管施作



北段上構_DU14-07 上行線支撐架組立



G13 車站高架佈覽施作
