

114 年 4 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：


- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 分隔島路緣石方框安裝。
- (9) 建德路至建國路道路及人行道沿線整理。
- (10) 建德路至建國路各路口標線繪製。
- (11) 更寮腳箱涵南側頂版鋼筋綁紮。
- (12) 更寮腳箱涵北側既有舊牆身破除。
- (13) 植栽(建德路~建國路)北側新增樹穴樟樹種植。
- (14) 植栽(建德路~建國路)平戶杜鵑、山蘇、蜘蛛百合、虎尾蘭及矮仙丹種植。
- (15) 建國路共管推管段穿線。雨水箱涵及更寮腳支線北側漸變銜接段、下游南側溢流集水井頂版模板、鋼筋綁紮。

二、蘆竹、大園(北段)工區：


- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路·南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU14-03、DU14-09 單元橋面排水管安裝作業等。

- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行站體月台層玻璃帷幕膠條安裝、出入口東向牆鋁板滿焊、3F 電力系統配管、給水系統施作等；G14(原 G13a)車站出入口外牆打底及放樣、站體月台層北向鋼構安裝、穿堂層東西向玻璃帷幕安裝等；G15(原 G14)車站出入口連通道外牆帷幕骨架組立、連通道下方兩排管配管、三樓內牆粉刷及安全梯牆面修整、3F 火警系統拉線、3F 電力系統拉線、3F 照明系統配管、2F 月台層消防系統撒水管配管等；G15a(原 G31)車站出入口目前進行出入口三樓粉刷打底、站體連通道輕隔間封板、4F 配電室 B 電氣系統拉線、3F 電氣系統施工作業等；G15b(原 G32)車站出入口目前進行外牆泥作打底、逃生梯牆面油漆前置作業、5F 電力系統結線、4F 電力系統線槽施工等。

三、GC01 標截至 113 年 4 月 30 日進度為 84.56%。

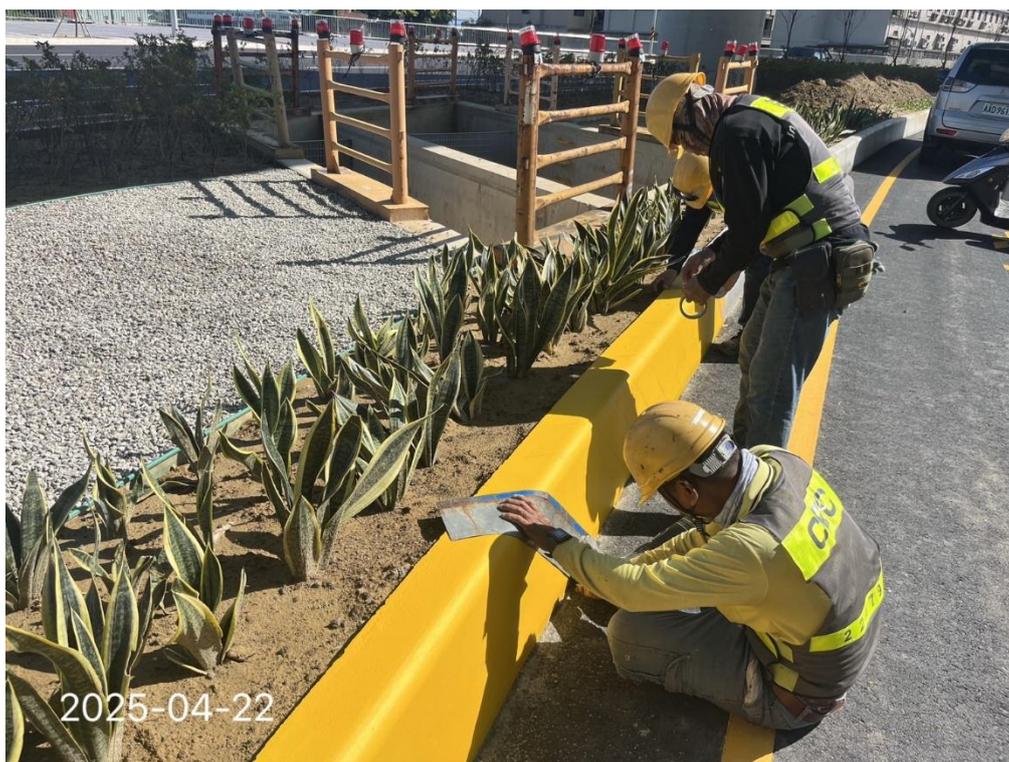

建德路至建國路中央分隔島路緣石油漆

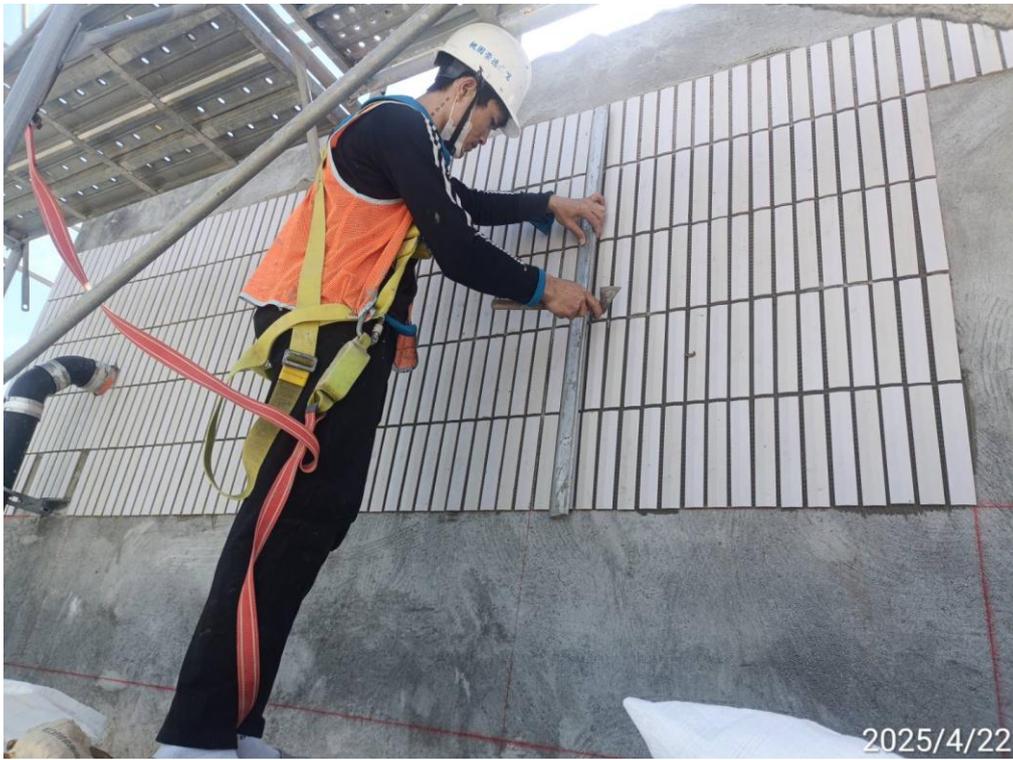

G13 車站出入口外牆磁磚鋪貼



G13 站高架電纜線施工



G15b(原 G32)車站站體連通道及穿越層墊層前置作業



G14(原 G13a)車站站體站務室 PAO 施作
