

## 109 年 8 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 293 支基樁。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作，累計已完成 31 處樁帽。
- (3) 建德路墩柱已大部分施作完成，目前新闢道路已完成墩柱 P01-33、38 及 42 第一昇層混凝土澆置，將接續進行第二昇層鋼筋綁紮，累計已完成 18 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-13 混凝土澆置，將接續進行 P01-14 帽梁鋼筋綁紮，累計已完成 12 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-1 場鑄箱型梁橋面版混凝土澆置，將接續進行 P01-01~P01-02 場鑄箱型梁底層模板組立。
- (6) 新闢道路已完成施工便道 970 公尺，臨建國路以南剩餘 80 公尺將持續進行施工便道施作及圍籬架設。
- (7) G01 車站出入口目前進行出入口基礎鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置；G02 車站出入口目前進行接地作業。

### 二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 568 支基樁。
- (2) 中正北路及南崁路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 54 處樁帽。
- (3) 中正北路及南崁路二段分別完成墩柱 P13-01~02 第一昇層混凝土澆置及 P13a-46~51/53~55 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P12-15~16 第一昇鋼模檢測及鋼筋保護層查驗、P13a-46~51/53~55 第三昇層施作，累計已完成 40 支墩柱。
- (4) 中正北路目前進行 P12-12 鋼筋保護層查驗及第一昇層混凝土澆置、P13-01~02 支撐架搭設，累計已完成 13 座帽梁。
- (5) 坑菓路 F 工區(坑菓路，G31~G32 站)中央分隔島已敲除，並完成第一階段交維改道，道路兩側交由管線單位進行管線遷移。

三、GC01 標截至 109 年 8 月 31 日，預定進度 10.28%，實際進度 10.99%。



2020.08.02

八德新闢道路 基樁鋼筋加工




08.14.2020


八德新闢道路 樁帽混凝土澆置



八德建德路 墩柱鋼筋綁紮

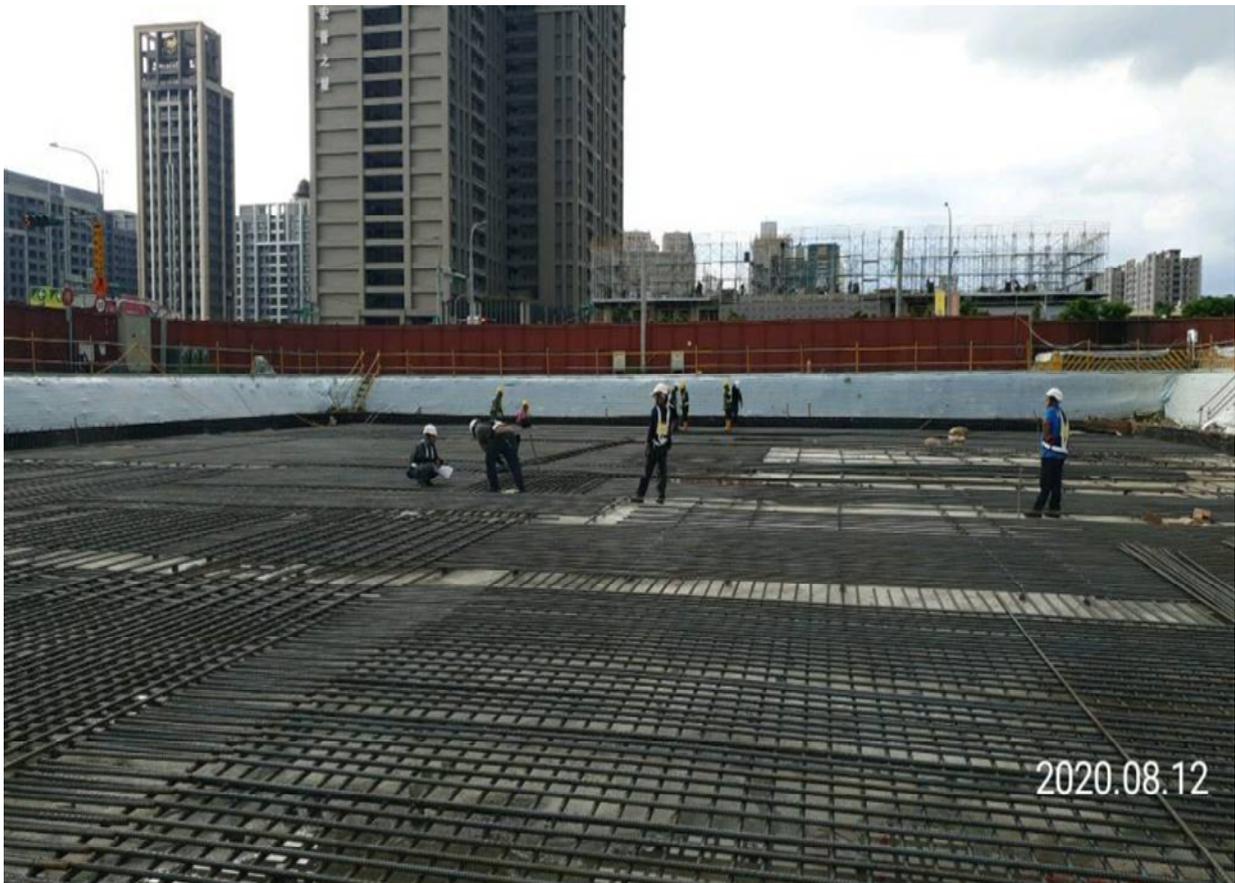

八德建德路 G01 站出入口鋼筋綁紮

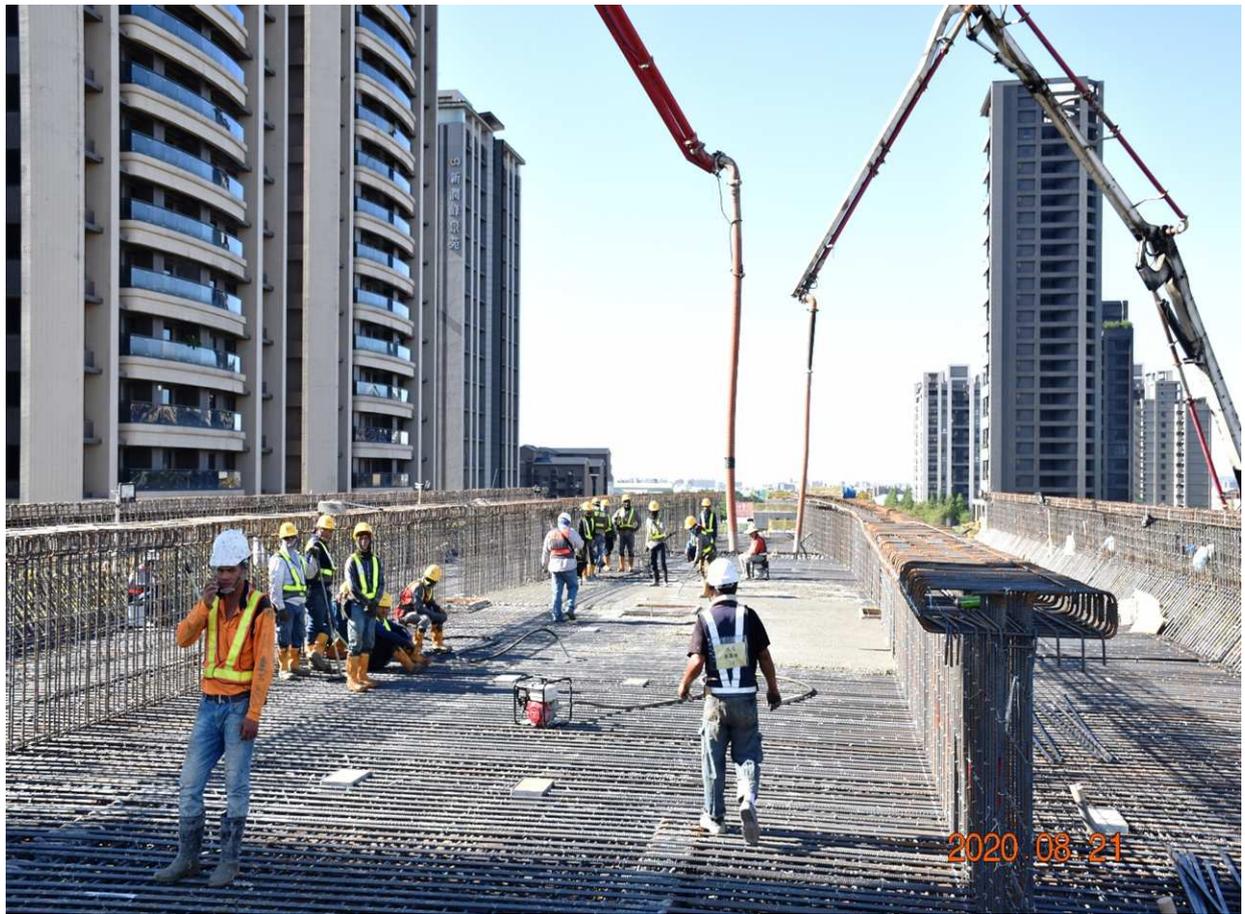

八德建德路 場鑄箱型梁橋面版混凝土澆置




八德建德路 場鑄箱型梁橋面版施作情形



蘆竹中正北路 基樁混凝土澆置



蘆竹中正北路 樁帽混凝土澆置

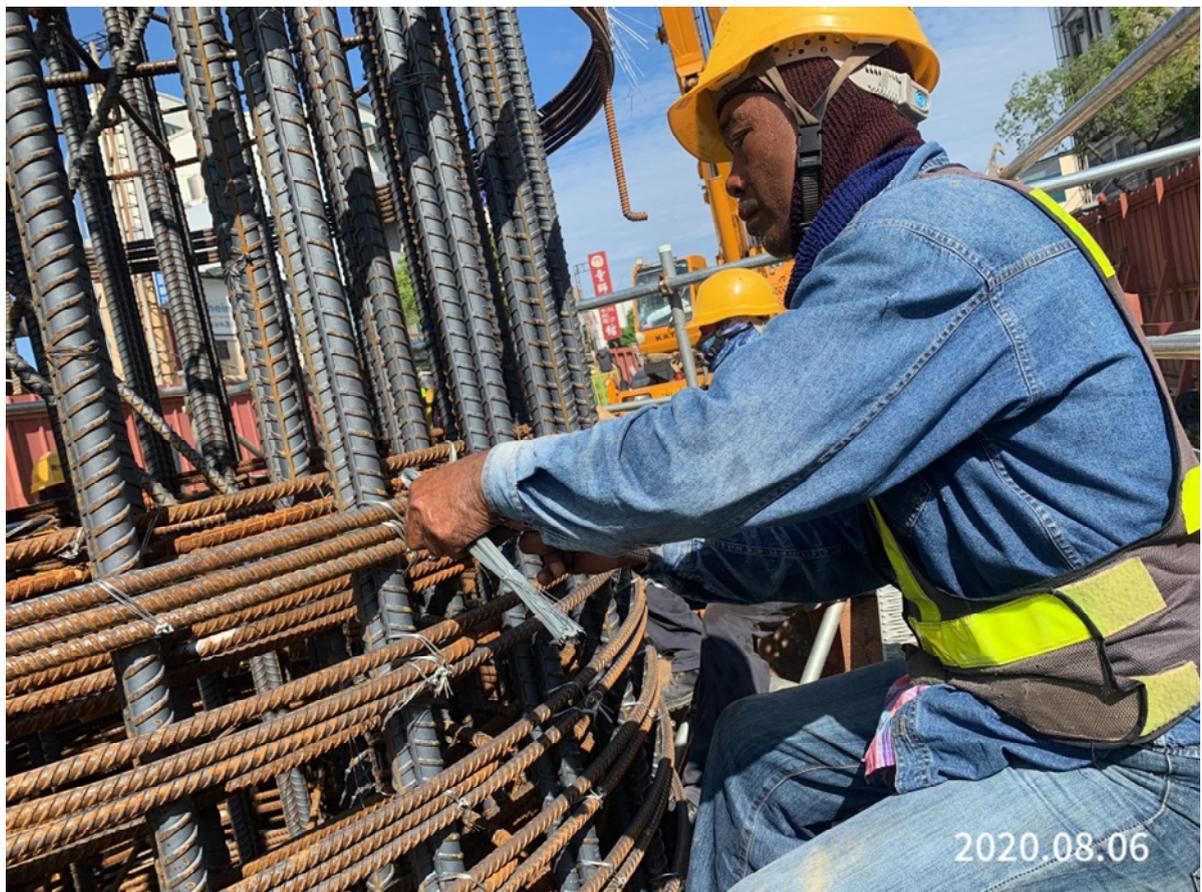

蘆竹南崁路二段 墩柱鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 帽梁混凝土澆置



鄭文燦市長視察八德工區



鄭文燦市長視察八德工區

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 8 月 31 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	861	50.35%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	85	26.65%	129	40.44%
墩柱	墩	319	58	18.18%	92	28.84%
帽梁	座	291	25	8.59%	64	21.99%
橋面版	跨	308	1	0.32%	11	3.57%

工程進度更新至 109 年 8 月份實際進度。
