


113 年 03 月 GC03 標工程進度


- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站結構 B1~B2F 側牆無收縮灌注、B2F 出入口 A 樓梯施作、B3F 樓板施作及軌道區降挖。
- 三、G08、G09 站筏基層防水施作、地梁結構施作。
- 四、G10 站站體結構軌道層側牆施作、穿堂層版施作。
- 五、G11 站站體穿堂層隔間牆施作；出入口夾層版/牆施作；出入口 A 展演中心車道改道；出入口 C 自來水管遷移。
- 六、G12 站站體月台版施作、南北井永久底版施作；出入口 A 樓梯及電扶梯版施作、通風井(X)2F 升層牆施作。
- 七、中圓 No.1 潛盾機掘進(G10~G09)；No.2 潛盾機設備轉換作業及掘進(G10~G09)。
- 八、小圓 No.3 潛盾機到達及拖曳作業(G11)；No.4 潛盾機發進準備作業(G11)。
- 九、GC03 標截至 113 年 03 月 31 日，執行進度 50.08%。



G07_結構 B3F 樓板混凝土養護

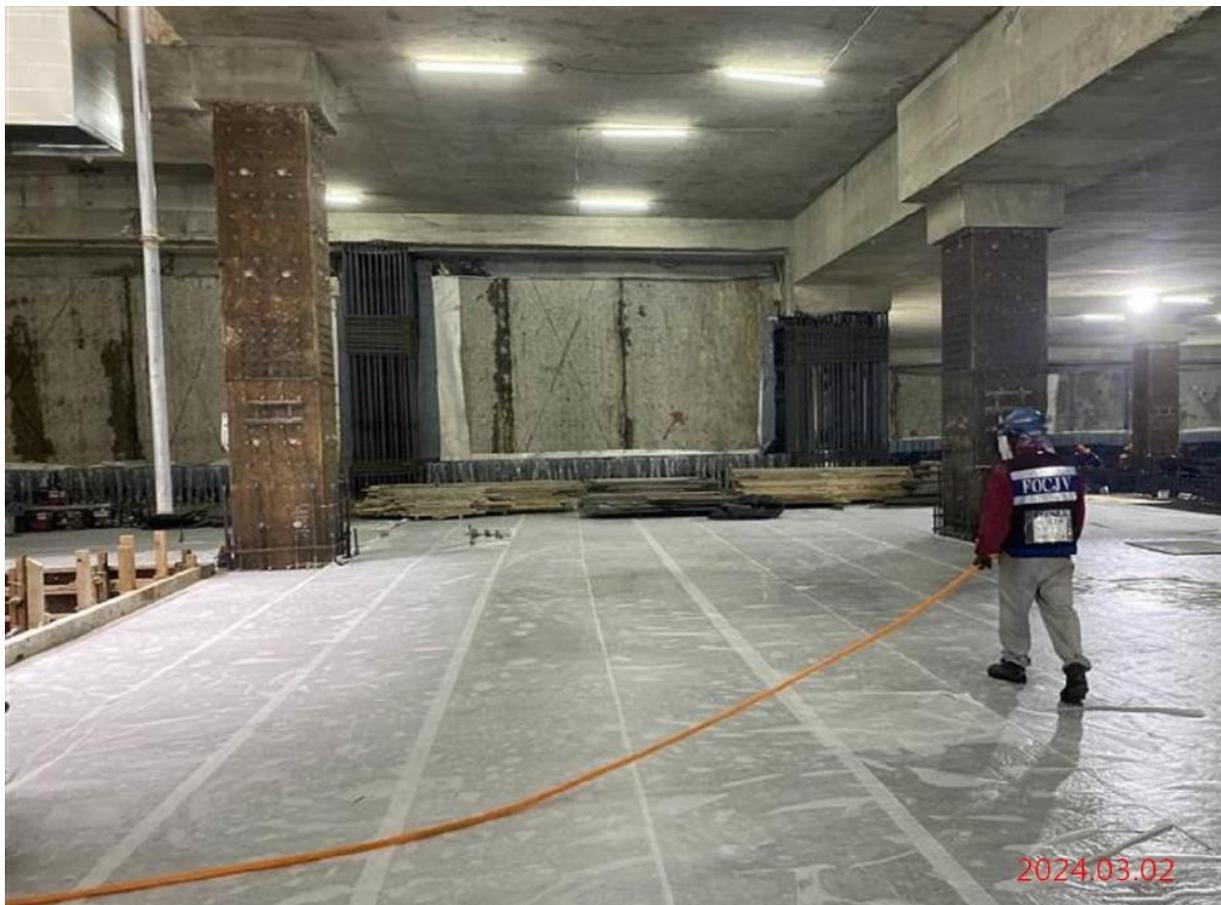

G07_結構 B3F 軌道層支撐施作

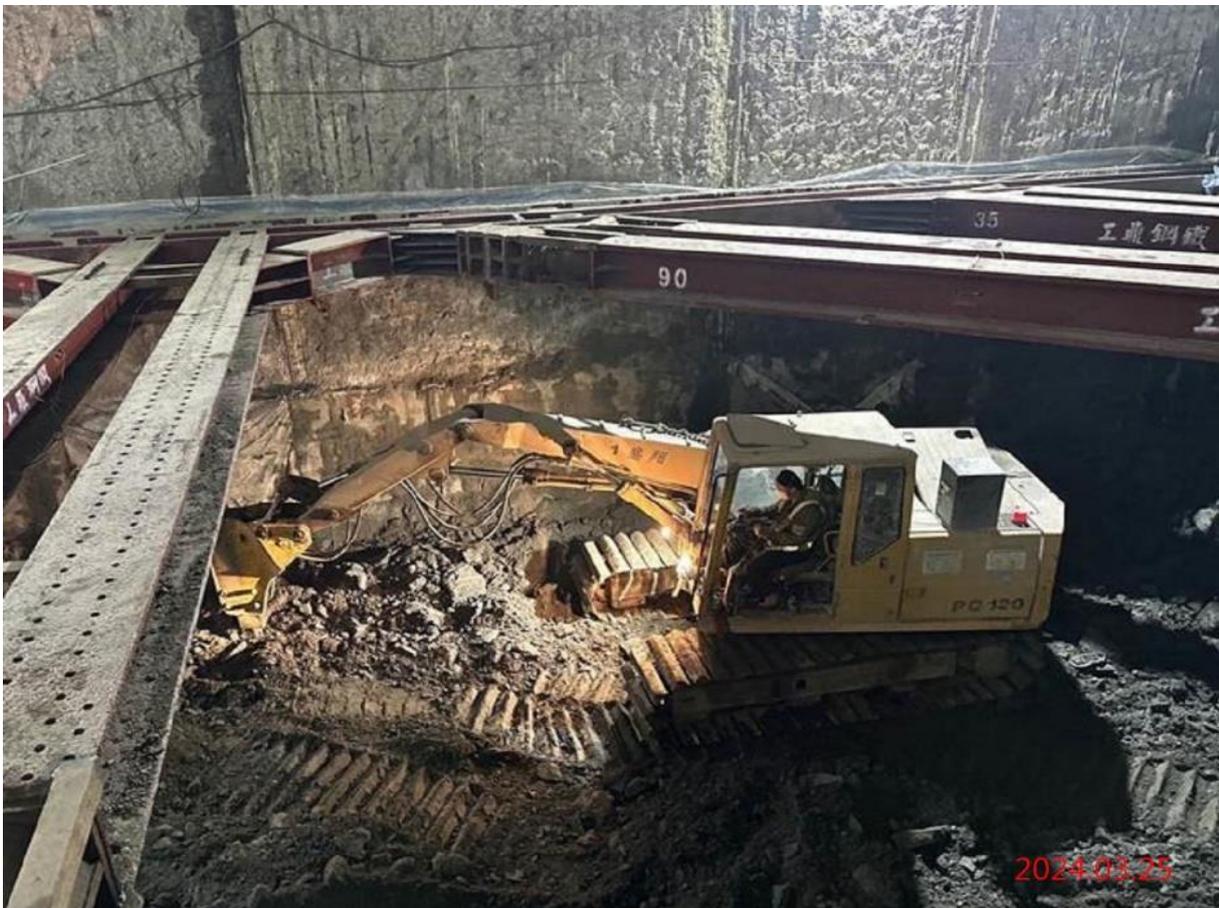

G07_結構 B3F 軌道層土方開挖




G08_筏基層地梁鋼筋施作




G08_筏基層防水膜施作



G09_筏基層地梁預埋管施作

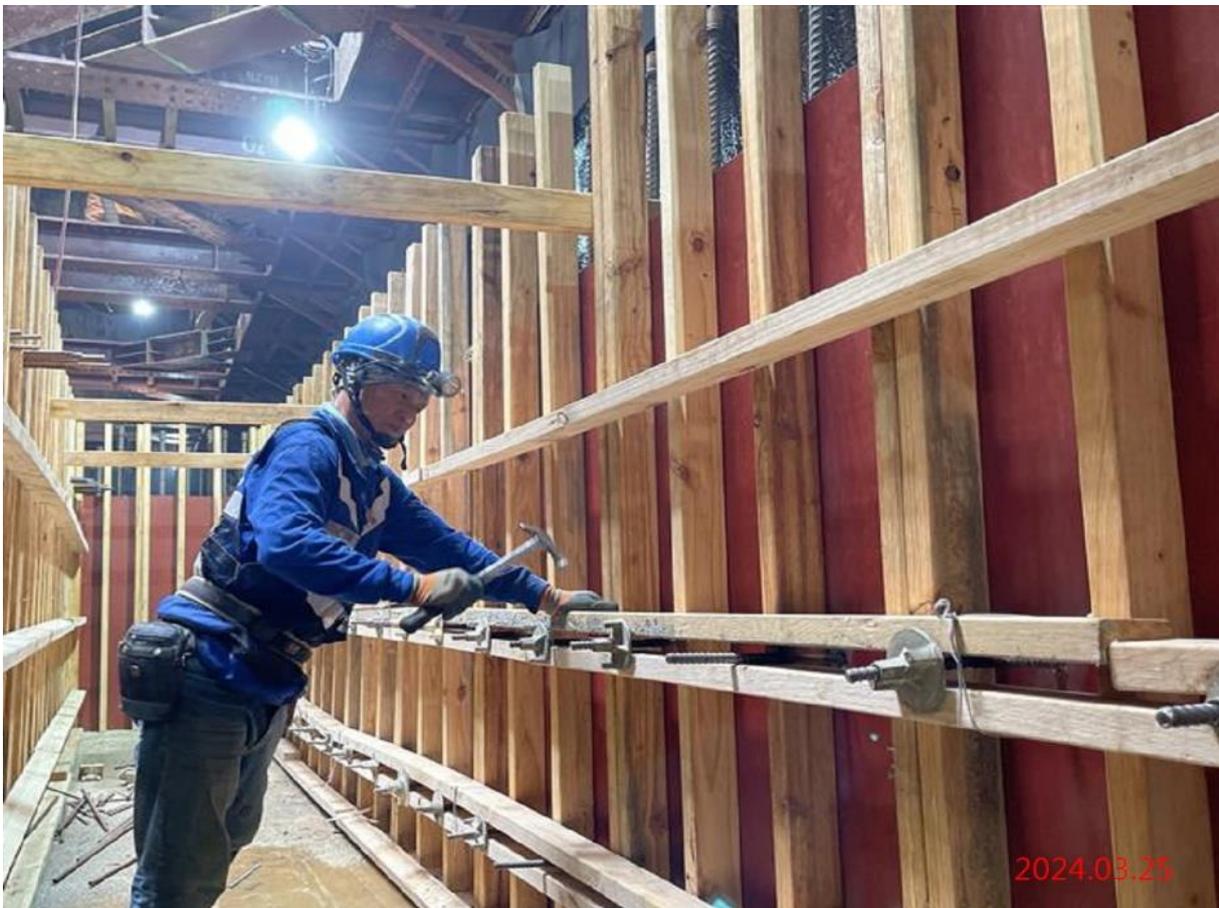


G09_筏基層地樑模板施作

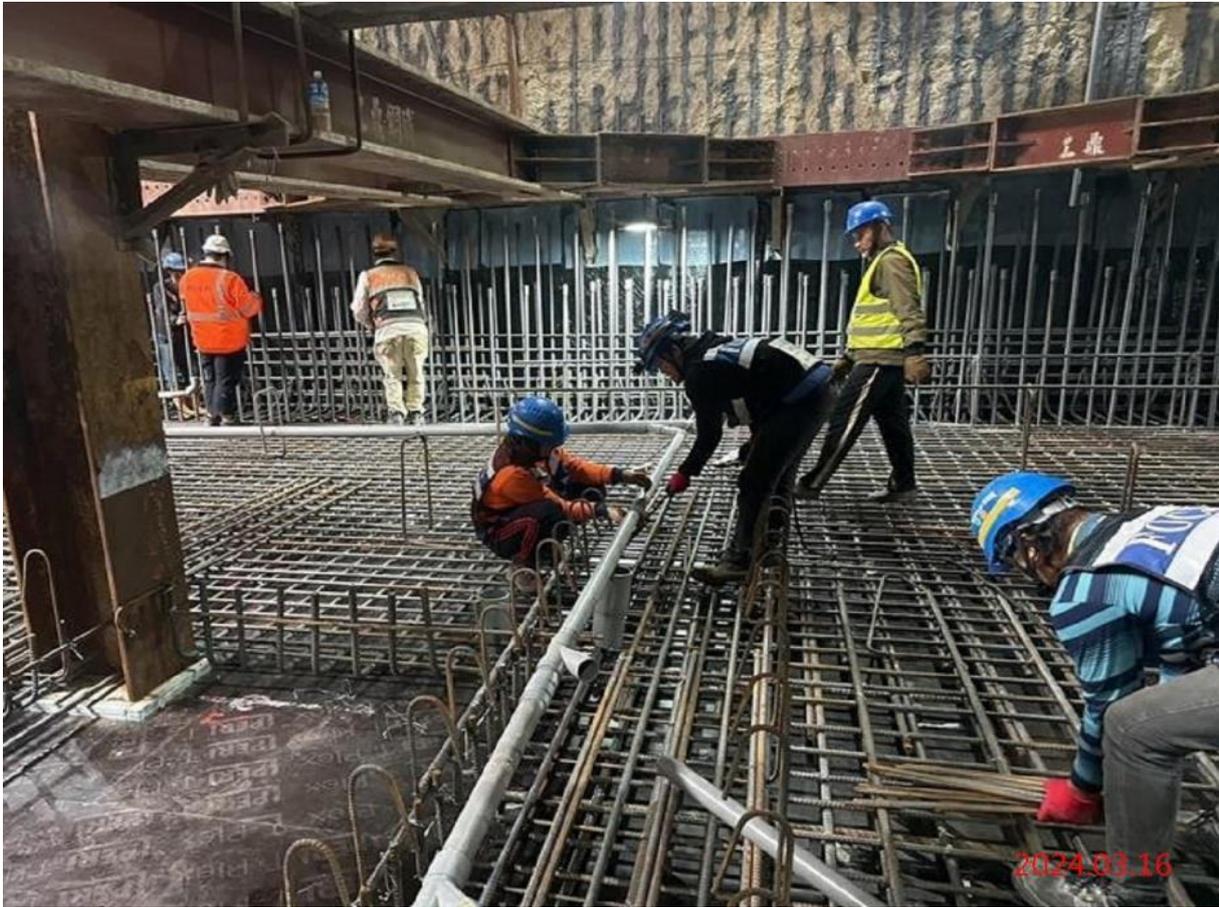

G10_站體穿堂層版排水管施作



G10_站體穿堂層版鋼筋綁紮

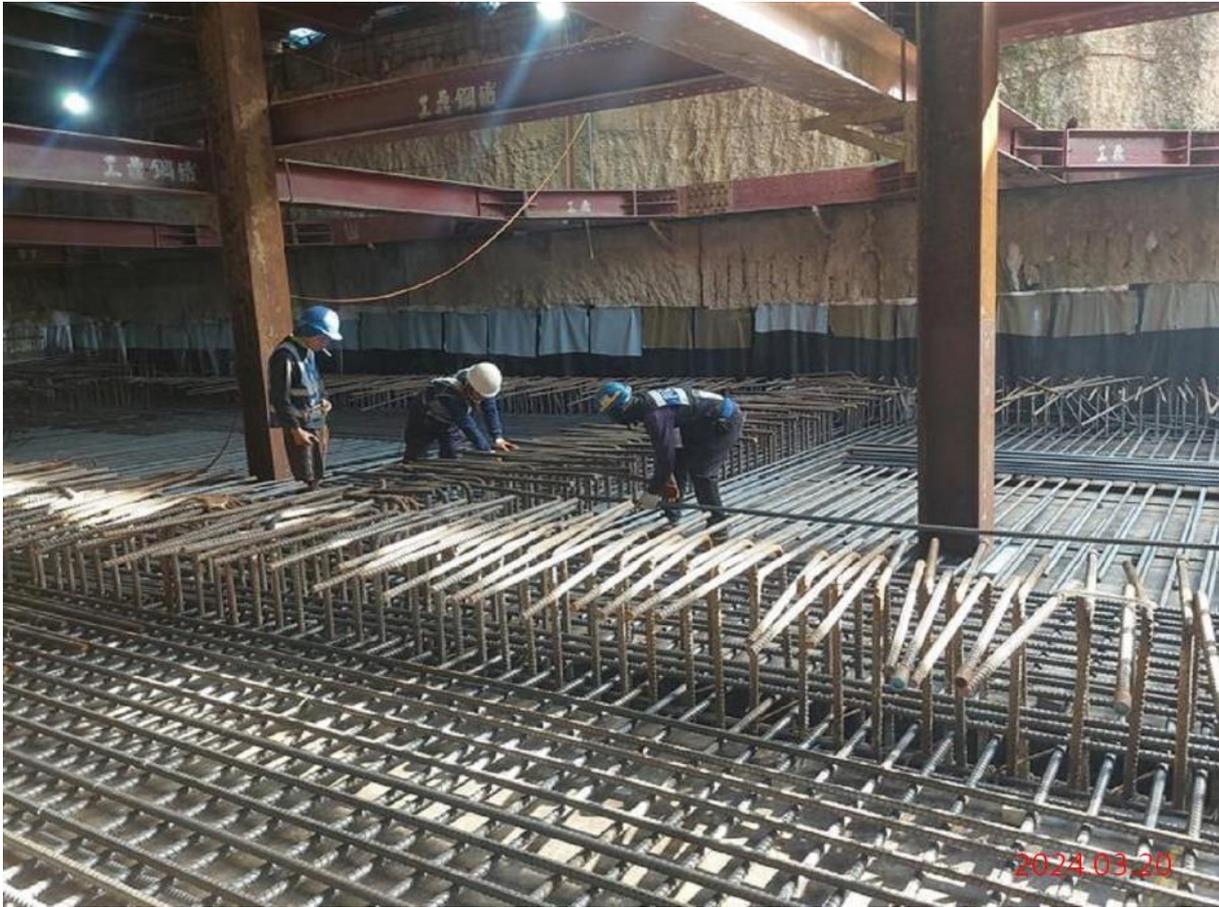

G11_出入口夾層版鋼筋加工綁紮



G11_出入口夾層牆模板組立




G12_站體月台層底版混凝土澆置



G12_出入口 A 夾層樓梯混凝土澆置



潛盾隧道_小圓下行線 G11 站北井到達架台組立

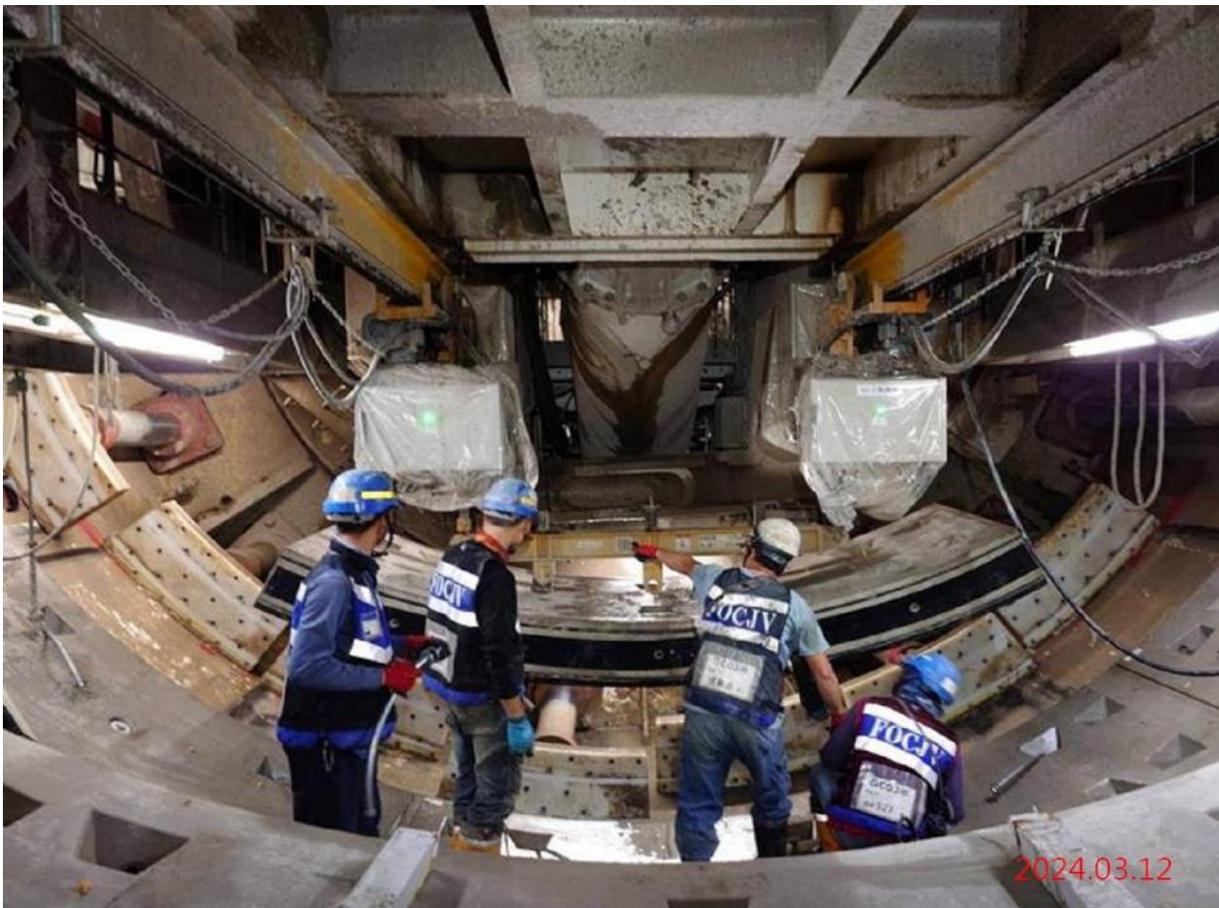

潛盾隧道_中圓下行線掘進作業(G10-G09)
