

112 年 09 月 GC03 標工程進度

- 一、各車站及潛盾隧道細部設計期中/期末送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。
- 二、G07 站進行 B1F-SRC 柱模板施作及澆置、B2F 開挖及結構施作。
- 三、G08 站進行第七層開挖及支撐系統施作。
- 四、G09 站進行已交付建物內裝及外牆拆除、第六層開挖及支撐系統施作、第七層開挖。
- 五、G10 站進行站體南北工區的開挖及支撐系統施作、南工區結構底板施作；出入口交維移設及管線探挖。
- 六、G11 站進行站體穿堂層隔間牆施作；出入口穿堂側牆、承重牆及夾層版施作；連通道緩築區澆置。
- 七、G12 站站體穿堂層基座施作；出入口 A 穿堂層隔間牆、通風井(Y)地面層結構施作；通風井(X)地面層結構施作。
- 八、G10 站中圓發進端鏡面試水；中圓潛盾換齒區 G08 0K+20 第四階段(中間側)地改；中圓換齒區 G09 0K+16 第四階段(中間側)地改。
- 九、G10 站中圓發進區 No.1、No.2 潛盾機及相關設備投入、組裝、配管配線。
- 十、小圓 No.3 及 No.4 潛盾機 G12~G11 掘進。
- 十一、GC03 標截至 112 年 09 月 30 日，執行進度 39.12%。



G07_結構 B1F 第二區 SRC 柱模板組立



G07_結構 B2F 第一、二區上版筋綁紮



G07_結構 B2F 第三、四區開挖



G08_第七層開挖



G09_第六層開挖




G10_南工區底版鋼筋綁紮



G11_出入口穿堂層側牆模板組立



G12_出入口 A 穿堂層隔間牆模板作業

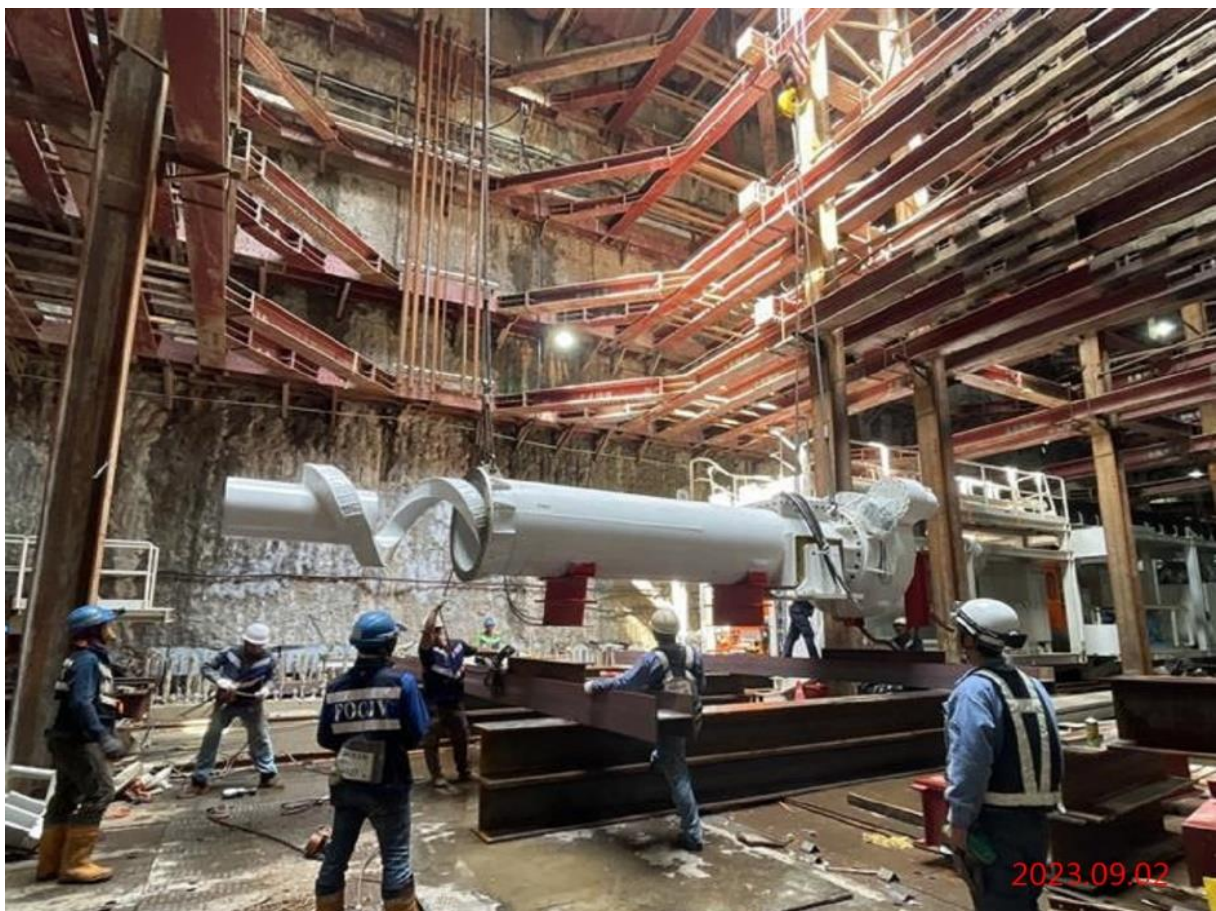

潛盾隧道_G10 站中圓發進端下行線潛盾機二次螺運機組裝



潛盾隧道_小圓上行線掘進(G12-G11)
