

110 年 02 月 GC02 標工程進度

- 一、 南出土段安全監測作業、安全監測儀器安裝、鋼軌樁打設、地盤處理。
- 二、 G03 站管線遷移施工、安全監測作業、支撐型鋼樁打設。
- 三、 G04 站連續壁施作前置作業、安全監測儀器安裝。
- 四、 VS4 通風豎井管線遷移施工、連續壁導溝施作。
- 五、 G05 站臨時排水工程、連續壁導溝施作。
- 六、 VS5 通風豎井安全監測作業、管線遷移施工。
- 七、 G06 站連續壁施作、安全監測作業、管線遷移施工。
- 八、 VS6 通風豎井安全監測作業、第二層支撐施作、地盤處理。
- 九、 連續壁、結構開挖施工相關計畫書提送、細部設計期中/期末送審、BIM(建築資訊模型)、PMIS(計畫管理資訊管理系統)建置。
- 十、 GC02 標截至 110 年 2 月 28 日，預定進度 7.48%，實際進度 7.62%。



南出土段鋼軌樁打設



南出土段地盤處理鑽孔施作




G03 站支撐型鋼樁打設



G05 站臨時排水施作



G06 站連續壁鋼筋籠施作

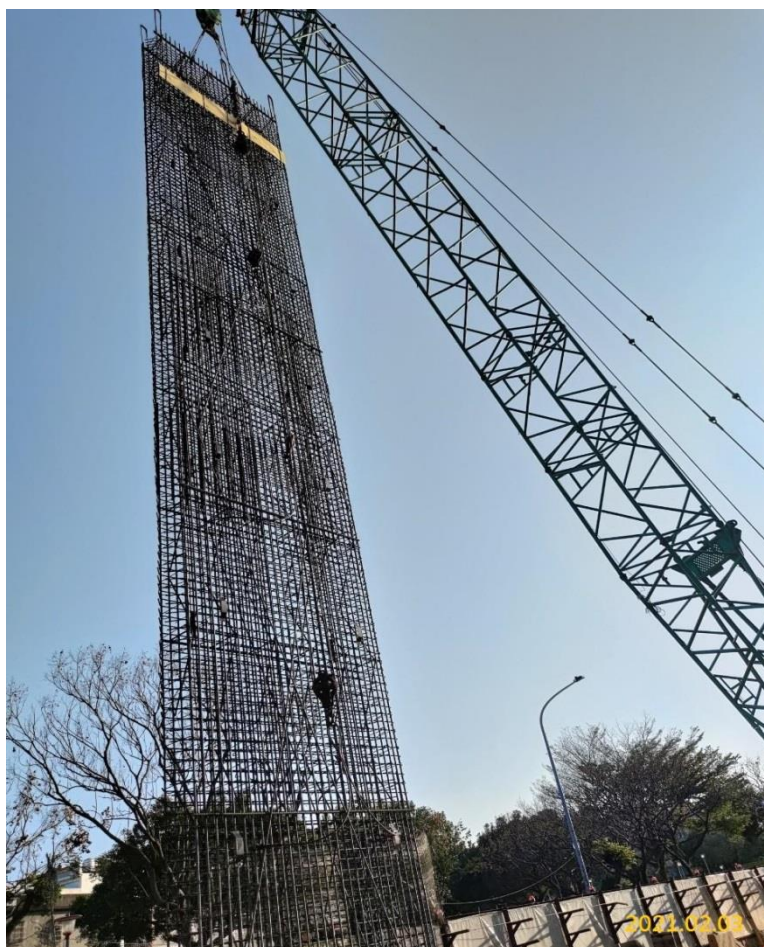

G06 站連續壁鋼筋籠吊放



G06 站連續壁單元施作



VS6 通風豎井第二層支撐施作
