

113 年 8 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 新關道路_ 共同管道 EM121~221、TM125~226 對向橫交管管群回填
- (9) 代辦台電基礎台 EM121~221、EM123~223、EM125~225 管群回填
- (10) 出流管制側溝 SCS-06 開挖
- (11) IA 截水溝，5k+080~120 底板鋼筋組立，5k+040~080 側牆模板組立。
- (12) G01 車站及 G02 車站站體與連通道吊裝完成，金屬牆板及帷幕牆施作。
- (13) G01 車站及 G02 車站出入口目前進行給排水及屋頂防水作業。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行場鑄箱型梁 DU14-04 中線中央步道模組立；DU14-14 上行線鋼筋組立、下行線三角托架及底板組立；DU14-06 中線胸牆養護及拆模作業；DU14a-01(PD-5~PD-8)中央步道牆身組立。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。

(8) G13 車站出入口及站體目前進行金屬帷幕骨架施作、穿堂層倒吊鋁板組裝及照明系統配管工程；G13a 車站出入口目前進行金屬帷幕施作、照明系統配管工程；G14 車站入口及站體目前進行月台層施作及電器配管工程；G31車站入口及站體目前進行出入口回填整地及火警系統配管施作；G32 車站出入口目前進行車站站體電鍍及線槽安裝。

三、GC01 標截至 113 年 8 月 31 日進度為 79.56%。




G32 月台梁（TG3~TG5）頂版鋼筋綁紮



G32 站 5F 消防及撒水幹管配管




G14 車站站體穿堂層墊層混凝土澆置

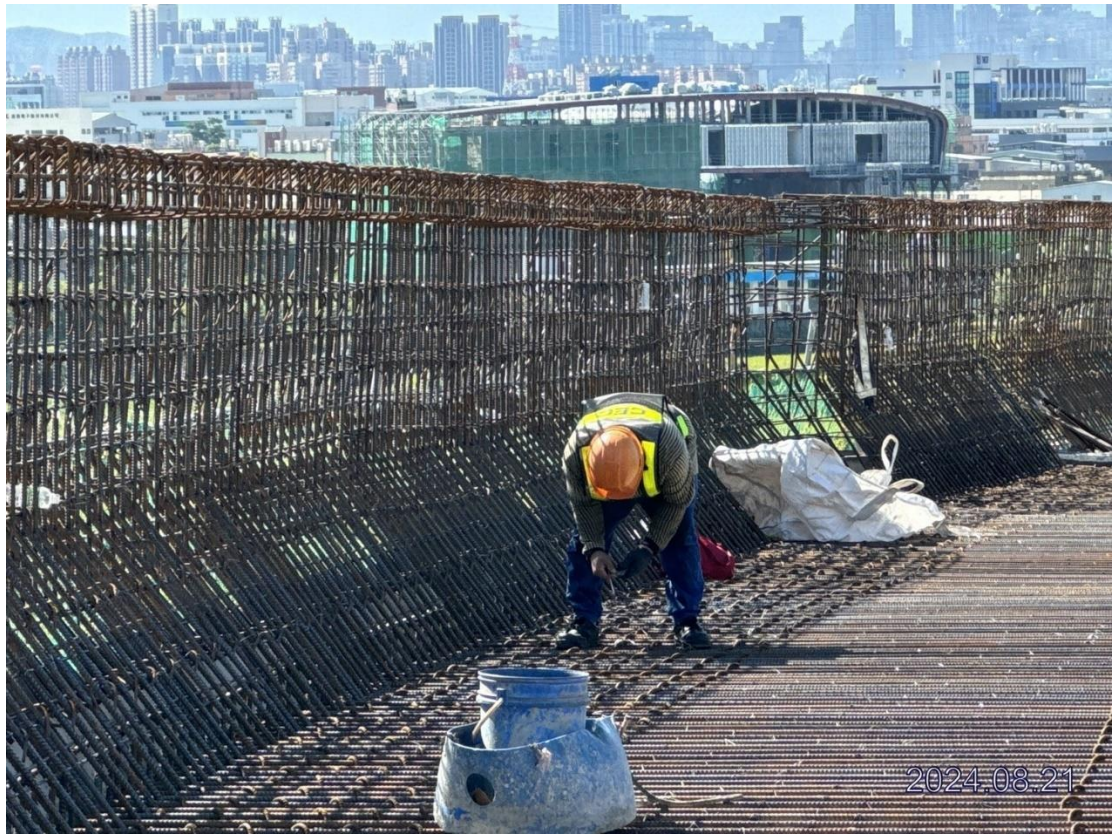


DU14-14 上行線橋面版鋼筋綁紮



G13a 車站站體屋突雨排管施作

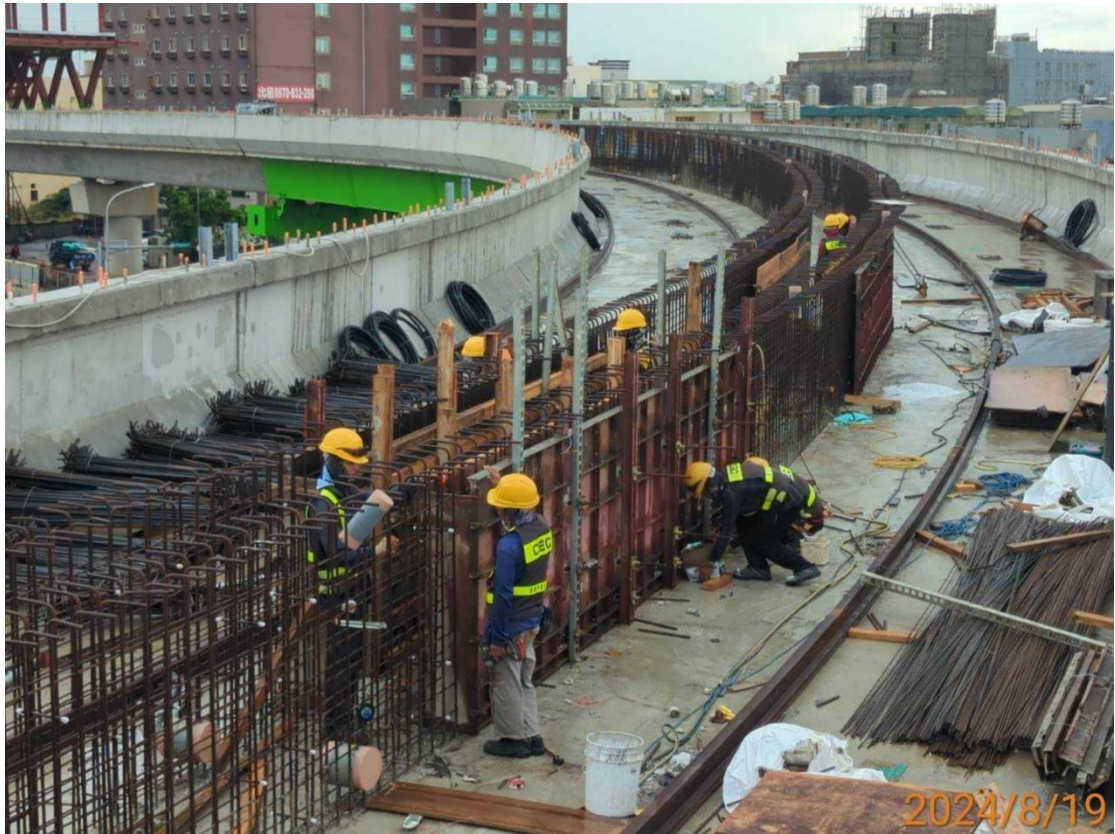

DU31-02 中間步道鋼筋綁紮

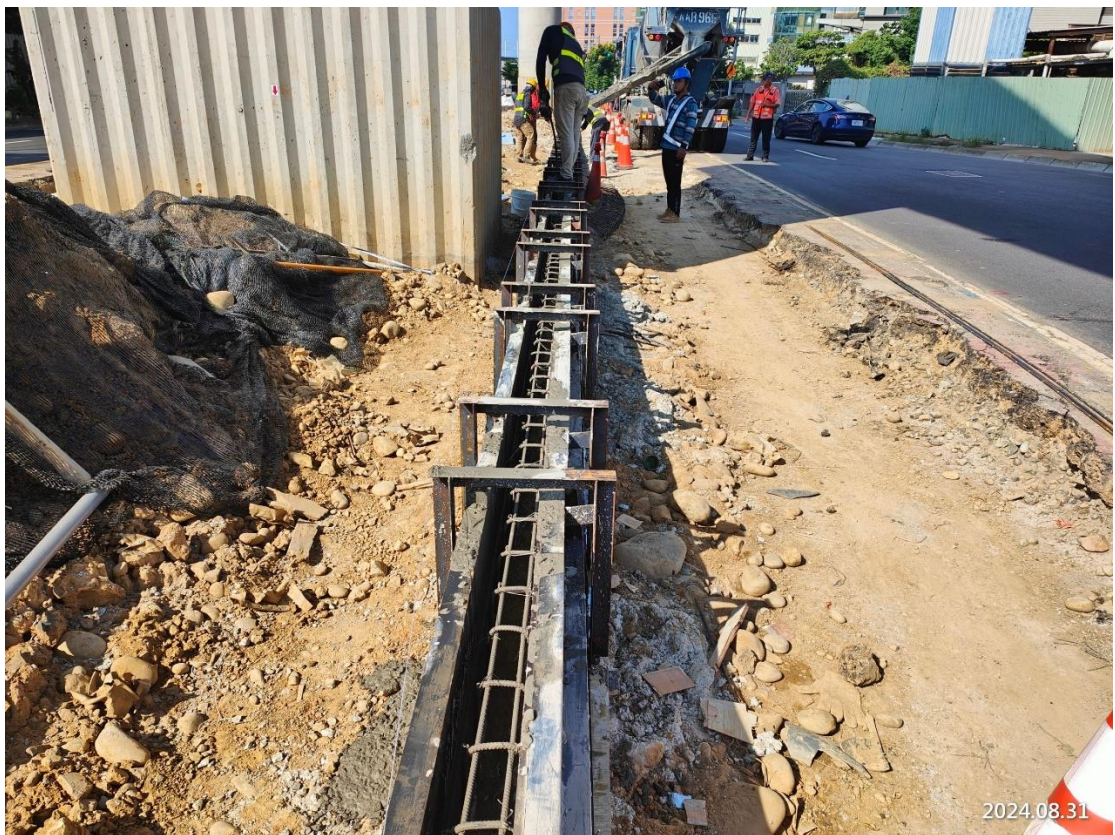

南工路場鑄路緣石模板混凝土澆置
