

## 110 年 12 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路持續進行帽梁施作，目前進行 P01-06 鋼筋綁紮，將接續進行模板組立及混凝土澆置，累計已完成 50 座帽梁。
- (5) 建德路及新關道路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08、P01-13~P01-15、P01-28~P01-31、P01-40~P01-41、PG02-04~P02-01，累計 13 跨場鑄箱型梁橋面版，目前完成 P01-41~P01-43 第 2 跨底腹版混凝土澆置。
- (6) 新關道路已完成 P01-18~24、P01-31~P01-39，累計 28 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 新關道路已完成 P01-15~18，累計 3 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) G01 車站出入口目前進行 2 樓柱牆鋼筋綁紮；G02 車站出入口目前進行 2 樓版模板組立。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 1,414 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 162 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 P14/15-01 第三昇層模板組立及 P14-31 第三、四昇層鋼筋綁紮，將接續進行 P14/15-01 第三昇層混凝土澆置、P14-31 第三、四昇層模板組立及混凝土澆置，累計已完成 124 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 P13a-07、P14/15-04 模板組立及 P13a-19、P14/15-02 鋼筋綁紮，將接續進行 P13a-07、P14/15-04、P13a-19 及 P14/15-02 鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，累計已完成 99 座帽梁。
- (5) G13 車站目前進行月台梁目前進行鋼構生產作業，預計 1 月底進行吊裝。
- (6) 中正北路已完成 P12-16~P12-17、P12-17~PG13-1、PG13-4~P13-1、P13-36~PG13a-

01(下行線)·累計 4 跨場鑄箱型梁橋面版·目前進行 P13-36~PG13a-1 底腹版模板組立·P13-14~17 頂版模板組立及鋼筋綁紮·PG32-1~P31-27 底版模板組立。

(7) 中正北路已完成 P12-04~P12-14、P13-02~P13-14、P13-17~P13-34·累計 94 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝·目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。

(8) 中正北路已完成 P13-14~P13-17·累計 4 跨鋼箱型梁吊裝·目前持續進行鋼箱型梁生產作業。

(9) G13 車站出入口目前進行 2 樓柱牆鋼筋綁紮；G13a 車站出入口目前進行 2 樓柱牆施工架搭設及模板組立；G14 車站出入口目前 1 號樓梯模板組立；G31 車站出入口目前進行筏基地梁及 B2 版模板組立；G32 車站出入口目前進行 2 樓柱牆鋼筋綁紮。

三、GC01 標截至 110 年 12 月 31 日進度為 39.34%。



八德建德路 帽梁鋼筋綁紮




八德新闢道路 G01 車站出入口鋼筋綁紮



八德新闢道路 鋼箱型梁現況施作情形



大園三民路二段 基樁混凝土澆置

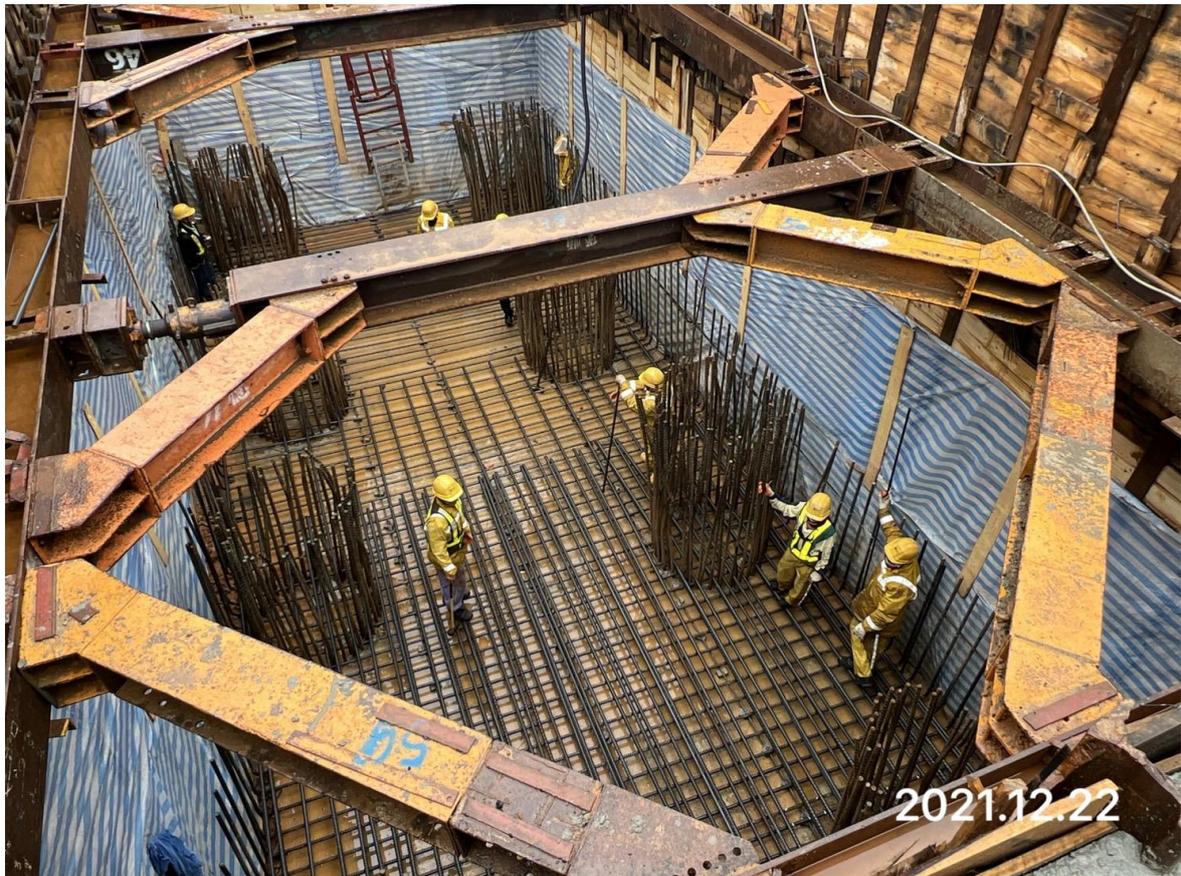

大園三民路二段 樁帽鋼筋綁紮



12.10.2021

大園坑菓路 墩柱混凝土澆置



12.02.2021

大園坑菓路 帽梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 場撐箱型梁鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 G13 車站出入口混凝土澆置



蘆竹中正北路 鋼箱型梁夜間吊裝

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
