

112 年 1 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 60 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08、P01-13~P01-15、P01-28~P01-31、P01-40~P01-41、P01-42~P01-43、PG02-04~P02-01，累計 14 跨場鑄箱型梁橋面版，目前將接續進行 P01-41~P01-42 模板組立。
- (6) 新關道路已完成 P01-04~06、08~13、18~28、P01-31~P01-39、P02-01~P02A-07，累計 62 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 新關道路已完成 PE01~02、P01-15~18，累計 4 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) G01 車站出入口目前進行 4 樓版梁鋼筋綁紮及模板組立；G02 車站出入口目前進行 3 樓柱牆及 RF 梁版模板拆除綁紮。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 232 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 PG32-8A 拆模前置作業，將接續進行 P14-25、P14/15-13 第一昇層重型施工架搭設，累計已完成 203 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 P14/15-12、P14/15-13、P14/15-14 模板及施工架拆除、P14/15-15 混凝土澆置、P14-21 鋼筋綁紮及 PD-08 模板組立，將接續進行 P14/15-13 模板及支撐架拆除、P14/15-15 模板組立、P14-21、P14-27、PD-09、PD-10 鋼筋綁紮，累計已完成 159 座帽梁。

- (5) G02 車站、G13a 車站目前進行頂棚鋼構吊裝作業。
- (6) 中正北路已完成 P12-15~P12-17、P12-17~PG13-1、PG13-4~P13-1、P31-13~P31-15、P13-36~PG13a-01(上、下行線)、PG13a-6~P13a-02(上、下行線)、P13a-10~P13a-13、P14-32~P14-33、P31-25~PG32-1，累計 16 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P31-20~21 底腹版鋼筋綁紮、P14-33~P14-34 模板組立。
- (7) 中正北路已完成 P12-04~P12-15、P13-01~P13-14、P13-17~P13-36、P13a-02~5a、P13a-31~57、P14-38~46，累計 162 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (8) 中正北路已完成 P12A-01~P12-02、P13-14~P13-17、P13a-05a~P13a-10、P13a-13~P13a-19、P13a-26~28a，累計 18.5 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (9) 大園三民路二段 P14-31~P14-32 進行平衡懸臂施作，目前已完成 22 塊，將持續進行施作。
- (10) G13 車站出入口目前進行屋突層施工架搭設；G13a 車站出入口目前進行 2 樓柱牆第二昇層重型支撐架搭設；G14 車站出入口目前進行 2 樓柱牆第一昇層模板組立；G31 車站出入口目前進行 B1 柱牆第二昇層模板組立；G32 車站出入口目前進行 2 樓混凝土墊層模板拆除整理。
- 三、GC01 標截至 112 年 1 月 31 日進度為 58.97%。



八德新關道路 G02 車站出入口 3 樓柱牆及 RF 版梁混凝土澆置



八德新闢道路 場鑄箱型梁預力套管施作



大園三民路二段 樁帽混凝土澆置




大園三民路二段 墩柱鋼筋綁紮



大園三民路段 帽梁鋼筋綁紮



大園坑菓路 場鑄箱型梁混凝土澆置

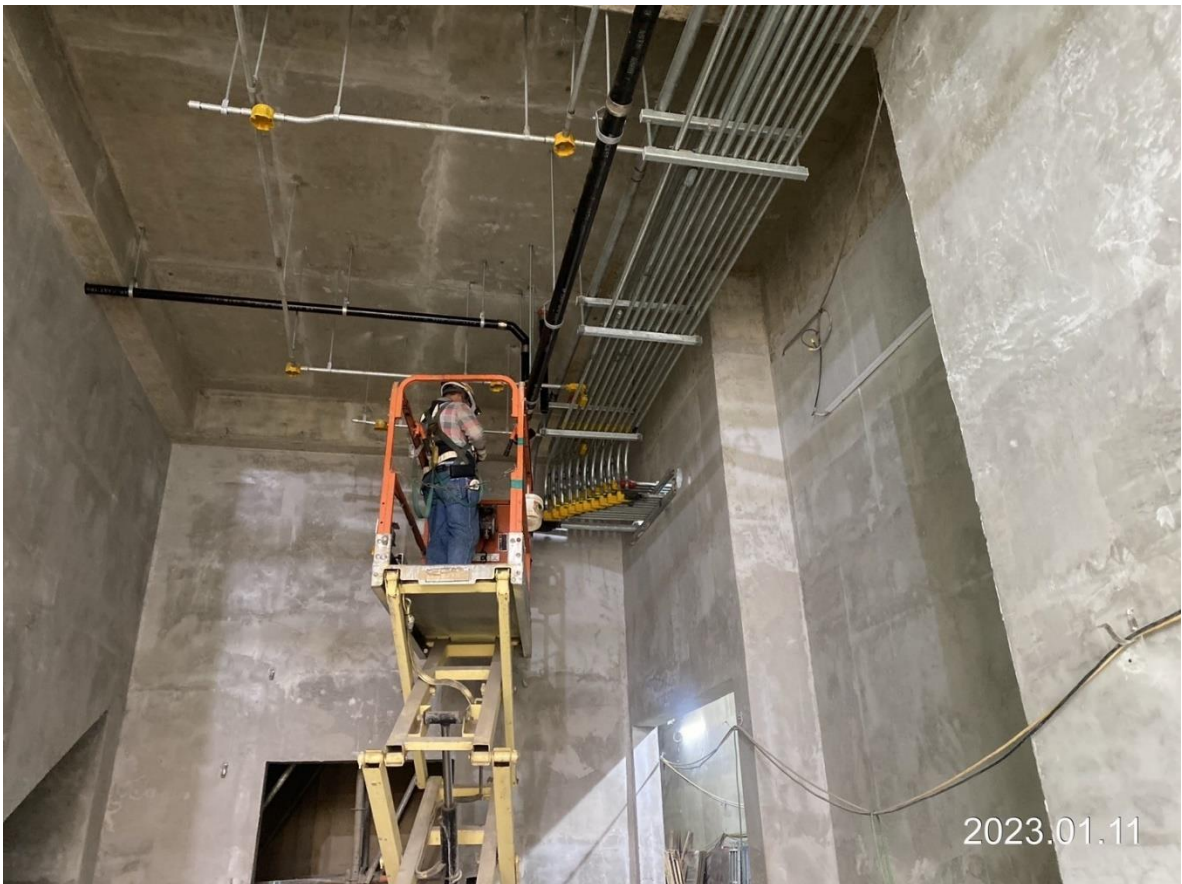

蘆竹中正北路 G13 車站出入口 1 樓排水管施作



蘆竹南崁路二段 鋼 U 型梁吊裝



蘆竹南崁路二段 鋼 U 型梁吊裝完成現況照片

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
