

114 年 3 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新闢道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新闢道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新闢道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新闢道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新闢道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 雨水箱涵及更寮腳支線北側漸變銜接段、下游南側溢流集水井頂版模板、鋼筋綁紮。
- (9) 植栽(建德路~仁德路 95 巷)中央分隔島內進沃土、平戶杜鵑種植。
- (10) 號誌(仁德路、95 巷路口)立桿。
- (11) 欄杆(仁德路 95 巷~廣興路)北側架設。
- (12) 建國路增築範圍整地。
- (13) 出流管制 FW17 至皮寮溪 RCP 埋設。
- (14) 分隔島路緣石基座 (4k+445~485、建國路島頭) 鋼筋模板組立。
- (15) 台電分歧部分施作 (建國路至 02 站) 。
- (16) DU01-01 中央步道拆模。
- (17) DU00-02 胸牆拆移模作業。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。

- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 M31 路緣石基座模版組立、DU14-03、DU14-09 單元橋面排水管安裝、DU14a-01 單元胸牆修飾作業。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) G13 車站目前進行高架熔絲箱施工等；G14(原 G13a)車站出入口目前進行逃生梯穿鎖扭斷、站體目前進行 3F 空調水管施工等；G15(原 G14)車站站體目前進行 2F 電力系統施工、3F 空調水管施工等；G15a(原 G31)車站出入口目前進行 3F 火警系統配管、1F、5F 電力系統線槽施工作業等；G15b(原 G32)車站出入口目前進行 4F 火警系統配管、5F 電氣系統施工等。


三、GC01 標截至 113 年 3 月 30 日進度為 83.78%。




G02 車站出入口室內地磚施作



G14(原 G13a)車站站體鋁帷幕施作

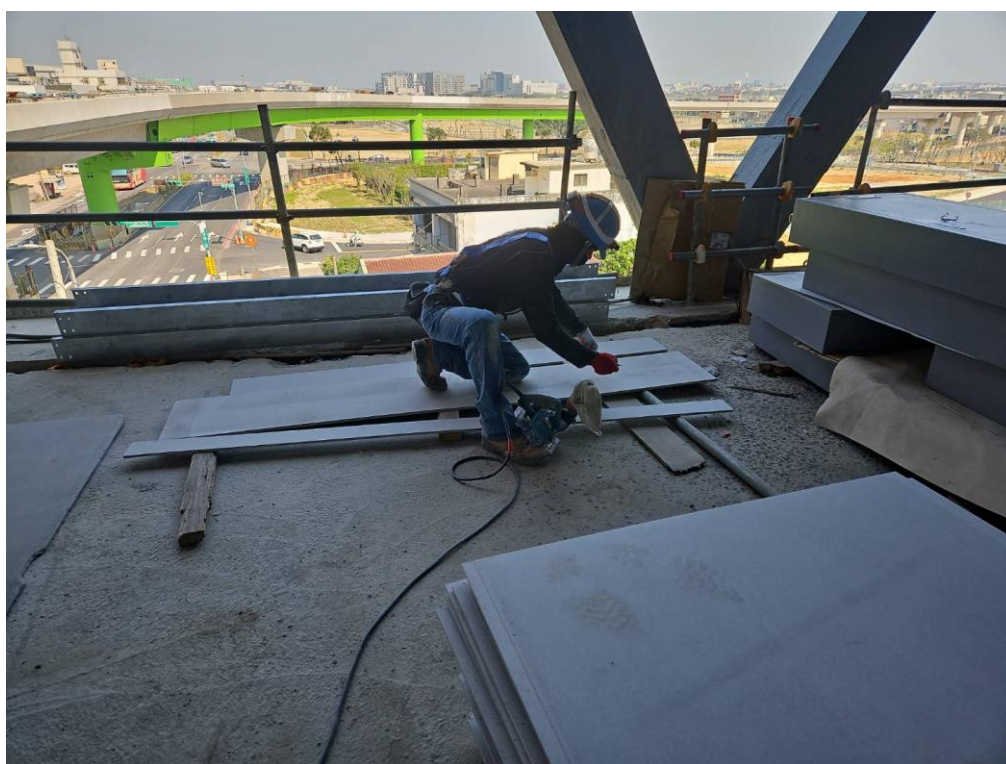

G15a(原 G31)車站站體連通道輕隔間封板

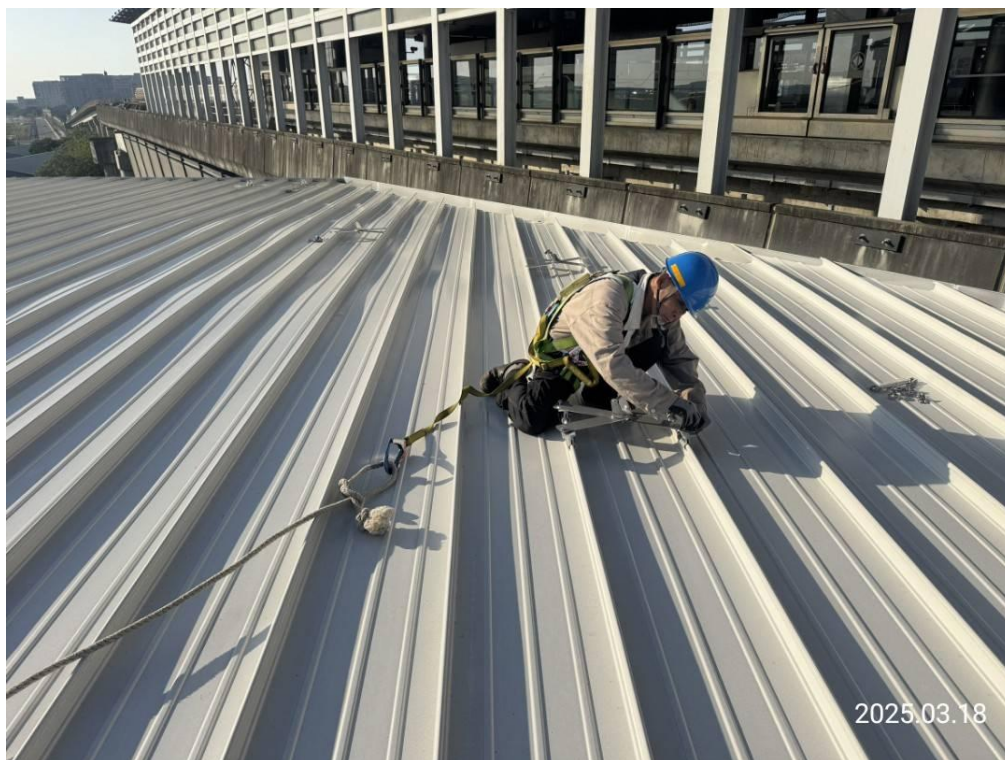

G15b(原 G32)車站站體金屬屋頂防墜系統安裝



G15b(原 G32)車站 3F 電氣系統施工
