

109 年 10 月 GC03 標工程進度

- 一、 G07 站進行連續壁施工、清代鐵道遺構提取及第二階段交維佈設。
- 二、 G10 站進行槽溝保護、導溝施工及連續壁施工。
- 三、 G11 站出入口連續壁施工、東側站體導溝及槽溝保護施工。
- 四、 G12 站進行出入口槽溝保護及導溝施工、中間柱施工。
- 五、 北出土段進行全套管基樁施工、型鋼擋土樁施工。
- 六、 GC03 標截至 109 年 10 月 31 日，預定進度 3.48%，實際進度 4.00%。



G07 站_連續壁 L75 單元澆置



G07 站_連續壁 G77 單元抓掘



G07 站_疑清代軌道遺跡文資提取




G07 站_連續壁 G77 單元鋼筋籠吊放



G10 站_人行道復舊



G10 站_中正路東側槽溝保護

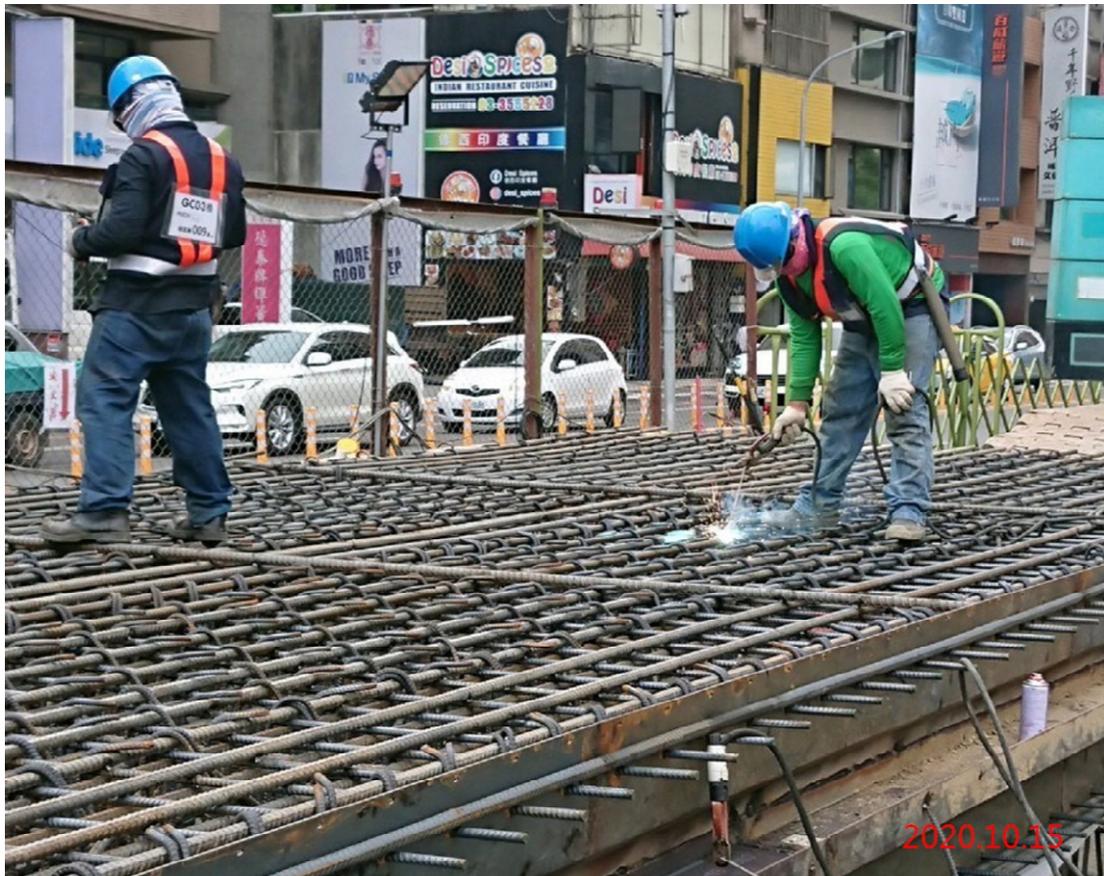

G10 站_連續壁 D008 單元鋼筋籠組筋



G10 站_連續壁單元 D008 混凝土澆置



G11 站_連續壁 F132 單元鋼筋籠組立



G11 站_連續壁單元 M147 鋼筋籠吊放



G11 站_連續壁單元 M135 抓掘



G12 站_出入口 B 工區導溝開挖



G12 站_中間柱型鋼燒焊



G12 站_站體中間柱 S10 型鋼吊放



G12 站_站體中間柱 S7 抓掘



0201007_GC03_北出土段_全套管基樁鋼筋籠加工



北出土段_H型鋼樁加工施作
