

113 年 3 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：


- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新關道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新關道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站及 G02 車站站體與連通道吊裝完成。
- (10) G01 車站及 G02 車站出入口目前進行 4 樓門框修飾與防水施工、給排水系統配管及外牆樓層接縫防水前置作業。

二、蘆竹、大園(北段)工區：


- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 224 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 42 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-04 支撐架搭設及側模組立；DU14-08 第四跨腹版組立及頂版混凝土澆置；DU14-07 模板及支撐架拆除；DU13a-09 腹牆混凝土澆置。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 196 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。
- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 52 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。

(8) G13 車站及 G13a 車站出入口及站體目前進行防落橋裝置安裝及電氣管路施作；G14 車站出入口目前進行站體鋼承板鋪設及連通道及穿越層鋼筋綁紮；G31 車站出入口目前進行模板物料清理及站體吊裝(夜間)；G32 車站出入口目前進行給排水管路施作及月台梁 (TG1~TG3)頂版鋼筋綁紮作業。


三、GC01 標截至 113 年 3 月 31 日進度為 76.60%。

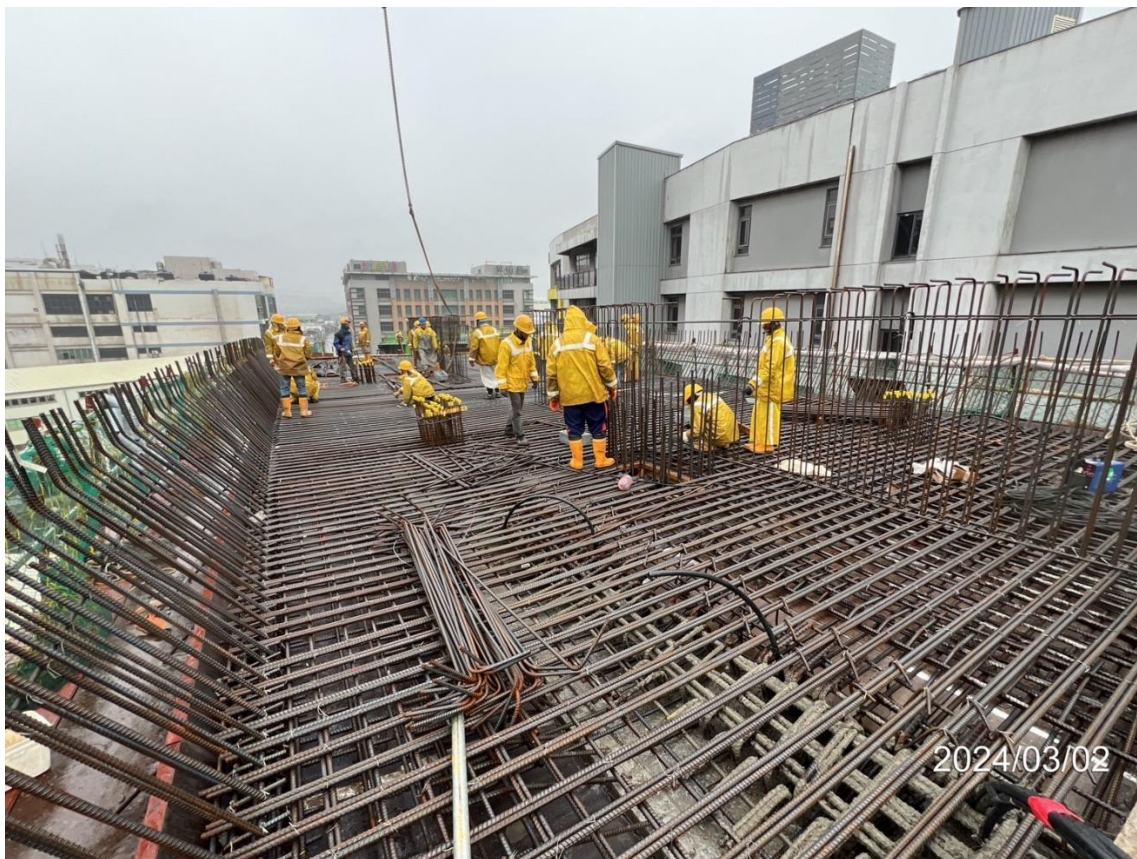


北段上構_DU13a-09-3 場撐箱型梁頂版鋼筋綁紮

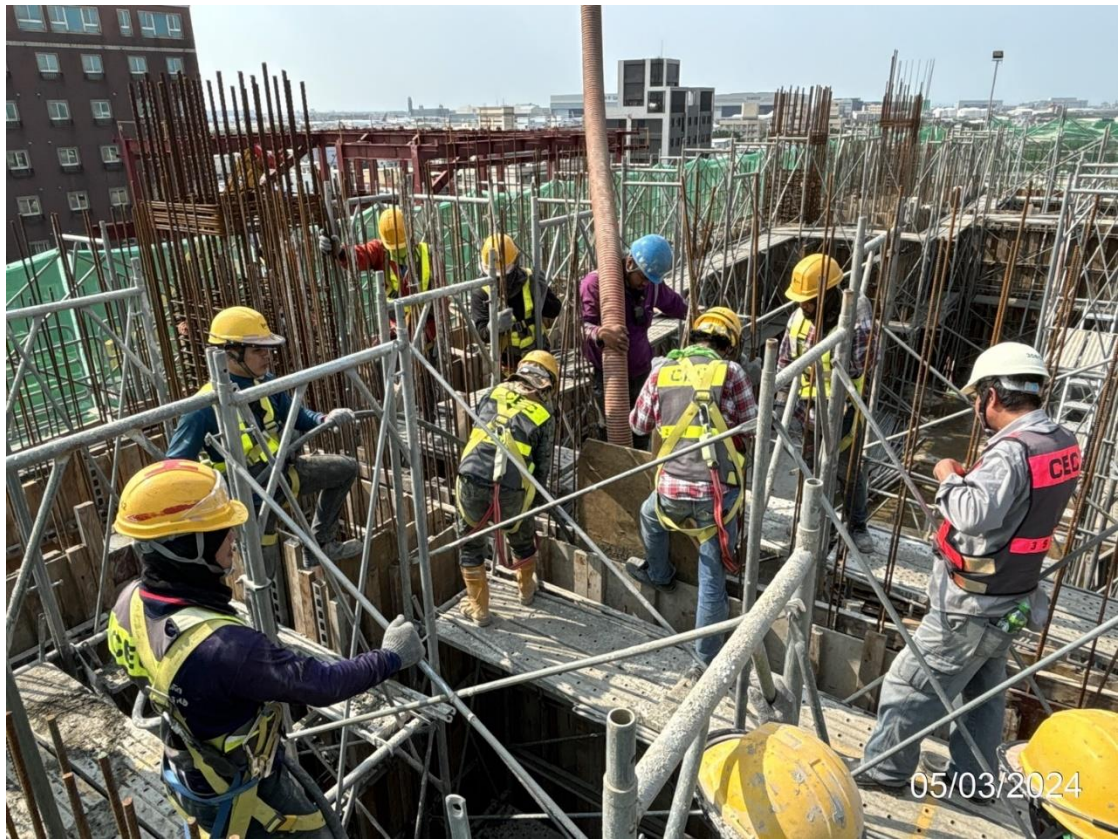


北段_G31 車站出入口四樓柱牆第一昇層混凝土澆置

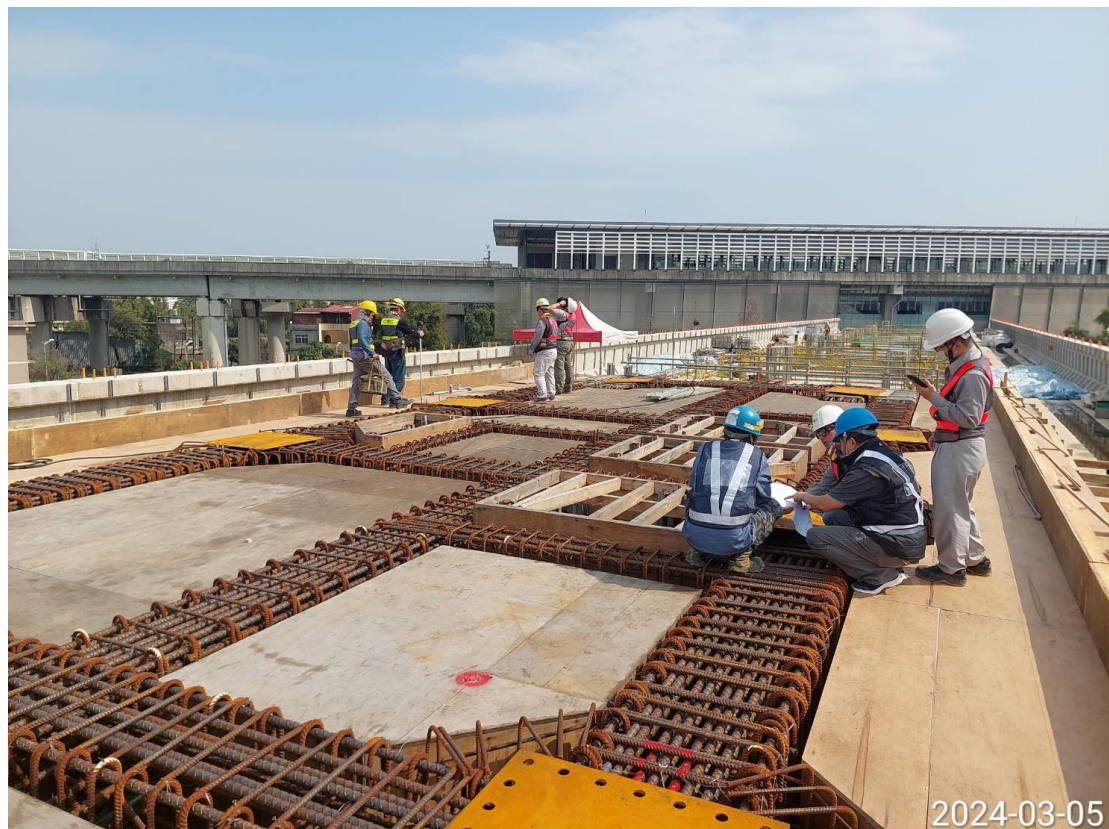

北段上構_G32 站月台梁(TG7 ~ TG8)支撐架位置高程檢測

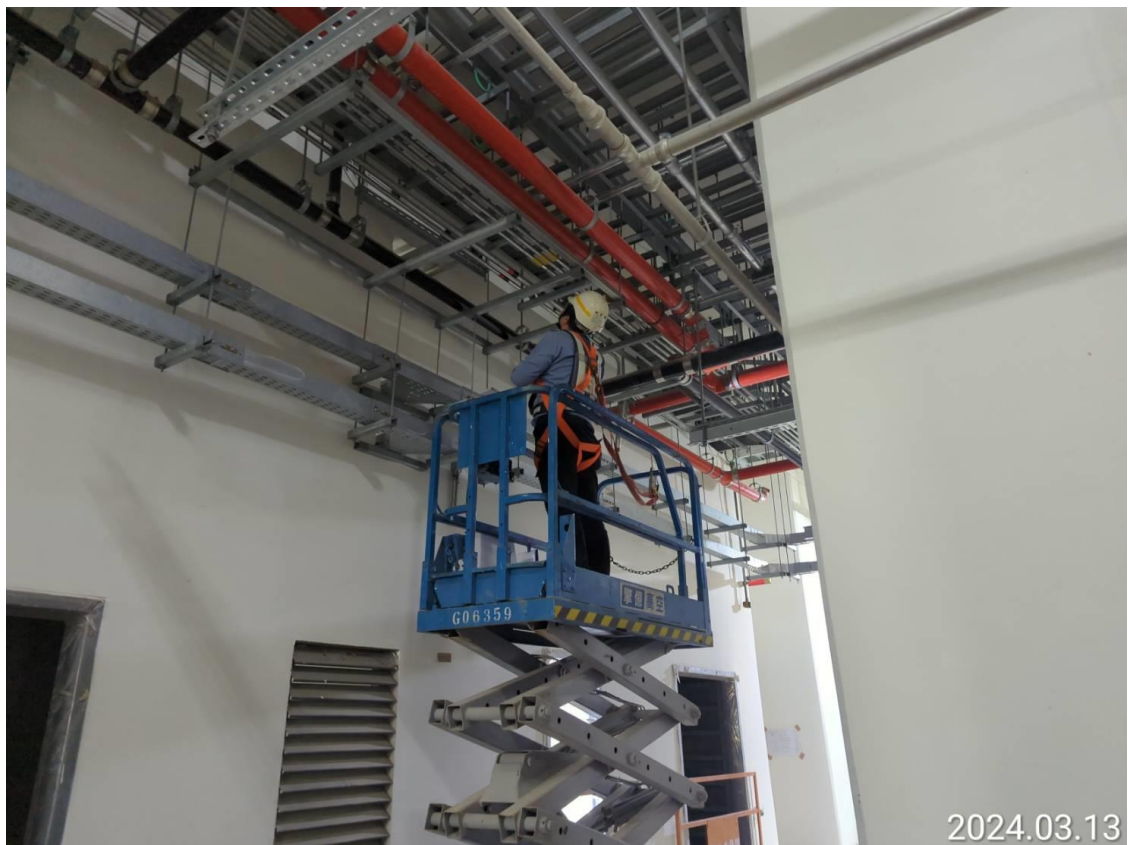

水環所_G13 站電氣管路施作

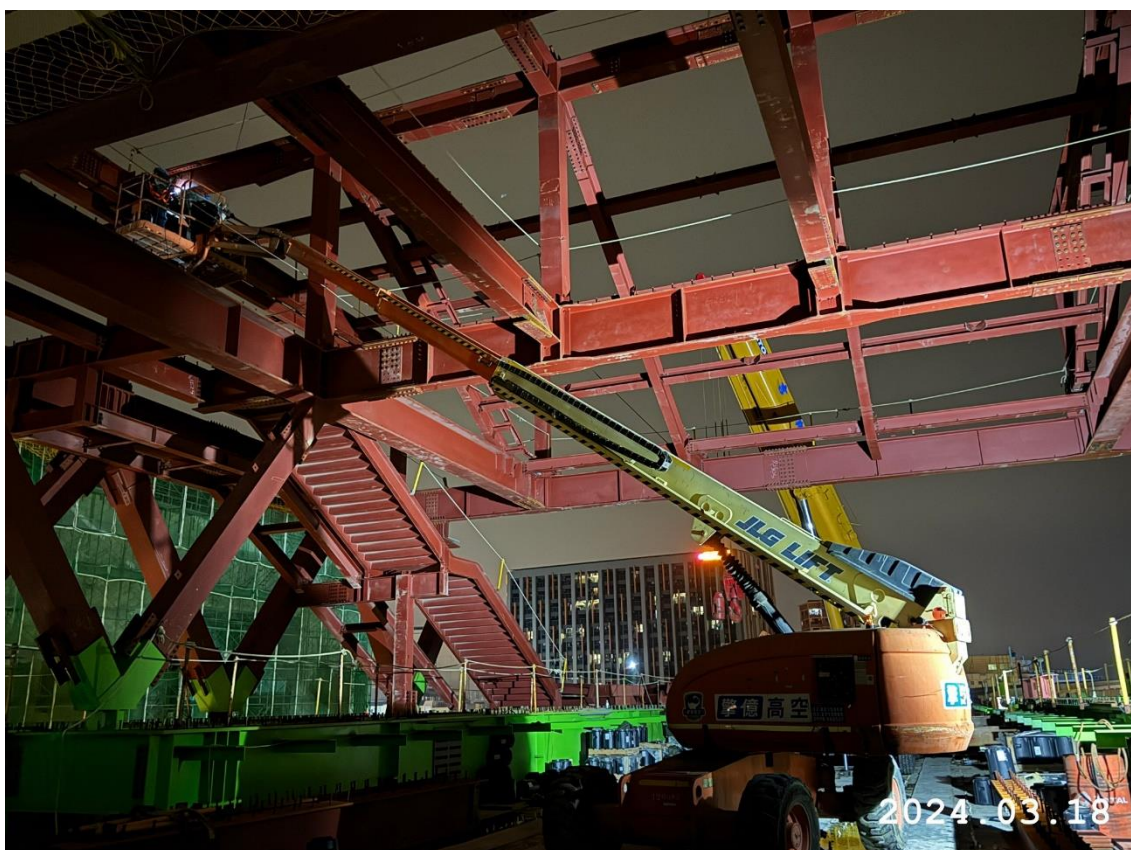

鋼構組_G31 站體螺栓穿鎖作業



北段上構_DU31-08 拱橋段橋面版澆置



G14 站體鋼承板鋪設



G31 站體吊裝作業



DU31-04 場撐箱梁鋼筋綁紮
