

112 年 4 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路共 60 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。
- (4) 建德路及新關道路共 60 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (5) 建德路及新關道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 新關道路累計完成 62 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
- (7) 新關道路累計完成 4 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) 建德路目前進行中央分隔島路緣石施作、鋼筋綁紮作業。
- (9) G01 車站出入口目前進行 4 樓牆模板組立；G02 車站出入口目前進行 3 樓墊層前置作業。
- (10) G01 車站目前進行站體鋼柱吊裝；G02 車站連通道進料吊裝。

二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 249 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 P14a-03 鋼筋加工、PD-01 調模檢測作業，累計已完成 205 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，目前進行 P14-28 模板組立，累計已完成 172 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 21 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU31-10 鋼筋綁紮、預力配管穿線及內腹版吊裝，DU14a-01 底腹版鋼筋綁紮，DU12-01 胸牆模板組立，DU13a-06 中央步道模板組立。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 185 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。


- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 18.5 跨鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) G13 車站出入口目前進行擋土牆鋼筋綁紮及模板組立；G13a 車站出入口目前進行外牆施工架搭設；G14 車站出入口目前進行二樓牆第二昇層及環梁平台模板組立；G31 車站出入口目前進行一樓外牆施工架搭設；G32 車站出入口目前進行四樓牆第一昇層拆模。
- 三、GC01 標截至 112 年 4 月 30 日進度為 63.34%。



北段_B 工區_道路復舊中央分隔島路緣石(M01, M02)島頭斜線繪製、反光標鈕安裝



G13 站 3F 蹲便裝設

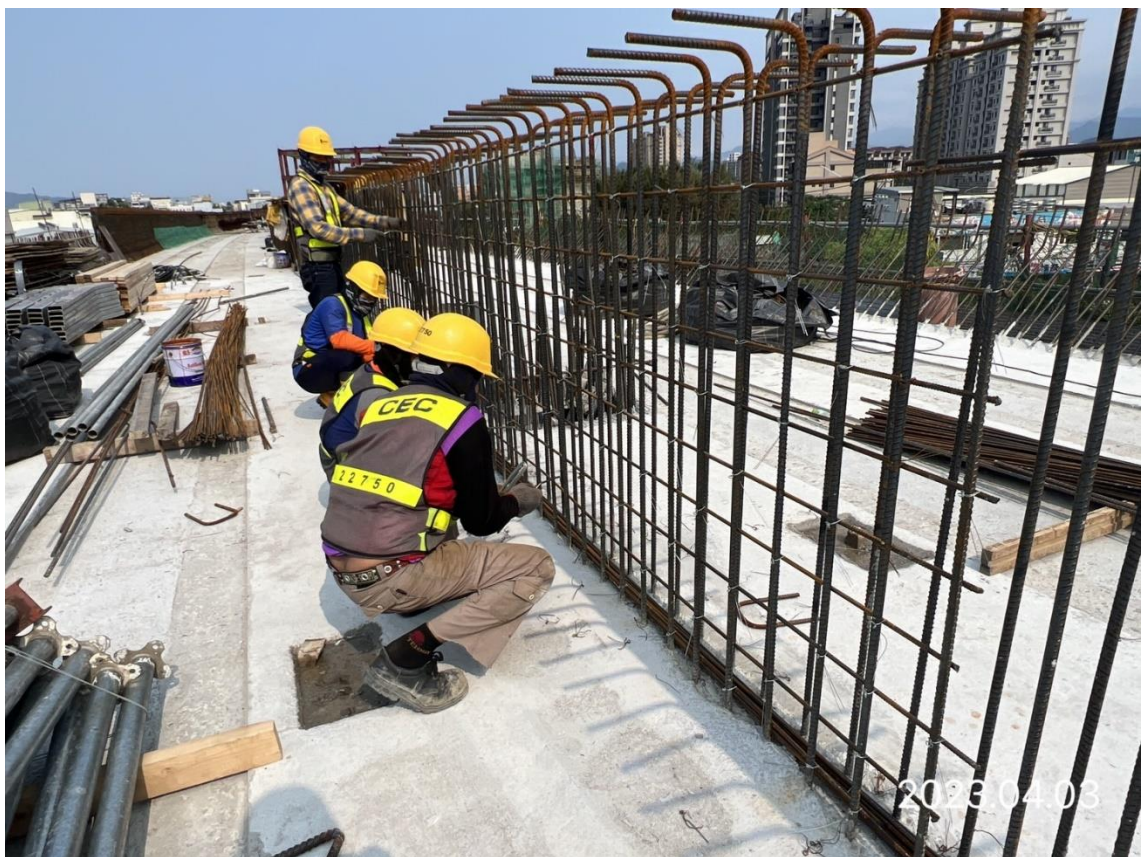

北段上構_DU31-09 中央走道鋼筋綁紮




G13 站 2F 電氣管路施作



DU13a-14 鋼箱梁吊裝 A11~A13 起吊接合



G02 車站出入口屋突層牆面模板組立

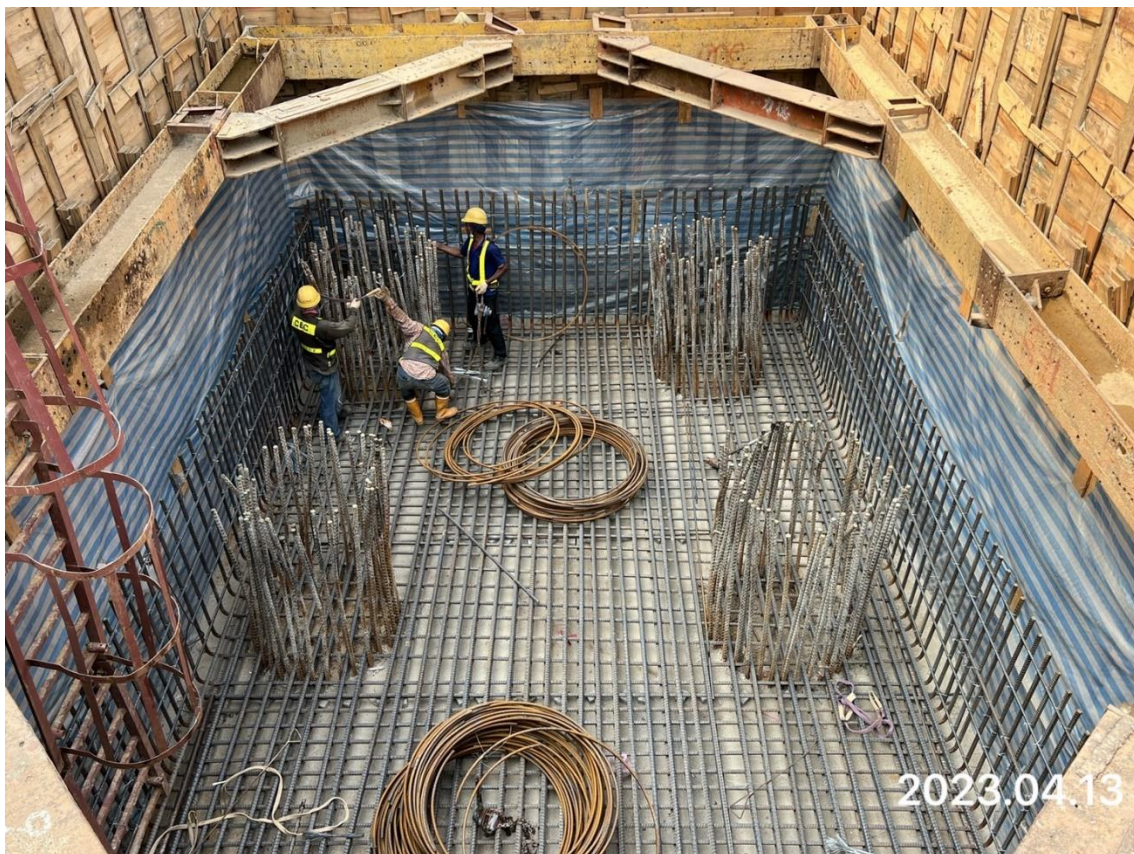

北段_E 工區_樁帽 PD-01 下層筋綁紮



北段_G13a 車站穿堂層填縫及鋼筋綁紮



北段上構_DU13a-10 場撐箱型梁支撐架組立



DU31-08 螺栓穿鎖



北段_D 工區_樁帽 P13a-28 道路復舊 AC 刨鋪

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
