

## 110 年 7 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新關道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。
- (2) 建德路及新關道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。
- (3) 建德路及新關道路持續進行墩柱施作，建德路部分已大部分施作完成，新關道路部分 P01-20~21 進行第四昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-18 施工架搭設及 P01-16-R 第三昇層模板組立，累計已完成 56 支墩柱。
- (4) 建德路及新關道路持續進行帽梁施作，目前進行 PG01-1 鋼筋綁紮及 PG02-3 施工架搭設，將接續進行 PG01-1 模板組立及混凝土澆置、PG02-3 鋼筋綁紮，累計已完成 42 座帽梁。
- (5) 建德路及新關道路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)、P01-13~P01-15、P01-28~P01-31，累計 11 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 PG02-04~P02-01 模板組立，將接續進行混凝土澆置。
- (6) G01 車站出入口目前進行 1 樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立，將接續進行混凝土澆置；G02 車站出入口目前完成 1 樓柱牆鋼筋綁紮，將接續進行模板組立及混凝土澆置。

### 二、蘆竹、大園(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區 (坑菓路-G31~G32 車站) 持續進行基樁施作，累計已完成 1,188 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作，累計已完成 124 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，目前進行墩柱 P12-04 模板組立、P13a-10、12 第一、二昇層鋼筋綁紮及 P14-35 第三昇層混凝土澆置，將接續進行 P12-04、P13a-10、P31-27L 第一昇層模板組立及混凝土澆置、P13a-33 第五、六昇層鋼筋綁紮，累計已完成 95 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行帽梁施作，目前進行 P13a-04 支撐架搭、P13a-51 模板組立及 P14-38 第一昇層鋼筋綁紮，將接續進行 P12-06、P13-33 混凝土澆置、P13-15 鋼筋綁紮、P14-38 鋼筋綁紮及 P14-41~42 模板組立，累計已完成 68 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱、4 座鋼帽梁及 6 支軌道梁已吊裝完成，預計 9 月進行軌道版施作；G13a 車站 6 支鋼柱、6 座鋼帽梁及 10 支軌道梁已吊裝完成，預計 9 月接續進行軌道版施作。

- (6) 中正北路已完成 PG13-4~P13-1，累計 1 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 P12-16-P12-17 支撐架搭設。
  - (6) 中正北路已完成 P13-02~P13-26，累計 42 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝，目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。
  - (7) 中正北路已完成 P13-14~P13-14a，累計 2 支鋼箱型梁吊裝，目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
  - (8) G13 車站出入口目前完成 1 樓柱牆混凝土澆置，將接續進行重型支撐架組立；G13a 車站出入口目前進行筏基基礎底版模板組立，將接續進行混凝土澆置；G14 車站出入口目前進行筏基地梁鋼筋綁紮，將接續進行模板組立及混凝土澆置；G31 車站出入口目前進行第三階段基礎開挖；G32 車站出入口目前進行 1 樓柱牆模板組立，將接續進混凝土澆置。
- 三、GC01 標截至 110 年 7 月 31 日進度為 29.16%。



八德新闢道路 墩柱鋼筋綁紮




八德新闢道路 帽梁鋼筋綁紮



八德新闢道路 G02 車站出入口 1 樓柱牆施工現況




大園三民路二段 基樁鋼筋籠搭接

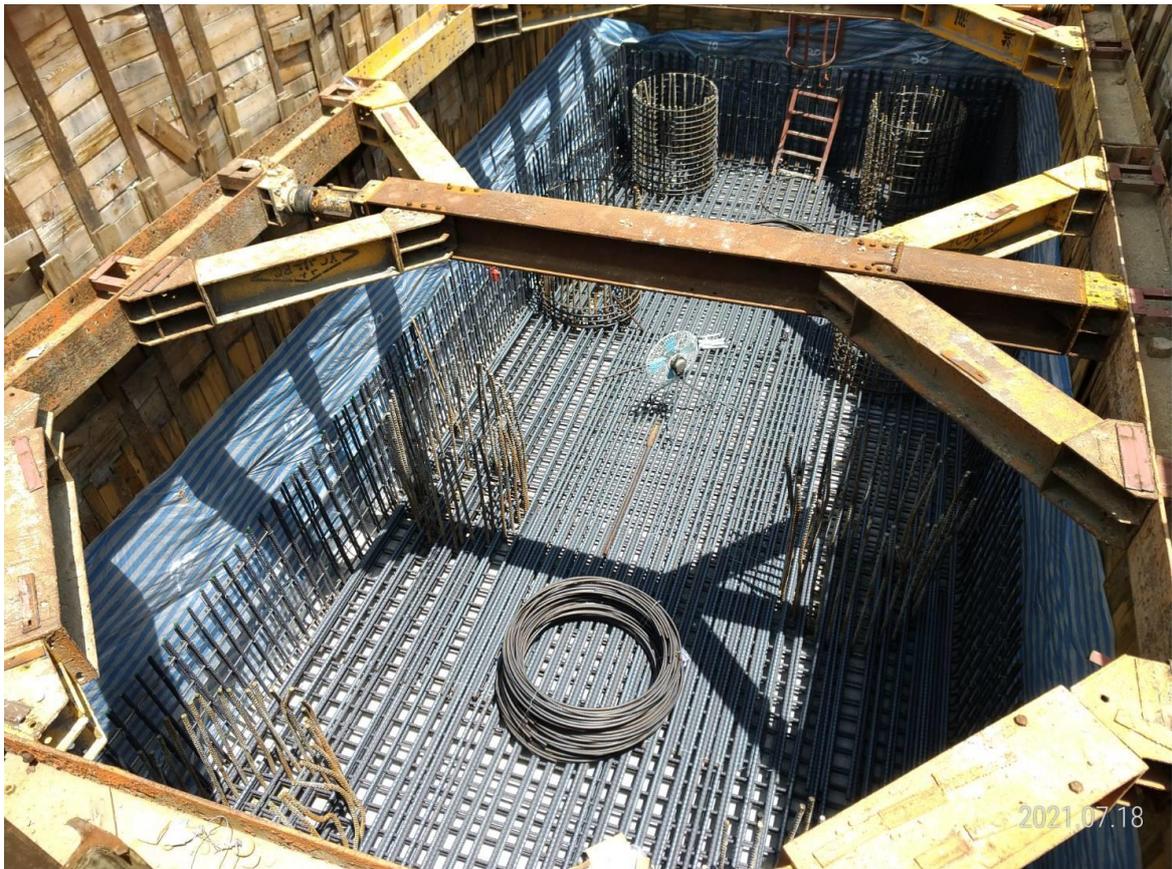

蘆竹中正北路 樁帽鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 墩柱模板組立

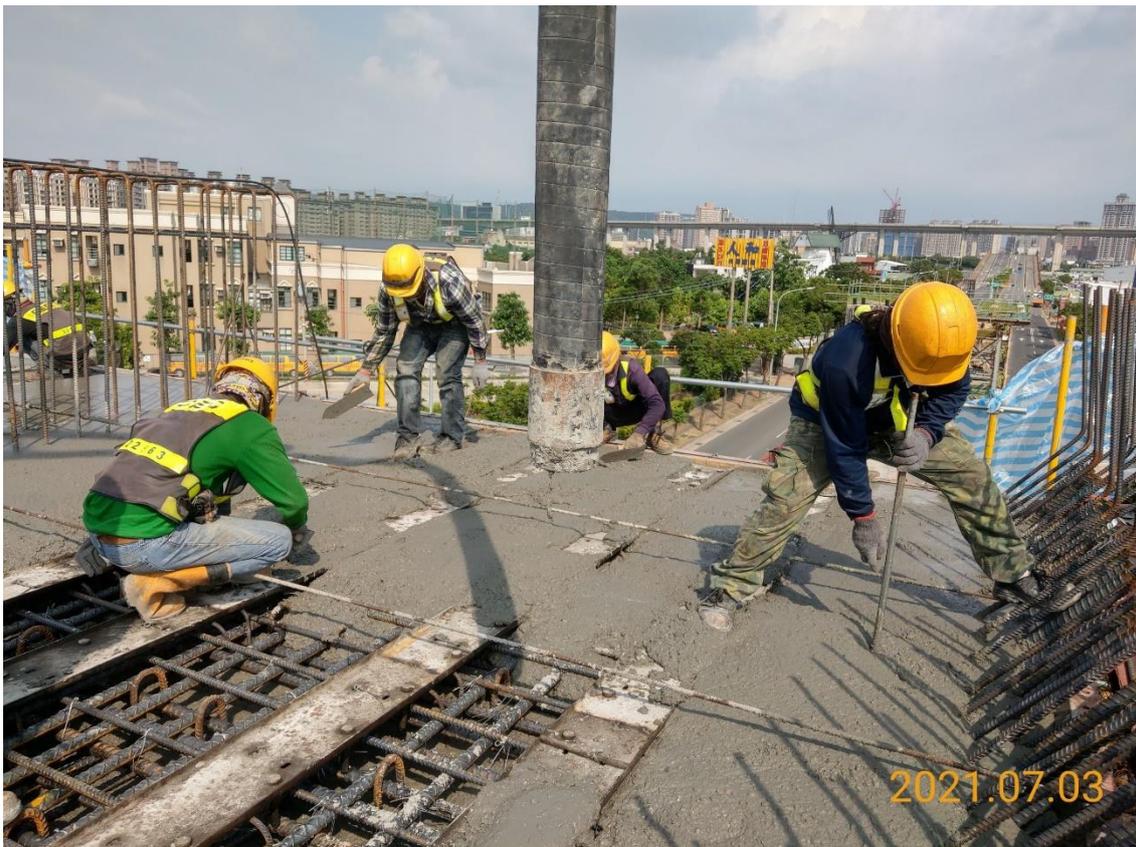


蘆竹中正北路 帽梁混凝土澆置



蘆竹中正北路 場鑄箱型梁支撐架組立



蘆竹中正北路 預鑄混凝土 U 型梁吊裝

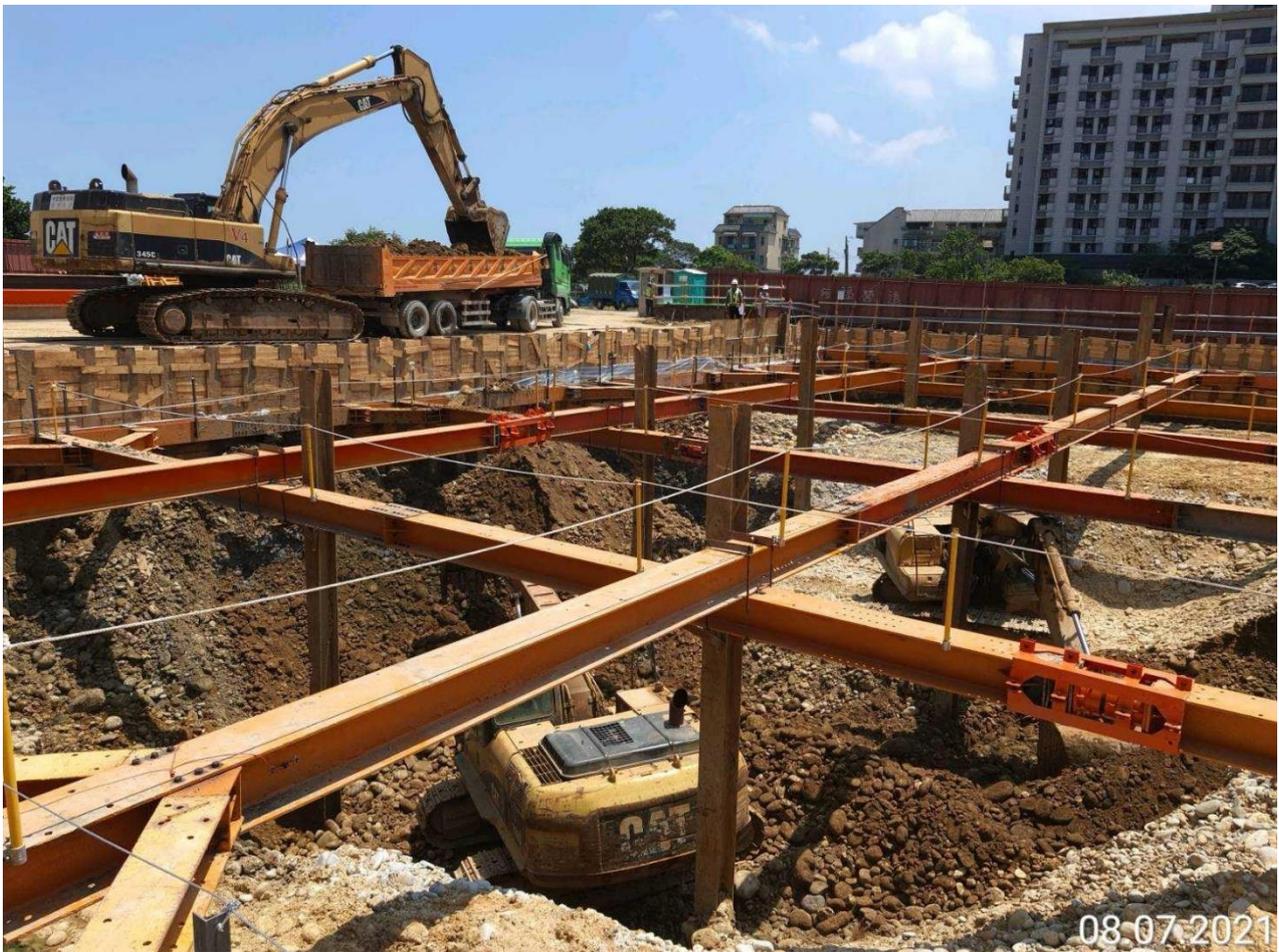

大園三民路二段 G31 車站出入口筏基基礎開挖

(照片依每月進度全部更新，特此說明)
