
112 年 5 月 GC01 標工程進度

- 一、八德(南段)工區:
- (1) 建德路及新闢道路共337支基樁已於109年11月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路共66座樁帽已於110年6月全部施作完成。
- (3) 建德路及新闢道路共60支RC墩柱已於110年8月全部施作完成;鋼墩柱共5支已於110年9月全部施作完成。
- (4) 建德路及新闢道路共60支帽梁已於111年5月全部施作完成。
- (5) 建德路及新闢道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。
- (6) 建德路及新闢道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。
- (7) 建德路及新闢道路累計完成 4 跨鋼箱型梁吊裝,目前持續進行鋼箱型梁生產作業。
- (8) 建德路(仁德路至長興路)已完成中央分隔島路緣石施作。
- (9) G01 車站出入口目前進行 4 樓牆模板組立及鋼筋加工綁紮; G02 車站出入口目前進行 RF 層結構作業。
- (10) G01 車站目前進行站體鋼梁吊裝; G02 車站站體及連通道吊裝完成。
- 二、蘆竹、大園(北段)工區:
- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路,南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路三段)、南崁路三段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路三段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站) 1,458 支基椿已於 111 年 5 月全部 施作完成。
- (2) 中正北路、南崁路三段、三民路三段及坑菓路持續進行樁帽施作,累計已完成 249 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作,目前進行墩柱 PD-01 至 PD-05 鋼筋綁紮,累計已完成 210 支墩柱。
- (4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作,目前進行 P14-28 模板組立,累計已完成 174 座帽梁。
- (5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 21 跨場鑄箱型梁橋面版,目前進行 DU31-10 頂版鋼筋綁紮及混凝土澆置; DU14-11 底腹版混凝土澆置及腹版模組立; DU14a-01 腹版混凝土澆置及頂版組模; DU13a-10 支撐架搭設及模版組立。
- (6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 196 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝,目前持續進行預鑄混凝土 U 型梁生產作業。

- (7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 20 跨鋼箱型梁吊裝,目前持續進行鋼箱型梁生產及吊裝作業。
- (8) G13 車站出入口目前進行屋頂版系統安裝;G13a 車站出入口目前進行 3 樓柱牆模板組立及鋼筋加工綁紮;G14 車站出入口目前進行二樓柱牆第二昇層作業;G31 車站出入口目前進行一樓柱牆模板組立及鋼筋加工綁紮;G32 車站出入口目前進行五樓梁板重型支撐架搭設及版梁模板組立。
- (9) G13 車站及 G13a 車站站體吊裝完成。
- 三、GC01 標截至 112 年 5 月 31 日進度為 65.21%。



北段上構_DU31-09 中央步道腹筋綁紮

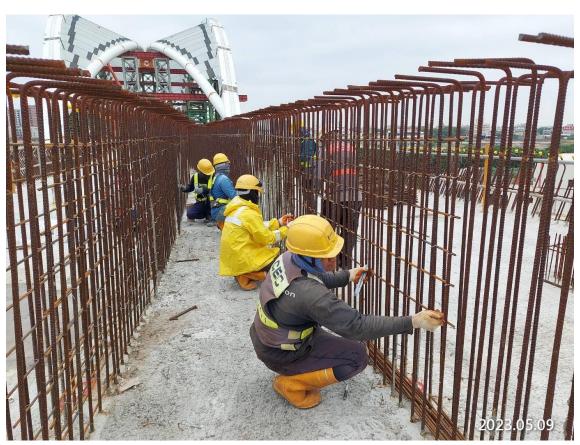

南段_G02 車站出入口三樓混凝土墊層澆置



北段_PG31-02 鋼帽梁吊裝



北段_G13a 車站站體屋頂層混凝土澆置



北段上構_PD-9~PDA11 預埋件安裝




北段_G13 站 1F~2F 電氣管路施作



北段_G13 站 1F 空調風管施作



北段上構_PD-10~PDA11 第一階段底版混凝土澆置

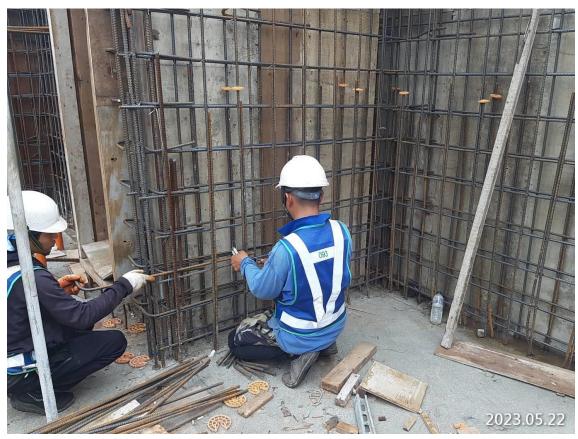

北段_G31 車站出入口一樓柱牆第一昇層鋼筋綁紮

(照片依每月進度全部更新,特此說明)
