

109 年 5 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 190 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 20 處樁帽。
- (3) 建德路已完成墩柱 P01-13~14 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-13~14 第三昇層混凝土澆置，累計已完成 16 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-10 混凝土澆置，將接續進行 P01-04~05 帽梁鋼筋綁紮，累計已完成 7 座。
- (5) 新闢道路已完成施工便道 660 公尺，將持續進行施工便道施作及圍籬架設。

二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、南崙路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)及 E 工區(南崙路二段 532 號~坑菓路口)持續進行基樁施作，累計已完成 460 支基樁。
- (2) 中正北路及南崙路二段持續進行樁帽施作，累計已完成 37 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱 P13-5、20~22 及 30 第三昇層混凝土澆置及 P13-25 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P13-5、20 第四昇層混凝土澆置及 P13-25 第三昇層混凝土澆置，累計已完成 15 支墩柱。
- (4) 中正北路目前進行 P13-08~09 帽梁鋼筋綁紮，將接續進行混凝土澆置，累計已完成 6 座。


三、GC01 標截至 109 年 5 月 31 日，預定進度 7.14%，實際進度 8.02%。



八德建德路 基樁鑽掘



八德新闢道路 樁帽鋼軌樁打設

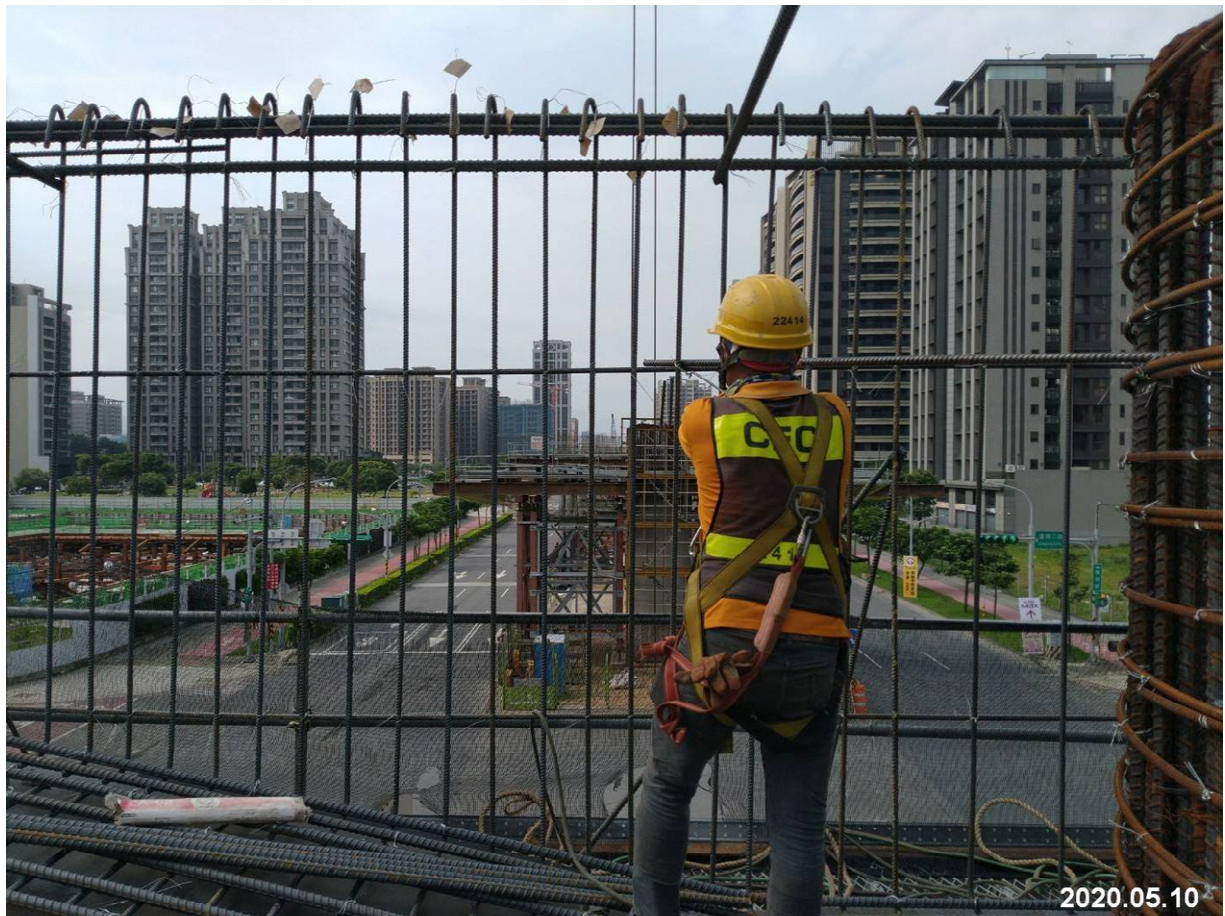

八德建德路 帽梁鋼筋綁紮



八德新闢道路 施工便道施作



蘆竹南崁路二段 基樁混凝土澆置



蘆竹中正北路 樁帽混凝土養護



蘆竹中正北路 墩柱第一昇層模板組立



八德建德路 立法院交通委員會視察

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 5 月 31 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,710	650	38.01%	1,277	74.68%
樁帽	座	319	57	17.88%	129	40.44%
墩柱	墩	319	31	9.72%	92	28.84%
帽梁	座	291	13	4.47%	64	21.99%
橋面版	跨	308	-	-	13	4.22%

工程進度更新至 109 年 5 月份實際進度。
