110 年 4 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區:

- (1) 建德路及新闢道路共337支基樁已於109年11月全部施作完成。
- (2) 建德路及新闢道路持續進行樁帽施作,累計已完成60處樁帽。
- (3) 建德路及新闢道路持續進行墩柱施作,建德路部分已大部分施作完成,新闢道路部分 P01-22~P01-24 已完成第一、二昇層混凝土澆置,將接續進行 P01-22~P01-24 第三、四昇層鋼筋 綁紮,累計已完成 47 支墩柱。
- (4) 建德路及新闢道路持續進行帽梁施作,目前 P01-27、P02-06 混凝土已澆置完成,將接續進行 PG02-04、P02-01、03~05 鋼筋綁紮、PG01-03 混凝土澆置,累計已完成 31 座。
- (5) 建德路已完成 PG01-05~P01-01、P01-01~P01-04、P01-06~P01-08(上、下行線部分)、P01-13~P01-15、P01-28~P01-30、累計 10 跨場鑄箱型梁橋面版、目前進行 P01-30~P01-31 場鑄箱型梁頂版鋼筋綁紮、將接續進行頂版混凝土澆置。
- (6) G01 車站出入口目前完成 1 樓版混凝土澆置作業,將接續進行筏基基礎外側防水膜施作; G02 車站出入口目前完成地梁混凝土澆置,將接續進行 1 樓版模板組立。
- 二、蘆竹、大園(北段)工區:
- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路,南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區(坑菓路-G31~G32 車站)持續進行基樁施作,累計已完成1,016 支基樁。
- (2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行樁帽施作,累計已完成 106 處樁帽。
- (3) 中正北路、南崁路二段及三民路二段持續進行墩柱施作,目前進行墩柱 P13a-19~20 第一、二 昇層鋼筋綁紮,將接續進行 P13a-19~20 第一、二昇層、P14-41 第一昇層模板組立及混凝土 澆置,累計已完成 80 支墩柱。
- (4) 中正北路及南崁路二段持續進行帽梁施作,目前進行 P13-22 混凝土澆置,將接續進行 P13-14 支承墊模板混凝土澆置、P12-09 鋼筋綁紮,累計已完成 45 座帽梁。
- (5) G13 車站 4 支鋼柱、4 座鋼帽梁及 6 支軌道梁已吊裝完成,預計 8 月將接續進行軌道版施作; G13a 車站 6 支鋼柱目前已吊裝完成 4 支,將俟其餘 2 支鋼柱吊裝完成及 6 支鋼柱完成柱內灌 漿後,接續進行鋼帽梁及軌道梁吊裝。
- (6) G13 車站出入口目前進行 1 樓柱牆鋼筋加工,將接續進行模板組立及鋼筋綁紮; G13a 車站出入

口目前進行基礎開挖; G14 車站出入口目前進行筏基基礎鋼筋加工,將接續進行鋼筋綁紮; G32 車站出入口目前進行 1 樓版鋼筋綁紮,將接續進行一樓版模板組立及混凝土澆置。

三、GC01 標截至 110 年 4 月 30 日進度為 24.06%。



八德新闢道路 樁帽鋼筋加工



八德新闢道路 墩柱鋼筋綁紮



八德新闢道路 帽梁混凝土澆置




八德新闢道路 場鑄箱型梁橋面版混凝土澆置



八德建德路 G01 車站出入口1 樓版混凝土澆置




蘆竹南工路 基樁混凝土澆置

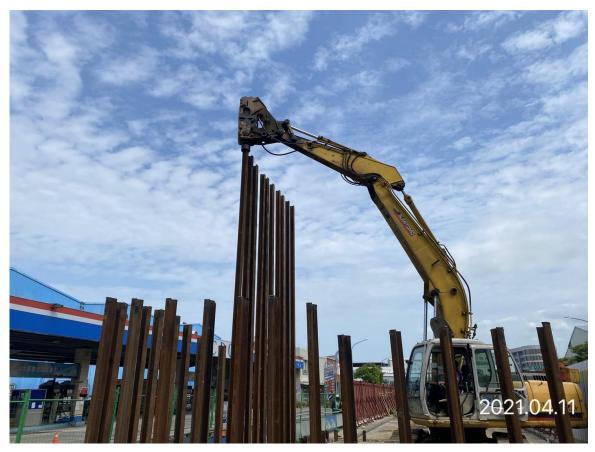

蘆竹中正北路 樁帽鋼軌樁打設



蘆竹中正北路 墩柱鋼筋綁紮

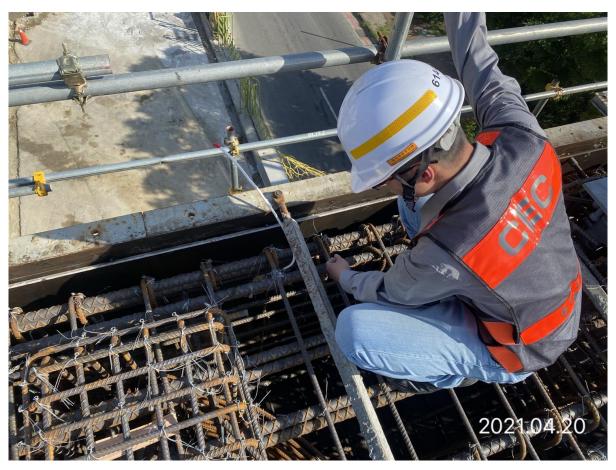

蘆竹中正北路 帽梁接地線安裝測試



蘆竹中正北路 帽梁施作情形



大園坑菓路 G32 車站地梁模板組立

(照片依每月進度全部更新,特此說明)
