

109 年 1 月 GC01 標工程進度


一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路持續進行基樁施作，累計已完成 122 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 16 處樁帽。
- (3) 建德路已完成墩柱(PG01-02~05、P01-01~05)第三昇層混凝土澆置，P01-06~08 將接續進行第二昇層混凝土澆置，累計已完成 13 支墩柱。
- (4) 建德路橋墩編號 P01-09~12 帽梁底模已組立完成，將接續進行鋼筋綁紮、側模組立及混凝土澆置。

二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)及南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)持續進行基樁施作，累計已完成 272 支基樁。
- (2) 中正北路持續進行樁帽施作，累計已完成 10 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱(P13-32 及 33)第四昇層混凝土澆置，將接續進行(P13-12)第四昇層混凝土澆置，累計已完成 7 支墩柱。
- (4) 中正北路橋墩編號 P13-06、07、10、11 及 13 已完成墩柱混凝土澆置並移除施工架，將接續進行帽梁施作。

三、GC01 標截至 109 年 1 月 31 日，預定進度 4.09%，實際進度 4.70%。

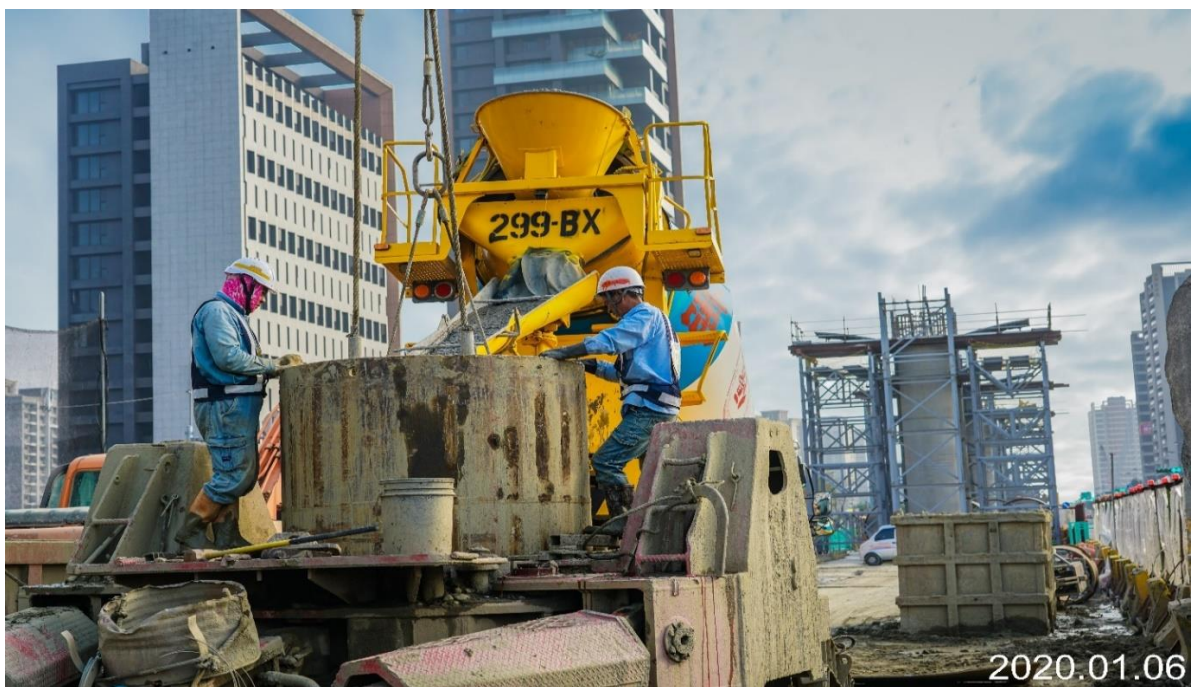

八德建德路 基樁混凝土澆置



八德建德路 墩柱第三昇層混凝土澆置



八德建德路 樁帽鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 墩柱施工架搭設完成



蘆竹中正北路 墩柱第二層養護



蘆竹中正北路 春節前道路創鋪作業

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 1 月 31 日		109 年 12 月	
			完成數量	完成百分比	預計完成數量	預計完成百分比
基樁	支	1,590	394	24.78%	1590	100.00%
樁帽	處	296	26	8.78%	106	35.81%
墩柱	墩	296	20	6.76%	92	31.42%
帽梁	座	291	-	-	74	25.43%
橋面版	跨	294	-	-	15	5.10%

本工程進入 109 年，遂先前提供上開表格移除 108 年 12 月預定進度，僅保留截至 109 年 1 月份實際進度及 109 年 12 月預定進度。
