

## 109 年 3 月 GC01 標工程進度

### 一、八德(南段)工區：

- (1) 建德路及新闢道路持續進行基樁施作，累計已完成 140 支基樁。
- (2) 建德路持續進行樁帽施作，累計已完成 19 處樁帽。
- (3) 建德路已完成墩柱 P01-13~14 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P01-13~14 第三昇層混凝土澆置，累計已完成 16 支墩柱。
- (4) 建德路已完成帽梁 P01-01 混凝土澆置，將接續進行 P01-02~03，累計已完成 4 座。
- (5) 新闢道路(建德路端、廣興路端)已完成施工便道 420 公尺，將持續進行施工便道施作及圍籬架設。

### 二、蘆竹(北段)工區：

- (1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)及南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)持續進行基樁施作，累計已完成 361 支基樁。
- (2) 中正北路持續進行樁帽施作，累計已完成 25 處樁帽。
- (3) 中正北路已完成墩柱 P13-5、8、9、20、21、22 第二昇層混凝土澆置，將接續進行 P13-5、8、9、20、21、22 第三昇層混凝土澆置，累計已完成 8 支墩柱。
- (4) 中正北路已完成帽梁 P13-07 混凝土澆置，將接續進行 P13-10~11 鋼筋綁紮，累計已完成 2 座。
- (5) E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)已完成路燈號誌遷移作業，本府交通局已核定交通維持計畫，4 月進行圍籬架設。

### 三、GC01 標截至 109 年 3 月 31 日，預定進度 5.61%，實際進度 6.46%。





八德建德路 樁帽鋼筋綁紮



八德建德路 墩柱第二層鋼筋綁紮





八德建德路 帽梁鋼筋綁紮




八德建德路 帽梁施作完成






蘆竹中正北路 基樁鋼筋籠吊放

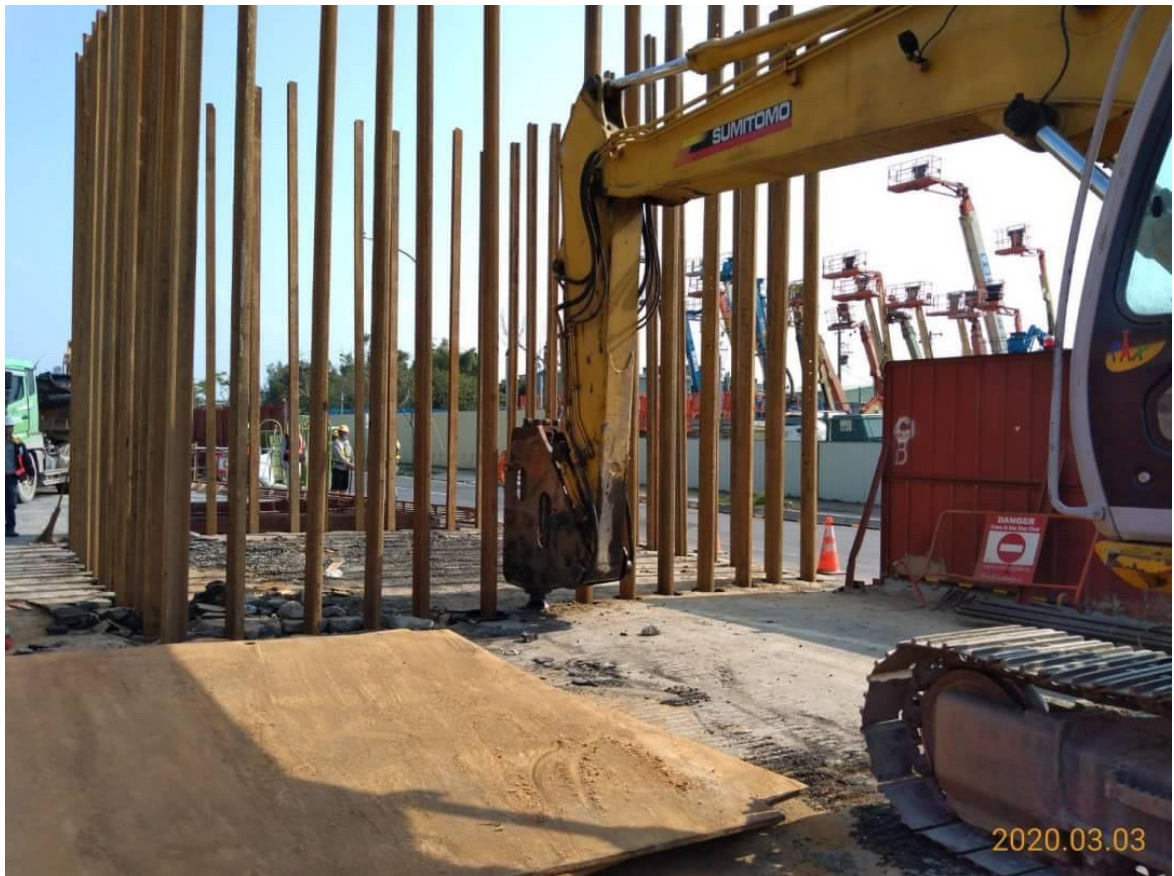

蘆竹中正北路 樁帽鋼軌樁打設



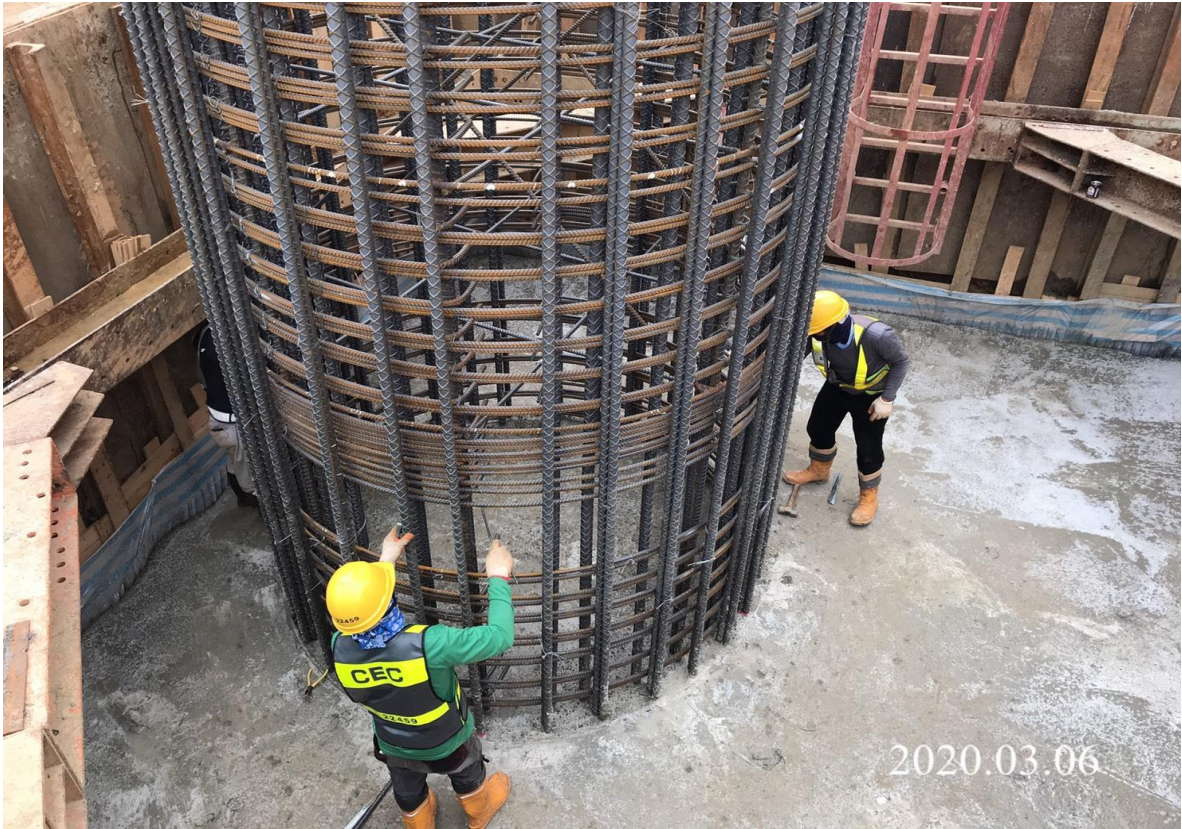

蘆竹中正北路 墩柱第一層鋼筋綁紮



蘆竹中正北路 帽梁混凝土澆置

(照片依每月進度全部更新，特此說明)

工程項目	單位	總數量	截至 109 年 3 月 31 日		109 年 12 月	
			完成 數量	完成 百分比	預計完成 數量	預計完成 百分比
基樁	支	1,590	501	31.51%	1590	100.00%
樁帽	處	296	44	14.86%	106	35.81%
墩柱	墩	296	24	8.11%	92	31.42%
帽梁	座	291	6	2.03%	74	25.43%
橋面版	跨	294	-	-	15	5.10%

工程進度更新至 109 年 3 月份實際進度。
