114 年 2 月 GC01 標工程進度

一、八德(南段)工區：

(1) 建德路及新闢道路共 337 支基樁已於 109 年 11 月全部施作完成。

(2) 建德路及新闢道路共 66 座樁帽已於 110 年 6 月全部施作完成。

(3) 建德路及新闢道路共 61 支 RC 墩柱已於 110 年 8 月全部施作完成；鋼墩柱共 5 支已於 110 年 9 月全部施作完成。

(4) 建德路及新闢道路共 62 支帽梁已於 111 年 5 月全部施作完成。

(5) 建德路及新闢道路累計完成 16 跨場鑄箱型梁橋面版。

(6) 建德路及新闢道路 64 支預鑄混凝土 U 型梁已於 112 年 5 月全部施作完成。

(7) 建德路及新闢道路累計完成 7 跨鋼箱型梁吊裝。

(8) 1.出流管制 IS-01 邊溝（4k+923.7~940）頂版模板組立、鋼筋綁紮

(9) 2.出流管制 CB12 集水井及銜接 CB12 集水井之 SCN-05 側溝牆身模板組立

(10) 3.SCS-06 側溝(4k+477.4~525）開挖

(11) 4.建德路至仁德路 95 巷北側人行道模板組立、鋼筋網放置

(12) 5.共管人孔調整

(13) 6.建德路至仁德路 95 巷南側人行道硬化劑塗抹

二、蘆竹、大園(北段)工區：

(1) 中正北路 B 工區(蘆竹區中正北路，南竹路~中正路橋)、C 工區(蘆竹區中正北路~南工路)、D-1 工區(蘆興街-南青路~南工路二段)、南崁路二段 D 工區(南青路~山隆加油站)、E 工區(南崁路二段 532 號~坑菓路口)及 F 工區（坑菓路-G31~G32 車站）1,458 支基樁已於 111 年 5 月全部施作完成。

(2) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路樁帽共 249 處已全數完成。

(3) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行墩柱施作，累計已完成 247 支墩柱。

(4) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路持續進行帽梁施作，累計已完成 225 座帽梁。

(5) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 63 跨場鑄箱型梁橋面版，目前進行 DU14-03 DU14-08、09 單元橋面排水管安裝。

(6) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 200 支預鑄混凝土 U 型梁吊裝。

(7) 中正北路、南崁路二段、三民路二段及坑菓路累計完成 64 跨鋼箱型梁吊裝。

(8) G13 車站目前進行出入口三樓現金室修飾、一樓地坪泥作修飾及屋頂層基座平整度修飾、出入口屋頂外牆格柵骨架安裝及外牆牆面修飾及物料整理，站體連通道下方天花板骨架安裝、玻璃帷幕安裝等；G14(原 G13a)車站出入口目前進行外牆面修飾，站體目前進行月台層抗風樑柱、金屬牆版骨架組立、3F 電力及標誌系統施工、站體外牆版片安裝等；G15(原 G14)車站出入口目前進行外牆帷幕骨架安裝、連通道抗風樑柱施作，站體目前進行穿堂層墊層前置作業、物料吊掛、1F 排水系統配管，2F 照明系統配管、3F 走道消防撒水管配管等；G15a(原 G31)車站出入口目前進行 B1F 雨排配管、2-3F 電力及標誌系統施工，站體連通道墊層前置作業等；G15b(原 G32)車站出入口目前進行 RF 墊層拆模整理、站體補漆、月台層輕隔間骨架組立及輕隔間封板、金屬屋頂板屋面版進料吊運及安裝、3F 火警系統施工等。

三、GC01 標截至 113 年 2 月 28 日進度為 83.03%。

南段_DU31-12 崁下橋 PE1-01 基樁鋼筋籠鑽掘

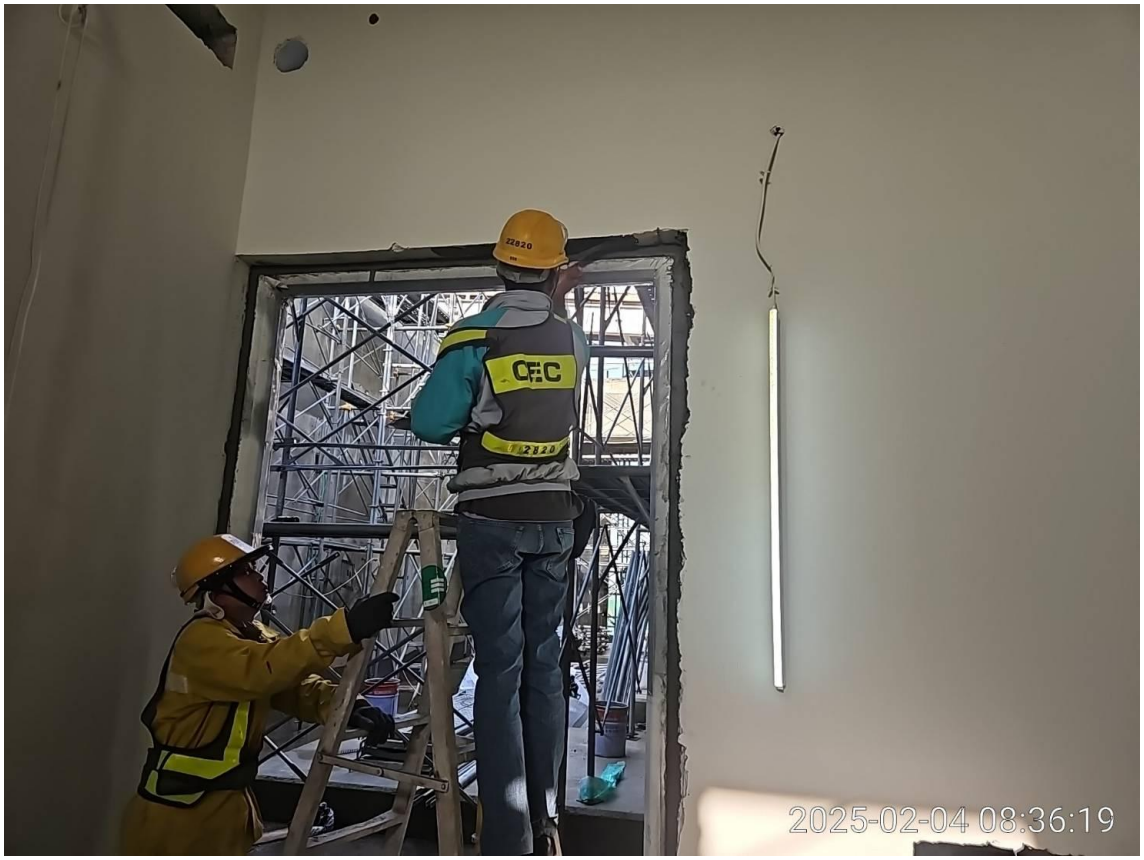

G15(原 G14)車站站體穿堂層墊層前置作業及出入口三樓門框填縫、屋頂層邊模拆除

G15a(原 G31)車站站體月台層絕緣膜前置作業及出入口 B2F 門框填縫

G15b(原 G32)車站站體金屬屋頂板固定件安裝
